



VIII
audiencia
pública
regional descentralizada

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

Gerente: Ing. Denny Matos Paz

OBRAS

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARES

● **Objetivo:**

Promover el Desarrollo Socio – Económico, Ambiental de la población en el ámbito Sub. Regional, realizando acciones y políticas en beneficio de la comunidad.

● **Características:**

- Realizar Estudios de Pre. Inversión y de Inversión en las zonas mas alejadas de la Provincia.
- Brindar asistencia con la infraestructura que permita paliar las necesidades primordiales de la comunidad (infraestructura vial, Agraria, Salud, Educación y otros que estén inmersos en el que hacer institucional).

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
UNIDAD EJECUTORA : 009 GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 0 RECURSOS ORDINARIOS


DESCRIPCION DEL SECTOR GENERICA DE GASTO	AÑO 2010		
	PIM	EJECUCION	% AVANCE
<u>GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES</u>			
2.1. Personal y Obligaciones	227 816.00	120 124.71	53%
2.2. Pensiones y Otras prestaciones	10 870.00	0.00	0%
2.3. Bienes y servicios	717 079.00	507 753.98	71%
2.6. Adquisiciones de activos no financieros	170 815.00	112 470.00	66%
SUB TOTAL	1 126 580.00	740 348.69	66%
<u>UNIDAD OPERATIVA AGRARIA</u>			
2.1. Personal y Obligaciones	533 232.00	249 926.29	47%
2.2. Pensiones y Otras prestaciones	61 900.00	37 350.63	60%
SUB TOTAL	595 132.00	287 276.92	48%
<u>UNIDAD OPERATIVA SALUD</u>			
2.1. Personal y Obligaciones	1 838 921.00	1 187 563.26	65%
2.2. Pensiones y Otras prestaciones	5 000.00	0.00	0%
2.3. Bienes y servicios	3 837 364.00	1 706 708.06	44%
SUB TOTAL	5 681 285.00	2 894 271.32	51%
<u>EDUCACIÓN</u>			
2.1. Personal y Obligaciones	18 472 470.00	13 480 087.03	73%
2.2. Pensiones y Otras prestaciones	1 130.00	0.00	0%
2.3. Bienes y servicios	1 703 227.00	804 950.84	47%
SUB TOTAL	20 176 827.00	14 285 037.87	71%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 UNIDAD EJECUTORA : 009 GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON

DESCRIPCION DEL SECTOR GENERICA DE GASTO	AÑO 2010		
	PIM	EJECUCION	% AVANCE
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	16 477 778.00	9 439 327.80	57%
2.6. Adquisiciones de activos no financieros	-----	-----	
SUB TOTAL	16 477 778.00	9 439 327.80	

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA SUB GERENCIA DE ANGARAES

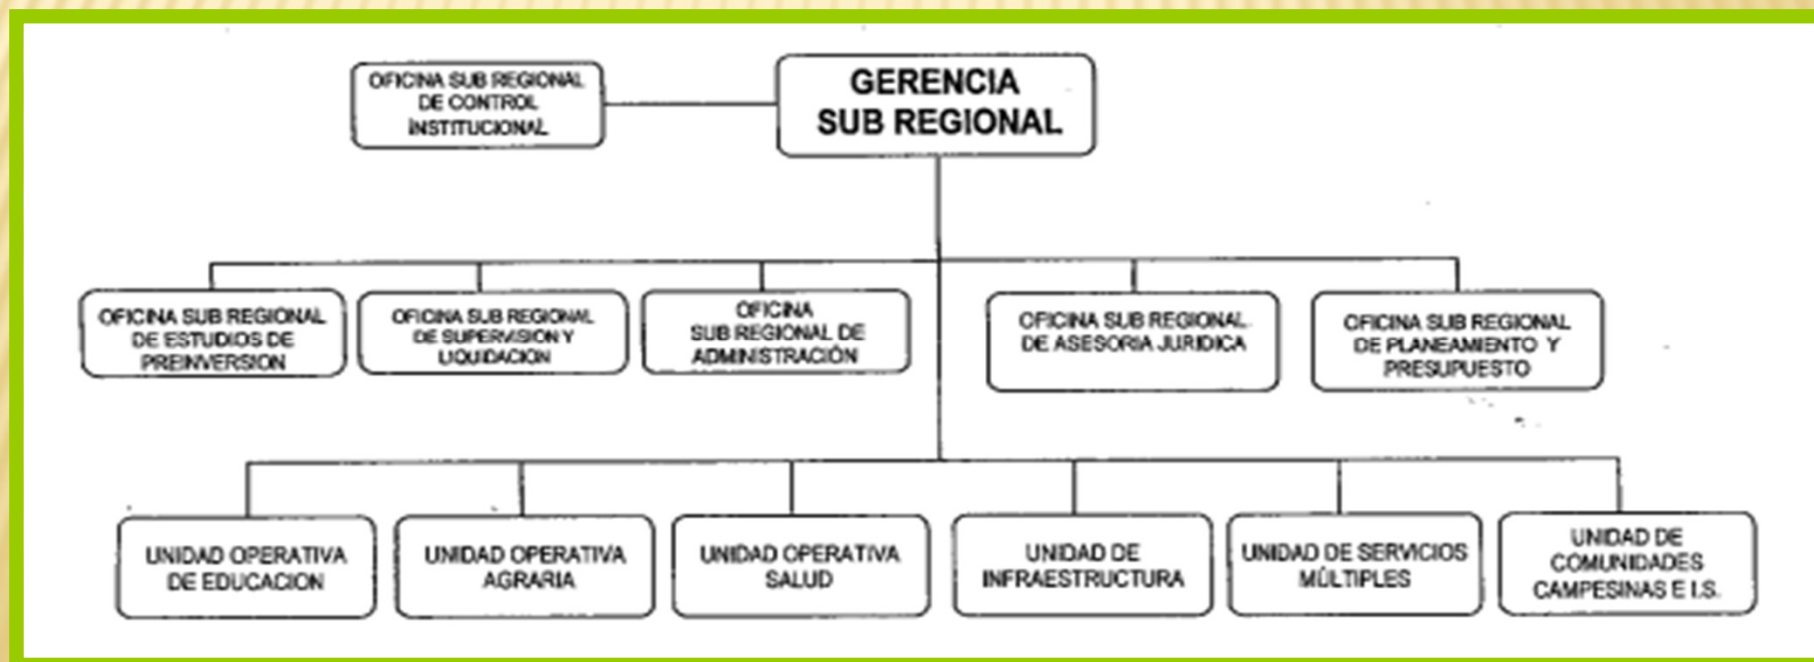

PROYECTOS EJECUTADOS ENERO A JUNIO, 2010 (Primer Semestre)

1.- EN EDUCACION

1.1 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36219 - CALLANMARCA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito de Callanmarca.
- **Monto de Inversión:** S/. 912,879,89 nuevos soles
- **Objetivo:** Adecuada atención a la población estudiantil en el nivel primario de la zona.
- **Situación Actual:** Obra concluida el 18/Abril/2010 y a la fecha se encuentra en fase de Pre. liquidación.
- **Logros y Beneficios:** Se viene logrando una mejor enseñanza a los alumnos de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
081	S/. 912,879,89	S/. 912,879,89	0	100

1.2 SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 1° DE MAYO DE COCHACCASA (AMPLIACIÓN 2010)

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito de Ccochaccasa.
- **Monto de Inversión:**
S/. 1` 391,205,26 nuevos soles
- **Objetivo:** Adecuada atención a 277 beneficiarios directos (Población estudiantil) con una infraestructura moderna y equipada
- **Situación Actual:** Obra concluida el 28/Febrero/2010 y se encuentra en la fase de Pre. liquidación.
- **Logros y Beneficios:** Se viene logrando una enseñanza de calidad y logrando alumnos competitivos.



Avance Presupuestal

META	PIM 2010 S/.	EJECUCION 2010 S/.	SALDO 2010 S/.	AVANCE 2010 %
0137	1` 391,205,26	1` 391,205,26	0	100

1.3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA (AMPLIACIÓN 2010)

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito de Lircay - Carhuapata.
- **Monto de Inversión**
S/ 1` 121,734,93 nuevos soles
- **Objetivo** Adecuada prestación de servicio educativo a la población estudiantil de la zona.
- **Situación actual** Obra concluida el 15/Marzo/2010 y a la fecha se encuentra en la fase de Pre. liquidación.
- **Logros / beneficios** Se viene logrando una mejor calidad de enseñanza a los beneficiarios directos de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
065	1` 121,734,93	1` 121,734,93	0	100

2. EN SALUD:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA MICRORED – SECCLLA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Lircay.
- **Monto de Inversión**
S/ 1`121,734,93 nuevos soles
- **Objetivo:** Mejorar la capacidad operativa y resolutive de los servicios de atención materno infantil en el establecimiento del puesto de Salud de Chahuarma.
- **Situación Actual:** Obra concluida el 04/Febrero/2010 a la fecha esta liquidada con R.G.G.R. N° 293 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR .
- **Logros y Beneficios** Se viene logrando una mejor calidad de atención medica a los pobladores de la zona y lugares aledaños.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
136	1`121,734,93	1`121,734,93	0	100

PROYECTOS EJECUTADOS JULIO A DICIEMBRE, 2010 (Segundo Semestre)

1.4 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY

- **Datos Generales** Provincia de Angaraes, Distritos Lircay
- **Monto de Inversión** S/. 996,143,01 nuevos soles
- **Objetivo** Brindar a la población estudiantil una enseñanza en adecuados ambientes.
- **Situación Actual** Obra en ejecución con un avance físico de 92.99% a la fecha.
- **Logros Beneficios** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.

Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0126	996,143.01	899,955.30	96,187.70	92.99



1.5 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO - VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distritos Julcamarca
- **Monto de inversión:** S/.742,252,00 nuevos soles
- **Objetivo:** Brindar a la población estudiantil joven una enseñanza en adecuados ambientes.
- **Situación Actual:** Obra en ejecución con un avance físico de 100% a la fecha.
- **Logros y beneficios:** Se viene generando empleo mejores oportunidades a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0127	742,252.00	742,252.00	00	100

1.6 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO JUAN VELASCO ALVARADO, PARCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distritos Parco alto.
- **Monto de inversión:**
S/ 1`222,053,33 nuevos soles
- **Objetivo:** Atención adecuada a la población escolar del nivel secundario
- **Situación actual:**
Obra en ejecución con un avance físico de 100% a la fecha se esta elaborando la liquidación técnico financiero de obra.
- **Logros y beneficios:**
Se viene generando empleo mejores oportunidades a los pobladores de la zona.

Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0128	1`222, 053.033	1`222,053,33	00	100



1.7 SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO TOMAS DE PATA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distritos Santo Tomas de Pata.
- **Monto de inversión:** S/ 804,860.72 nuevos soles
- **Objetivo:** brindar una adecuada atención a la población escolar de la zona.
- **Situación actual:** Obra en ejecución con un avance físico de 91.17% a la fecha.
- **Logros y beneficios:** Se viene generando empleo mejores oportunidades a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0131	804,860.72	722,766.13	182,093.87	91.17

1.8 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36287 CUTICSA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Santo Tomas de Pata.
- **Monto de inversión:**
S/ 807,133,27 nuevos soles
- **Objetivo:** brindar una adecuada atención a la población escolar de la zona.
- **Situación actual:**
Obra en ejecución con un avance físico de 100% a la fecha se viene realizando la pre liquidación técnica financiera de obra.
- **Logros y beneficios:**
Se viene generando empleo por ende mejores oportunidades a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0129	807,133.27	807,133.27	00	100

1.9 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA HUANCA HUANCA ANGARAES

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Huanca Huanca
- **Monto de inversión**
S/ 598,658,65 nuevos soles
- **Objetivo:** brindar una educación de excelencia a la población estudiantil.
- **Situación actual:**
La obra se encuentra en ejecución, cuenta con un 75.63% de avance físico.
- **Logros y beneficios:**
Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0121	598,658.65	536,617.24	00	75.63

2. EN SALUD:

2.1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1 - 2 DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO DE LA MICRORRED CCOCHACCASA DE LA RED ANGARAES

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Anchonga.
- **Monto de Inversión:** S/. 743,686,93 nuevos soles
- **Objetivo:** incrementar el acceso en atención de servicios de salud en la comunidad de Tuco y la población de la zona.
- **Situación Actual:** Obra en ejecución con un avance físico de 100% y se está elaborando el informe de pre liquidación técnico financiero de obra.
- **Logros y Beneficios:**
Se viene generando empleo por ende mejores oportunidades a los pobladores de la zona.

Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0125	743,686,93	743,686,93	00	100



2.2 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE HUARIRUMI DE CHONTACANCHA, DISTRITO ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Anchonga
- **Monto de Inversión:** S/. 636,550.90 nuevos soles
- **Objetivo:** Adecuada Capacidad de atención en cuanto a salud a la población de la zona
- **Situación Actual:** Obra en ejecución, este proyecto se viene ejecutando por contrata
- **Logros y Beneficios:** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0130	636,550.90	274,116.70	362,433.30	60.91

3. EN TRANSPORTE:

3.1 MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY – CUTICSA – SANTO TOMAS DE PATA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distritos Santo Tomas de Pata, Seclla, San Antonio de Antaparco.
- **Monto de Inversión:** S/. 2`551,472.18 nuevos soles
- **Objetivo:** Facilitar el acceso a los mercados de Ayacucho, Huancayo y Huancavelica con menores costos , tiempos de viaje y fácil integración de la provincia.
- **Situación Actual:** Obra en ejecución con un avance físico de 60.38% a la fecha.
- **Logros y Beneficios:** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0123	2`551,472.18	1`381,769.24	1`169,702.76	60.38

3.2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE - PAMPA HUASI EN EL DISTRITO DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO -

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distritos Secclla – San Antonio de Antaparco.
- **Monto de inversión:** S/ 1` 110,977,94 nuevos soles
- **Objetivo:** Mejorar el acceso de la población y su producción hacia los mercados locales y regionales
- **Situación Actual:** Obra en ejecución con avance físico de 100% a la fecha.
- **Logros y Beneficios:** Se viene generando empleo, mejores oportunidades a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0124	1`110,977.94	1`110,977.94	00	100

3.3 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito San Antonio de Antaparco.
- **Monto de Inversión:** S/ 2'336,757,73 nuevos soles
- **Objetivo:** Fácil acceso a los mercados y centros de producción, adecuada articulación vial con la provincia de Acobamba, Angaraes y Huancavelica
- **Situación Actual:** La obra se encuentra en ejecución, y cuenta con un 76.00% de avance físico.
- **Logros y Beneficios:** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANCE %
0119	2'336,757	1'141,346.65	922,410.35	76.00

4. SANEAMIENTO BÁSICO:

4.1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY GRANDE

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Huayllay Grande
- **Monto de Inversión :S/**
1`125,456.48 nuevos soles
- **Objetivo:** Disminución de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población en general.
- **Situación Actual:**
La obra se encuentra en ejecución. y cuenta con un 98.00% de avance físico.
- **Logros y Beneficios:**
Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANC E %
0120	1`125,457,48	843,984.74	281,472.26	98.50

5. EN AGRICULTURA:

5.1 CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO PIOCUCO - ANTAPARCO MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES – HUANCVELICA

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito San Antonio de Antaparco.
- **Monto de Inversión:**
S/ 1` 606,991,17 nuevos soles
- **Objetivo:** mejorar y elevar la producción agrícola de la zona
- **Situación Actual:** La obra se encuentra en ejecución, y cuenta con un 68.29% de avance físico.
- **Logros y Beneficios:** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.

Avance Presupuestal

META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANC E %
0118	1`626,610,17	1`206,292.02	420,317.98	68.29



6. OBRAS EN JECUCION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2010:

□ CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIO N° 36562 DE LLANCAPUQUIO

- **Datos Generales:** Provincia de Angaraes, Distrito Anchonga..
- **Monto de inversión:** S/. 1´175,168.76 nuevos soles
- **Objetivo:** promover la atención adecuada a la población estudiantil.
- **Situación actual:** La obra se encuentra en ejecución, y cuenta con un 31.32% de avance físico. Esta obra inicio su ejecución el 16 de Setiembre del presente
- **Logros y beneficios:** Se viene generando empleo a los pobladores de la zona.



META	PIM S/.	EJECUCION S/.	SALDO S/.	AVANC E %
0144	1´175,169,76	306,857.38	868,311.62	31.32

□ MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR

Este proyecto tiene un monto de inversión de S/6´069,743.78 nuevos soles y cuenta con 17 componentes las cuales beneficiaran a la población infantil de la zona sur de Angaraes.

LOS REFERIDOS COMPONENTES SON:

CONSIDERANDO QUE LA OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS I.E. DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR CONSTA DE 17 COMPONENTES LAS CUALES SON:

Nº	NEMÓNICO	NOMBRE DE PROYECTO	AVANCE FÍSICO A LA FECHA	ESTADO SITUACIONAL
1	66	I.E.I. N° 252 LIRCAYCCASA- CONGALLA	34.65%	En ejecución
2	66	I.E.I. N° 152 CHAYNABAMBA - CONGALLA	32.22%	En ejecución
3	66	I.E.I. N° 150 YUNYACCASA - CONGALLA	23.38%	En ejecución
4	66	I.E.I. N° 127 CONGALLA	16.40%	En ejecución
5	66	I.E.I. N° 298 ORCCOCORRAL - CONGALLA	25.24%	En ejecución
6	66	I.E.I. N° 273 CCOPO - CONGALLA	26.72%	En ejecución
7	66	I.E.I. N° 192 ATUNA - SECCLLA	30.82%	En ejecución
8	66	I.E.I. N° 132 SECCLLA	36.33%	En ejecución
9	66	I.E.I. N° 184 HUARACOPATA - SECCLLA	51.06%	En ejecución
10	66	I.E.I. N° 535 TRANCA - SECCLLA	59.94%	En ejecución
11	66	I.E.I. N° 299 ECCANA - SECCLLA	37.70%	En ejecución
12	66	I.E.I. N° 151 CARCOSI - CONGALLA	38.59%	En ejecución
13	66	I.E.I. N° 193 YURACCOCHA - JULCAMARCA	23.00%	En ejecución
14	66	I.E.I. N° 124 JULCAMARCA	19.00%	En ejecución
15	66	I.E.I. N° 455 MAICENA - ANTAPARCO	20.39%	En ejecución
16	66	I.E.I. N° 185 CUTICSA - SANTO TOMAS DE PATA	14.15%	En ejecución
17	66	I.E.I. N° 137 SANTO TOMAS DE PATA	15.28%	En ejecución

RESUMEN DE OBRAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO DESDE EL PRIMER SEMESTRE.

N°	MNM	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	Resolución gerencial	UBICACIÓN		META PRESUPUESTARIA	UO.RESP.	PLAZO	FECHA DE INICIO REAL
					PROV	DISTRITO	TOTAL			
1	123	66288	Mejoramiento Carretera Antamachay - Cuticsa - Santo Tomas de Pata - Chupacc	RGR N° 202-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	2'551,472,18	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	21 DE JUNIO
2	126	36595	Ampliación de Infraestructura de la I.E. de Mujeres Nuestra Señora del Carmen - Lircay - Angaraes	RGR N° 201-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	LIRCAY	996,143,01	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	07 DE MAYO
3	127	82580	Construcción de Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público - Virgen de Cocharcas - Julcamarca	RGR N° 121-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	JULCAMARCA	742,252,00	G.S.R. ANGARAES	120 DIAS	03 DE MAYO
4	124	66726	Mejoramiento y construcción de Carretera Puente Romero - Cullupite - Pampa Huasi en el Distrito de Seclla y San Antonio de Antaparco - Angaraes - Huancavelica	RGR N° 145-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	SECCLLA	1'110,976,94	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	03 DE MAYO
5	128	119663	Construcción y Equipamiento de la infraestructura de la Institución Educativa Secundario Juan Velasco Alvarado, Parco Alto del Distrito de Anchonga, provincia de Angaraes	RGR N° 169-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	ANCHONGA	1'222,053,33	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	03 DE MAYO
6	131	116853	Sustitución y Equipamiento de la institución Educativa Santo Tomas de Aquino - Santo Tomas de Pata	RGR N° 176-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	804,859,72	G.S.R. ANGARAES	150 DIAS	02 DE JUNIO
7	129	126267	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 36287 Cuticsa	RGR N° 177-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	807,132,27	G.S.R. ANGARAES	150 DIAS	18 DE MAYO
8	125	124059	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de Salud de Nivel 1 - 2 de Atención del puesto de salud de Tuco de la Microred Ccochaccasa de la Red Angaraes del departamento de Huancavelica	RGR N° 195-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	CCOCHACCA ASA	743,686,93	G.S.R. ANGARAES	120 DIAS	02 DE JUNIO

9	130	123816	Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de Salud de Huarirumi de Chontacancha, distrito Anchonga - Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica.	RGR N° 044-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	ANCHONGA	636,549,90	G.S.R. ANGARAES	136 DIAS	19 DE AGOSTO
10	120	101926	Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Huayllay Grande	RGR N° 050-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	1'125,456,48	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	01 DE JUNIO
11	121	64680	Mejoramiento de la infraestructura Educativa Publica San Antonio de Padua Huanca Huanca - Angaraes	RGR N° 047-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	HUANCA - HUANCA	598,657,65	G.S.R. ANGARAES	150 DIAS	02 DE JUNIO
12	118	57024	Construcción canal de Riego Plocucho - Antaparco Magnopampa, distrito de San Antonio de Antaparco - Angaraes - Huancavelica	RGR N° 064-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	1'606,991,17	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	18 DE MAYO
13	119	44725	Mejoramiento del camino vecinal tramo Pomacocha - Huancas - totora	RGR N° 051-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	2'336,757,73	G.S.R. ANGARAES	180 DIAS	03 DE MAYO
14		107989	construcción y equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario N° 36562 de Llancaquiquio	RGR N° 087-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	Llancaquiquio - Anchonga	1'175,168.76	G.S.R. ANGARAES	150 días	01 de setiembre
15		95802	Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas de nivel inicial Angaraes SUR	RGR N° 057-2009-GR-HVCA/GRI	ANGARAES	MULTIDISTRITAL	6'069,743.78	G.S.R. ANGARAES	90 días	16 de Agosto

