



## I Audiencia Pública Regional HUANCAVELICA 2011

Trabajamos para todos...!

**OBRAS**


Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 141° de la Ley N° 27160 Ley de Reforma Constitucional de Descentralización, concordante con el Art. 31 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Artículo 142° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**  
*Trabajamos para todos*



**Ing. Guillermo Quispe Torres**  
Director Regional de Supervisión



**OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 141° de la Ley N° 27160 Ley de Reforma Constitucional de Descentralización, concordante con el Art. 31 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Artículo 142° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

## A.- OBJETIVO GENERALES

- Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura dentro del ámbito regional teniendo en cuenta las funciones consignadas en el ROF:
- Normar, monitorear, **supervisar**, liquidar y transferir obras.



## B.- OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Control de las medidas de seguridad durante la ejecución de obra, previniendo riesgos mediante la prevención activa (Procedimiento de trabajos realizados según criterios avanzados de seguridad), como de prevención pasiva (Casco, Cinturones de seguridad, etc.)
- Control de Calidad en Obra que esta referido al cumplimiento y aplicación de las especificaciones técnicas y en tal sentido se controla la calidad de los materiales que se bien empleando, éste control de enfoca en los siguientes Controles:
  - ✓ Materiales Adecuados de las canteras recomendadas y en las cantidades necesarias.
  - ✓ Pruebas de calidad INSITU de los materiales naturales.
  - ✓ Preparación – dosificación adecuada de los materiales.
  - ✓ Corte – Doblado y colocado de armaduras, encofrado, entubados, etc.
  - ✓ Rechazo de todo material o trabajo mal ejecutado.
  - ✓ Muestreos, pruebas de campo y ensayos de laboratorio.
  - ✓ Aprobación y/o conformidades de los materiales antes de su uso y la ejecución de trabajo.
  - ✓ Interpretación de resultados en las pruebas de calidad.
  - ✓ Efectuar pruebas que garanticen la capacidad portante del terreno según diseño.
- Control para evitar sobre costos; se viene exigiendo al contratista el cumplimiento de su programación de obra PERT-CPM. En caso de atraso inmediatamente se le comunicará para que re programe sus actividades de acuerdo a las normas vigentes y a los plazos de ley. Es decir se viene controlando al contratista para que evite su desorden técnico – administrativo evitando elevar el costo de obra.
- Se viene exigiendo en todo momento el cumplimiento de las especificaciones técnicas para la obra, no permitiendo al contratista cambios injustificados que eleven el costo de la obra.
- En cuanto a los aspectos ambientales que puedan afectar el proyecto, se ésta teniendo en consideración las normas Ambientales aplicadas. De ésta forma no deben surgir imponderables que puedan ser motivo de elevar el costo establecido de la obra.

**OBRAS SUPERVISADAS POR MODALIDADES  
2002 - 2010**

PROVINCIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						CONVENIO						CONTRATA						TOTAL DE OBRAS
	N° OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	N° OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	N° OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	
ACOBAMBA	56	29	15	1	4	6	15	7	2	2	0	4	7	1	2	1	0	3	78
ANGARAES	42	19	13	3	0	7	9	5	0	1	0	3	5	0	1	1	0	3	56
CASTROVIRREYNA	38	16	6	0	0	16	13	8	0	4	1	0	5	2	1	1	1	0	56
CHURCAMP	31	14	12	2	1	2	30	18	3	0	0	9	2	0	2	0	0	0	63
HUANCAVELICA	67	19	32	1	2	13	42	31	1	3	0	6	18	8	4	1	0	5	127
HUAYTARA	33	18	7	1	1	6	17	7	2	3	0	5	65	4	7	2	50	2	115
TAYACAJA	71	51	17	0	1	2	34	20	5	5	0	4	7	4	2	0	0	1	112
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>166</b>	<b>102</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>160</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>109</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>607</b>

**OBRAS SUPERVISADAS - PERIODO  
2002 - 2010**

PROVINCIAS	TOTAL DE OBRAS	TOTAL SEGÚN LAS 3 MODALIDADES				
		TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	LIQUIDADOS	POR INICIAR
ACOBAMBA	78	37	19	4	13	4
ANGARAES	56	24	14	5	13	0
CASTROVIRREYNA	56	26	7	5	16	2
CHURCAMP	63	32	17	2	11	1
HUANCAVELICA	127	58	37	5	24	2
HUAYTARA	115	29	16	6	13	51
TAYACAJA	112	75	24	5	7	1
<b>TOTAL</b>	<b>607</b>	<b>281</b>	<b>134</b>	<b>32</b>	<b>97</b>	<b>61</b>

## OBRAS LIQUIDADAS - 2011

PROVINCIAS	OBRAS LIQUIDADAS 2011	
	Nº OBRAS 2011	MONTO DE LIQUIDACION
ACOBAMBA	1	401,557.35
ANGARAES	5	6,077,349.75
CASTROVIRREYNA	3	2,983,380.70
CHURCAMP	0	0
HUANCAMELICA	13	12,752,747.41
HUAYTARA	4	2,094,717.08
TAYACAJA	5	10,530,457.79
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>34,840,210.08</b>

MODALIDAD	OBRAS LIQUIDADAS 2011
ADMINISTRACION DIRECTA	08
CONVENIO	03
CONTRARA	19
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>


## OBRAS SUPERVISADAS - 2011

PROVINCIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						CONTRATA						TOTAL DE OBRAS
	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	
ACOBAMBA	12	4	7	1	0	0	02	0	0	0	2	0	14
ANGARAES	1	0	1	0	0	0	01	0	0	0	1	0	01
CASTROVIRREYNA	4	0	3	0	1	0	02	0	2	0	0	0	06
CHURCAMP	2	0	2	0	0	0	00	0	0	0	0	0	02
HUANCAMELICA	6	0	6	0	0	0	03	1	1	0	1	0	09
HUAYTARA	1	0	1	0	0	0	47	18	24	1	04	0	48
TAYACAJA	4	1	3	0	0	0	05	0	2	0	3	0	09
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>90</b>

**OBRAS SUPERVISADAS-2011**

PROVINCIAS	TOTAL DE OBRAS	TOTAL SEGÚN LAS 3 MODALIDADES				
		TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADOS
<b>ACOBAMBA</b>	<b>14</b>	4	7	1	2	0
<b>ANGARAES</b>	<b>2</b>	0	1	0	1	0
<b>CASTROVIRREYNA</b>	<b>6</b>	0	5	0	1	0
<b>CHURCAMPÁ</b>	<b>2</b>	0	2	0	0	0
<b>HUANCAVELICA</b>	<b>9</b>	1	7	0	1	0
<b>HUAYTARA</b>	<b>48</b>	18	25	1	4	0
<b>TAYACAJA</b>	<b>9</b>	1	5	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**CUADRO DE RESUMEN ESTADISTICO DE OBRAS**

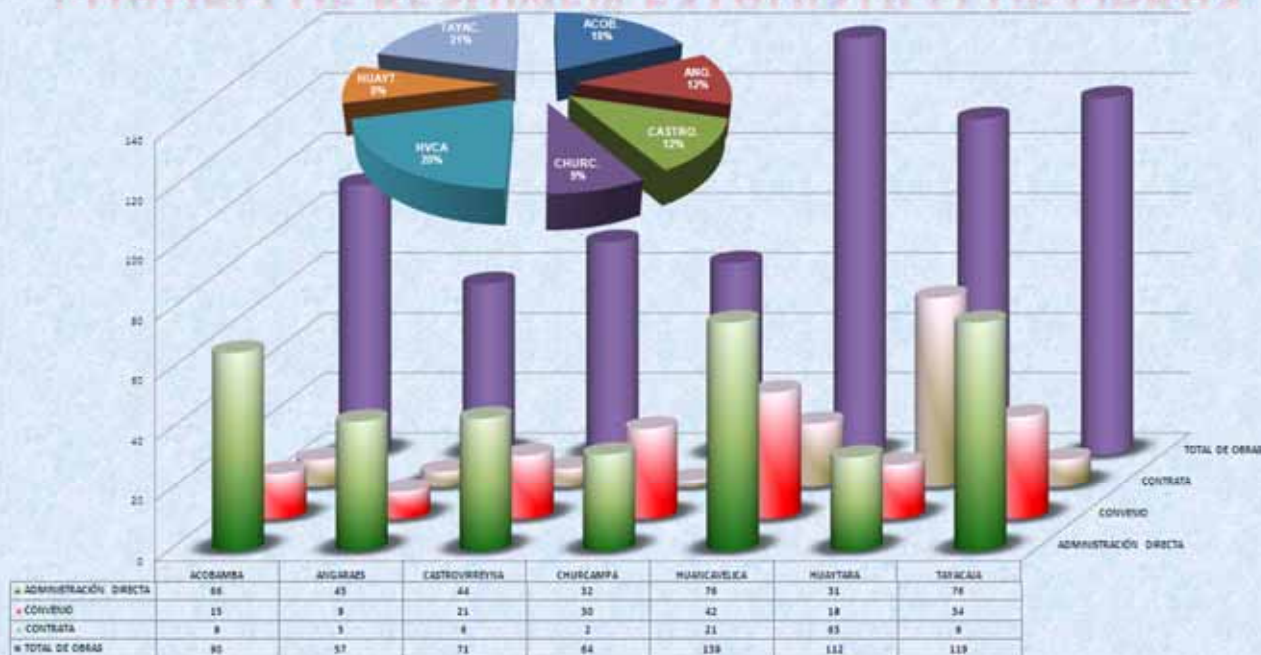

ACCIONES DE GESTION		
SITUACION ENCONTRADA	ACCIONES TOMADAS	OBJETIVOS A CORTO PLAZO
<b>EJECUCION DE OBRAS</b>		
Estudios definitivos con deficiencias técnicas y problemas de libre disponibilidad de terreno.	Se vienen solucionando en la etapa de ejecución de obra, lo que viene generando ampliaciones de plazo, Adicionales de Obra, Deductivos, reformulaciones.	Superar las deficiencias con una adecuada evaluación de los estudios definitivos, en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y el Comité Regional de Evaluación de Exp. Téc. Un buen Expediente técnico garantiza una buena obra
Proyectos Atomizados	Coordinando con las Unidades formuladoras, se viene priorizar proyectos de impacto Regional	Obras de embargadura de impacto regional
129 Obras por convenio suscrito por las anteriores gestiones, que tiene problemas en la etapa de Ejecución, algunas paralizadas y otras sin liquidar, habiéndose incumplido los términos del convenio.	La Dirección de Supervisión viene evaluando las acciones que correspondan ante las Unidades Ejecutoras.	Resolver los convenios por incumplimiento, proceder con las Liquidaciones de Oficio, ejecutar y culminar las obras por administración directa.
<b>SUPERVISION DE OBRAS</b>		
Limitada Capacidad Operativa de la Dirección de Supervisión, y las sub Gerencias Regionales de Supervisión y Liquidación	Propuesta en marcha para mejorar la operatividad de la Dirección de Supervisión y Liquidación de Obras	Adecuada capacidad operativa de la Dirección Regional de Supervisión y Liquidación, para un eficiente cumplimiento de funciones.
Ineficiente función de los consultores en supervisión de Obras	Mayor Seguimiento y monitoreo a las obras y supervisores	Consultores en supervisión de obras con mayor permanencia en obra; mejorar los disgregados de costos de supervisión desde la etapa de formulación a nivel de pre inversión, capacitación en temas de supervisión
<b>LIQUIDACION DE OBRA</b>		
410 Obras sin liquidar	Liquidación de las Obras en la situación actual, incluyendo por la modalidad de Oficio, con las consecuencias que ameriten las diferentes situaciones encontradas	Liquidar las Obras, a fin de asegurar otras intervenciones necesarias en beneficio de las poblaciones afectadas, incremento de la capacidad operativa en temas de liquidación

*Trabajamos para todos...!*

**OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	13,703,020.90	34.37%	36.75%	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ALCANTARILLA
CONSTRUCCION <u>CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI</u>	ROSARIO	2,511,095.71	2.31%	1.68%	OBRA EN EJECUCION NORMAL, SE REALIZA EL TRABAJO DE TRAZO Y REPLANTEO DE EJES
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA	CAJA ESPIRITU	148,756.53	0.00%	0.00%	OBRA REINICIADO, SE INTERVIENE POR ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA	CHINCHIHUASI	908,578.15	70.60%	86.33%	REINICIO DE OBRA CON FECHA 18/10/2011
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. <u>LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO</u> - CHURCAMP - HUANCVELICA	ANCO	862,874.80	1.97%	19.62%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FÍSICO	ESTADO ACTUAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. CATOLICO BILINGUE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA BARBARA	HUANCAVELICA	3,078,901.48	97.60%	100.00%	OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE LA ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE OROPESA	HUANCAVELICA	1,157,620.14	98.79%	95.35%	OBRA CULMINADO, PAGOS PENDIENTES DEBIDO A LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 36321 - PUCAPAMPA - HUANCAVELICA	YAULI	1,103,223.96	98.58%	99.02%	OBRA CULMINADO, PROCESO DE REVISION DE LA PRELIQUIDACION DE OBRAS EN LA ORSYL
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE LA RED HUANCAVELICA	ACORIA	513,824.81	83.49%	80.33%	OBRA CULMINADO REFERENTE A LO FISICO, FALTANDO LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO. PROCESO DE PRE LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	YAULI	536,067.07	97.43%	99.83%	OBRA CULMINADO EN LO FISICO, FALTANDO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA NIVEL SECUNDARIA DE MANORES DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	YAULI	735,969.61	86.49%	94.26%	OBRA CULMINADO CON DEDUCTIVOS EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, SE REQUIERE AMPLIACION PRESUPUESTAL.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRO DE LA MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCAVELICA DE LA REGIÓN HUANCAVELICA	ACORIA	525,360.99	74.92%	82.26%	CULMINADO LA PARTE FISICA, FALTA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	IZCUCHACA	561,437.20	72.64%	85.00%	CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE MANTA - HUANCAVELICA	MANTA	994,143.92	100.00%	100.00%	PROCESO DE PRELIQUIDACION
REHABILITACION DEL PUENTE BOLICHE POR DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	YAULI	60,568.75	100.00%	77.22%	OBRA CULMINADA, PROCESO DE REVISION DE LA PRE LIQUIDACION SEDE CENTRAL
REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE, EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 2010.	HUANCAVELICA	84,425.00	88.57%	100.00%	LIMPIEZA Y DEMOLICION DEL TALUD DONDE SE CONSTRUIRA EL MURO PANTALLA ACARREO DE MATERIAL EN DEMOLICION, NO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	PALCA	1,426,007.43	97.03%	100.00%	OBRA CULMINADA, FALTANDO ENTREGAR

*Trabajamos para todos...!*

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FÍSICO	ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	YAULI	2,008,380.46	83.28%	98.36%	ADICIONALES Y MAYORES METRADOS : PROGRAMADO 21.79% EJECUTADO 21.79%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (PUCACCASA CHOPCA)	YAULI	525,467.24	98.28%	77.07%	REQUIERE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (CCOLLPACCASA)	YAULI	618,740.28	93.62%	92.96%	FALTA CULMINAR EL PINTADO, REQUIERE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (CONDOR HUACHANA)	YAULI	628,254.57	97.64%	69.09%	FALTA CULMINAR EL PINTADO, REQUIERE AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	ASCENSION	2,749,156.39	70.18%	81.52%	ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO ARMADO EN LOS ESTRIBOS DE PUENTES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANDO	1,010,582.90	87.67%	96.46%	LIGERAMENTE ATRAZADO POR FALTA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, COLOCADO DE CONCRETO EN VEREDA PERIMETRICA DE LOSA DEPORTIVA

*Trabajamos para todos...!*

OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA  
QUE SE VENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCION

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	1,296,109.42	83.99%	99.72%	OBRA CULMINADO FISICAMENTE, FALTANDO CAPACITACION Y PLANTADO DE ARBOLES
INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	NUEVO OCCORO	1,280,351.11	23.25%	41.81%	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA INCLINADA DEL 2DO NIVEL
INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO	NUEVO OCCORO	1,962,940.00	63.90%	60.72%	TARAJEO FROTACHADO EN PASADIZO DEL 2DO NIVEL Y SERVICIOS HIGIENICO
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI	YAULI	1,207,463.82	76.51%	82.80%	LIJADO DE MUROS, CIELORAZOS, COLUMNAS Y VIGAS PARA EL COLOCADO DE LA PINTURA, REFORMULADO EL CALENDARIO DE EJECUCION
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	1,051,701.25	52.69%	48.60%	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA INCLINADA DEL 2DO NIVEL
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	1,419,053.74	36.50%	49.83%	COLOCADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA INCLINADA, CORTE DE RASANTE PARA LOSA DEPORTIVA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	YAULI	1,682,557.69	20.35%	26.47%	TARRAJEO EN MURO EXTERIOR DEL SERVICIO HIGIENICO, COLOCACION DE CONCRETO ARMADO EN LOZA ALIGERADA
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSION, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	4,402,610.54	2.26%	1.07%	OBRA INICIADA TENIENDO COMO PROFESIONAL ENCARGADO DE SUPERVISAR CON CARGO INSPECTOR
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	754,481.82	34.74%	18.86%	SE EJECUTA MOVIMIENTO DE TIERRA Y COLOCADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS, COLOCADO DE ACERO Y CONCRETO EN ROMPEPRESION

*Trabajamos para todos...!*

MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACCOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY

**Generales:**

- **Localidad** : Multi localidad
- **Distrito** : Acobamba, Caja Espiritu, Pomacocha, Marcas
- **Provincia** : Acobamba

**Monto de inversión:** S/. 13'703,020.90

**Objetivo** : Facilidad en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo.

**Avance** : 65.63% Físico 34.37% Presupuestal

**Situación Actual** : Obra en Ejecución, se realiza relleno compactado con material seleccionado en alcantarilla, ampliación de la plataforma de vía

**Logros y Beneficios:** Construcción y mejoramiento de una Carretera Vecinal Tipo 3 (CV-3), ancho de superficie de rodadura 3.50 m. a nivel de afirmado en 12.94 km., de Minabamba (Palmira Alta) a Mayunmarca con espesor de 0.15 m. compactada en todo el tramo. Se construirán cunetas (0.50 x 0.30 m.), obras de arte (10 alcantarillas y cunetas de drenaje).



*Trabajamos para todos...!*



## CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI

ADM. DIRECT. - EJECUCION

### Generales:

- **Localidad** : Marco Bamba, Villa mantaro, Auquiembra, Andabamba y Rosaro.
- **Distrito** : Rosario
- **Provincia** : Acobamba

**Monto de inversión:** S/. 2'511,095.71

**Objetivo** : Facilidad para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo.

**Avance** : Obra iniciada trabajos preliminares, movimiento de tierras, alcanzando el 1.68% Físico 2.31% Presupuestal

**Metas:** Construcción de 11.5 KM de carretera entre Villa Mantaro - Utcuñi, ancho de calzada 3.50 m. con materiales afirmados fino (e=25CM), obras de artes (16 badenes, 09 alcantarillas circulares TMC 48(cunetas y muros de contención).

**Logros y Beneficios:** Facilidad para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo, generando trabajo y calidad de vida.



*Trabajamos para todos...!*

## CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA

ADM. DIRECT. - PARALIZADO

### Generales:

- **Localidad** : Coras
- **Distrito** : Caja Espiritu
- **Provincia** : Acobamba

**Monto de inversión:** S/. 148, 756.53

**Objetivo** : Adecuada atención de la población escolar en la Institución Educativa Coras Pomacancha.

**Avance** : 0% Físico 0% Presupuestal

**Situación Actual** : Obra Reiniciado por AD; del 30/10/2011, por motivos de resolución de convenio entre la municipalidad distrital de caja con el Gob.Reg. Hvca

**Metas:** Construcción de 03 Aulas de Estudio, 01 Gabinete de EE. FF., 01 Auditorium, 01 Dirección, 01 Tópico, 01 Depósito de Mat. Educ. , 01 Secretaría, 01 Cocina y Comedor, 01 Laboratorio, 01 Sala de Cómputo, 01 Biblioteca, 02 Escaleras, Const. de Servicios, Cerco Perimétrico, Construcción de una losa deportiva multiuso. Equipamiento y/o Implementación.

**Logros y Beneficios:** Generar puestos de trabajo temporal y mejora de la calidad educativa de los alumnos.



*Trabajamos para todos...!*

## MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA

### Generales:

- Distrito :
- Localidad : Esmeralda
- Provincia : Churcampa
- Estado : Ejecución

Monto de inversión: S/. 908,578.15

**Objetivo:** Poblacion escolar de la I. E. ingenio de Chinchihuasi adecuadamente atendida.

**Estado Actual:** Avance fisico de 86.33%, reinicio de obra con fecha 18/10/2011.

**Metas:** 01 Sala de Usos Múltiples (culminación) - 6.35m. X 12.60m. 01 Centro de Computo - 6.35m. X 12.60m. 01 Dirección - 5.25 m. x 7.05 m. 01 Biblioteca - 5.25 m. x 14.10m. 01 Laboratorio - 5.25 m. x 14.10m. Sala de Recursos Educativos - 5.25 m. x 7.05 m. 01 Losa Deportiva - Patio de Honor - 17.00 m. x 32.00 m. 02 Campos Deportivos Ecológicos - 12.00 m. x 20.00 m. Muro Perimétrico (culminación y apertura de puerta) - 63.70 ml. Estacionamiento Ecológico, Graderías Ecológicas, techo del segundo nivel será de vigas de concreto armado, viguetas de madera y techo de teja andina

**Logros y beneficios:** Generar puestos de trabajo temporal y mejorar la calidad Educativa de los 2,110 estudiantes acorde a nuestro tiempo.

*Trabajamos para todos...!*



## CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA

### Generales:

- Distrito : Anco
- Localidad : Esmeralda
- Provincia : Churcampa
- Estado : Ejecución

Monto de inversión: 862,874.80

**Objetivo:** Adecuada condiciones físicas para la prestación del servicio educativos en la Institución Educativa la Esmeralda de Anco.

**Estado :** Mejoramiento a nivel de acabados a los (07 aulas, 02 SS-HH, 01 biblioteca, 01 laboratorio, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala de espera, con su respectivo instalación eléctrica y sanitaria).

**Metas:** Mejoramiento a nivel de acabados a los (07 aulas, 02 SS-HH, 01 biblioteca, 01 laboratorio, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala de espera, con su respectivo instalación eléctrica y sanitaria).

**Logros y beneficios:** Generar puestos de trabajo temporal y mejorar la calidad Educativa de los estudiantes acorde a nuestro tiempo.

*Trabajamos para todos...!*



**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

N°	DESCRIPCION	DISTRITO	MONTO S/.	PRESUPUESTAL	FISICO	SITUACION ACTUAL
01	ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-SECTOR II -SALDO DE OBRA	MULTIPROVINCIAL	3,970,031.54	87.15%	100.00%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA, POR LA EMBERGADURA DEL PROYECTO

N°	DESCRIPCION	DISTRITO	MONTO S/.	PRESUPUESTAL	FISICO	SITUACION ACTUAL
01	MEJORAMIENTO DE <u>CARRETERA COCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCASA</u> EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	LIRCAY	1,936,160.63	00.00%	00.00%	OBRA EN COORDINACIONES PARA INICIAR

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	HUACHOS	614,524.79	0.00%	12.97%	OBRA INICIADA EN EL MES DE NOVIEMBRE
RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	VILLA DE ARMA	572,127.53	78.31%	98.00%	LA OBRA PRESENTA RETRASO PARA SU TERMINO, SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO
RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCVELICA	TICRAPO	535,711.32	8.74%	10.98%	OBRA PARALIZADA SIN AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA, CON PLAZO VENCIDO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA

**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. <u>JOSE GÁLVEZ EGÚSQUIZA DE ACORIA</u> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	1,653,000.50	77.09%	100.00%	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 408-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (25/AGO/2011)
CONSTRUCCIÓN DE LA I.E <u>SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA</u> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	1,229,848.26	80.79%	100.00%	LIQUIDACION DEL CONTRATO R.G.G.R. N° 564-2011/GOB.REG-HVCA/GGR (19/OCT/2011) FALTA LIQUIDACION FINAL
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. <u>PUEBLOS UNIDOS DE HUAYLLACCOTO</u> , DISTRITO DE ACORIA, HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	1,371,663.51	63.61%	100.00%	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA APROBADO CON R.G.G.R. N° 382-2011 (22-08-2011), FALTA LIQUIDACION FINAL
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. <u>CIRO ALEGRIA BAZAN DE MUQUECC BAJO</u> , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	ACORIA	874,575.84	99.17%	100.00%	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA CON OBSERVACIONES.
MEJORAMIENTO PERIODICO DE LA <u>CARRETERA CHONTA - HUACHOCOLPA PALCAS UCHCUPAMPA</u>	SANTA ANA, HUACHOCOLPA PALCAS UCHCUPAMPA	1,453,457.63	85.12%	100.00%	CONFORMACION DE COMITÉ DE RECEPCIÓN EN TRAMITE DE APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA <u>CARRETERA MOYA - ISLAYCHUMPI - PUTACCA - YAUYOPATA</u> PROVINCIA DE HUANCVELICA	MOYA	1,096,817.40	37.71%	100.00%	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA EN REVISION POR PARTE DEL MONITOR
REHABILITACION, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL <u>SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO</u> , DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCVELICA	ACOBAMBILLA	258,768.80	100.00%	100.00%	OBRA CULMINADA, EN TRAMITE DE COMISION DE RECEPCION
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE <u>ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO</u> DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCVELICA-HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	969,226.49	29.65%	29.65%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO
REHABILITACIÓN DE <u>TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA</u> - CUENCA	CONAYCA CUENTA				OBRA EN COORDINACIONES PARA INICIAR
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA <u>CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS</u>	MULTIDISTRITAL	1,003,711.21	1.09%	12.04%	OBRA EN EJECUCION, ATRASADA, CON CRONOGRAMA ACELERADO

## ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA-SECTOR II SALDO DE OBRA (ANTA)

### Generales:

- Localidad : Anta
- Distrito : Anta
- Provincia : Acobamba
- Estado : Culinado

**Monto de inversión:** 3,970,031.54

**Objetivo:** Mayor cobertura del Servicio eléctrico a la población no atendida y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos que brindan diferentes servicios.

**Situación actual:** Obra culminado se encuentra en proceso de recepción de obra, por la envergadura del proyecto

**Metas:** Incremento de la cobertura de servicio Eléctrico a la población no atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos que brindan deficiente servicio y no permite el desarrollo de actividades productivas.

**Logros y beneficios:** mayor cobertura de Servicio Eléctrico, mejoras en el desarrollo socio económico de la población beneficiaria.



CONTRATA - CULMINADO

*Trabajamos para todos...!*

## MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA

### Generales:

- Localidad : Varios
- Distrito : Secclla
- Provincia : Angaraes

**Monto de inversión:** S/. 1,936,160.63

**Objetivo** : Adecuada Transitabilidad vehicular en la ruta Ccochatay – Lircayccasa – Chaynabamba que beneficia el intercambio de productos y traslado de pasajeros

**Metas** : Mejoramiento de la Carretera carrozable de 22+480km con un ancho de calzada de 3.50 m, colocación de hitos kilométricos, Constitución y capacitación de un comité en la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial

**Situación Actual:** Se vienen coordinando para el Inicio de Obra

**Logros y Beneficios:** El mejoramiento de la carretera es con el propósito de eliminar los tramos críticos, dar un mejor servicio y reducir el deterioro actual de la vía, beneficiando a 925 personas directamente.

*Trabajamos para todos...!*

## REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA – CHAKICOCHA - CUENCA

### Generales:

- Localidad : Conayca y Cuenca
- Distrito : Conayca y Cuenca
- Provincia : Huancavelica

**Monto de inversión:** S/. 1,983,093.40

**Objetivo:** Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de pasajeros y carga

**Metas :** Longitud total del tramo : 19+900.00 Km.Velocidad directriz : 35 KPHNumero de carriles : 1Ancho de vía : 4.00 mt.Radio Mínimo : 25.00 mtRadio Mínimo excepcional : 20.00 mt.Radio Máximo : 200.00 mt.Pendiente Máxima : 4 %Pendiente Mínima : 1 %Superficie de rodadura : Superficie de afirmado e=0.05 mt Sistema de drenaje : Alcantarillas de concreto armado Cunetas

**Situación Actual:** Se esta coordinando para el Inicio.

**Logros y Beneficios:** Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de pasajeros y carga,generar puestos de trabajo temporal y calidad de vida de los 3,976 personas

*Trabajamos para todos...!*

## RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS- CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

### Generales:

- Distrito : Huachos
- Localidad : Huachos
- Provincia : Castrovirreyña
- Estado : Ejecución

**Monto de inversión:** 614,524.79

**Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Huachos.

**Situación actual:** No se inicia por que el expediente técnico no es compatible con la Obra.

**Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

**Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Huachos. Atención adecuada a la Población.



*Trabajamos para todos...!*

## RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA - CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA

### Generales:

- **Localidad** : Villa de Arma
- **Distrito** : Villa de Arma
- **Provincia** : Castrovirreyna
- **Estado** : Culminado


**Monto de inversión:** 572,127.53

**Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Villa de Arma.

**Situación actual:** Obra culminado, en tramite solicitar comité de recepción

**Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: 01 Hall de recepción, 01 Secretaria y 01 Administración, 01 Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

**Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Villa de Arma. Atención adecuada a la Población.

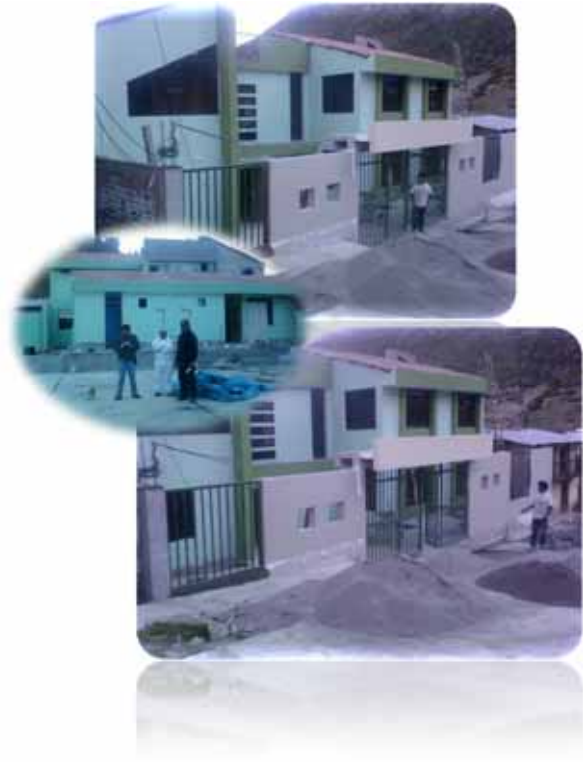

*Trabajamos para todos...!*

## RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO-CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA

### Generales:

- **Distrito** : Ticrapo
- **Localidad** : Ticrapo
- **Provincia** : Castrovirreyna
- **Estado** : Paralizado

**Monto de inversión:** 535,711.32

**Objetivo:** Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de Ticrapo.

**Situación actual:** Obra paralizada sin autorización del supervisor de obra, con plazo vencido, se encuentra en tramite aprobación de adicional de obra.

**Metas:** Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli funcional.

**Logros y beneficios:** Brindar los servicios básicos al personal de la Policía Nacional de la comisaria de Ticrapo. Atención adecuada a la Población.



*Trabajamos para todos...!*

**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO - FORSUR  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, DISTRITO DE QUITO ARMA	QUITO ARMA	881,512.16	28.61%	39.50%	OBRA CON PLIEGO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE RECEPCION DE OBRA
CONSTRUCCION DE 01 AULA PARA EL PRONEI DE PORONCOCHA, DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ	LARAMARCA	88,590.00	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	OCOYO	334,012.16	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, TRAMITE DE RESOLUCION DE COMISION DE RECEPCION
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.M. N° 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	OCOYO	200,042.18	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, RESOLUCION DE RECEPCION N° 723-2011 DE FECHA 01/12/2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22563 SAN BARTOLOME	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	173,449.69	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, EN EL PLAZO ESTABLECIDO, RESOLUCION DE COMISION DE RECEPCION N° 729-2011 DE FECHA 02/12/2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. P.M N° 22195 DE VICHURI	OCOYO	194,945.80	0.00%	100.00%	CULMINADO, COMISION DE RECEPCION FORMADA BAJO ACTO RESOLUTIVO
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22647 PAMPAHULLCA- QUERCO	QUERCO	117,455.39	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION APROBADO CON RGR N° 637-2011 DE FECHA 10/11/2011, LOS MISMOS REALIZARON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES LAS MISMAS QUE SE CUMPLIERON, PARA LUEGO VOLVER A RECEPCIONAR
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	91,999.98	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADA, COMISION DE RECEPCION EN TRAMITE
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22650 MOLLEPATA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	104,689.00	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, RECEPCIONADO PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	97,000.00	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, RESOLUCION DE RECEPCION N° 700-2011 DE FECHA 24/11/2011
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL I.E.P.M N° 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	OCOYO	347,003.72	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADA, CON COMITÉ DE RECEPCION CONFORMADA EN TRAMITE

*Trabajamos para todos...!*

**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO - FORSUR  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22220 YERBABUENAYOCCC	HUIRPACANCHA	183,693.02	0.00%	92.46%	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION SOLICITADO CON SISGEDO 386652
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22624 CCOLLCCAPAMPA	QUITO ARMA	114,740.29	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, COMITÉ DE RECEPCION
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. P. M N° 22194- SAN ISIDRO DE TARACACHI	OCOYO	197,425.80	0.00%	85.00%	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION N° 724-2011 DE FECHA 01/12/2011
RECONSTRUCCION DE CEPTRON N° 34023- CORDOVA - HUAYTARA HUANCAVELICA	CORDOVA	165,297.34	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, COMISION DE RECEPCION EN TRAMITE
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22173 DE APACA- CORDOVA	CORDOVA	188,400.62	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, CON COMITÉ DE RECEPCION EN TRAMITE
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22025 DE CHINCHIHUA	QUITO DE ARMA	103,663.14	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO
RECONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. J N° 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	119,997.64	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADA, Y RECEPCIONADA CON FECHA 16/11/2011
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36540 HUAYLLAHUAQUI	SANTIAGO DE CUSICANCHA	173,640.56	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, COMITÉ DE RECEPCION N° 698 DE FECHA 24/11/2011
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22207 SAN MARTIN DE PALMACANCHA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	309,817.45	0.00%	95.00%	OBRA CULMINADO CON COMISION DE RECEPCION SOLICITADO CON SISGEDO 365619
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22217 YANACOLPA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	314,260.63	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 220 CUSICANCHA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	110,594.19	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, RECEPCIONADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 218 QUITO ARMA	QUITO ARMA	109,118.59	0.00%	100.00%	OBRA CULMINADO, RECEPCIONADO EN PROCESO DE LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA

*Trabajamos para todos...!*

**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO - FORSUR  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (\$.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI N° 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	LARAMARCA	144,477.22	40.61%	76.45%	OBRA EN EJECUCIÓN, SIN EMBARGO SU PLAZO DE EJECUCIÓN SE ENCUENTRA VENCIDA (PAQUETE DE 6 OBRAS)
MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARÁ - HUANCAVELICA	SAN ISIDRO	774,761.40	15.80%	59.89%	OBRA ATRASADA, CON PLAZO VENCIDO, SE TIENE PROBLEMAS SOBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCHE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA	SANTIAGO DE CORDOVA	1,331,823.12	23.35%	54.06%	CALENDARIO DE EJECUCION REFORMULADO. CARTAS VENCIDAS, EN SOLICITUD DEL LA 5TA. AMPLIACION DE PLAZO
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS	MULTIDISTRITAL	1,003,711.21	1.09%	12.04%	OBRA EN EJECUCION, ATRASADA, CON CRONOGRAMA ACELERADO
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22167 - TAMBO CRUZ	HUIRPACANCHA	181,274.36	0.00%	52.58%	OBRA ATRAZADO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22493 DE AYAVI	HUIRPACANCHA	171,122.54	0.00%	15.00%	OBRA EN EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADO
RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. N° 22168 ACORA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	303,948.86	0.00%	34.00%	OBRA ENE EJECUCION ATRAZADO
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. INICIAL N° 373 SAN MIGUEL DE CURIS	SANTIAGO DE CHOCORVOS	178,825.73	0.00%	65.84%	OBRA EN EJECUCION
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. N° 22206 MACHO CRUZ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	186,909.22	0.00%	48.41%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA POR FALTA DE MATERIAL Y DISTANCIA
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22201 CHALLACA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	177,342.09	0.00%	76.88%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO

*Trabajamos para todos...!*

**OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO - FORSUR  
QUE SE VIENEN SUPERVISANDO POR LA DIRECCIÓN**

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (\$.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22203 SANTA ROSA DE MEJORADA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	307,308.12	0.00%	15.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, POR FALTA DE MATERIALES
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 36649 VILLA SALVADOR QUIRAHUARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	176,716.80	0.00%	80.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, Y FUERA DE PLAZO DE EJECUCION
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22204 LUCCMAYOCC	HUIRPACANCHA	181,308.92	0.00%	51.78%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA PLAZO DE EJECUCION VENCIDA
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22085 PAMPAPUQUIO	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	353,081.44	0.00%	89.18%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO,
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. ANDRES A. CACERES DE ANDAYMARCA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	467,469.00	0.00%	75.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO
RECONSTRUCCIONN DE AULAS EN LA I.E 22215 VILLA ALTA DE HUANCAS, HUAYTARA - HUANCAVELICA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	298,379.79	0.00%	35.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADO, POR FALTA DE MATERIALES Y PERSONAL OBRERO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 22087 SACSAQUERO	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	573,397.51	0.00%	82.79%	OBRA EN EJECUCION NORMAL, deductivo aprobado por el monto de -32773.43
RECONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA I.E N° 36547 OBRAJE SANTIAGO DE CHOCORVOS	SANTIAGO DE CHOCORVOS	325,092.88	0.00%	24.80%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA, POR FALTA DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22061 PAMPACHACRA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	106,676.76	0.00%	67.57%	OBRA ATRAZADO
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E N° 22609 SANTA ROSA	QUITO ARMA	104,359.29	0.00%	15.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA, POR FACTORES DE DISTANCIA Y FLATA DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	QUITO ARMA	476,358.11	0.00%	15.00%	OBRA EN EJECUCION ATRAZADA
RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E 04 AULAS EN LA I.E N° 22159- QUERCO	QUERCO	399,789.44	0.00%	60.00%	OBRA EN EJECUCION, RETRAZO POR INCUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE MURO, POR PARTE DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE QUERCO

*Trabajamos para todos...!*



## 44 OBRAS DE FORSUR – EDUCACION EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA

### Generales:

- **Localidad** : Varios
- **Distrito** : Multiple
- **Provincia** : Huaytará
- **Estado** : En Ejecución

**Monto de inversión:** 9' 706,351.64

**Objetivo:** Dotar a la comunidad de una infraestructura educativa adecuada para las exigencias de una buena educación.

**Situación actual:** 17 Obras culminadas, 02 Obras no Iniciadas y 25 Obras en ejecución

**Metas:** Construcción de infraestructura de material noble, de 01 nivel.

**Logros y beneficios** Número de los Beneficiarios Directos: 530 personas..



*Trabajamos para todos...!*



*Trabajamos para todos...!*



*Trabajamos para todos...!*



*Trabajamos para todos...!*



*Trabajamos para todos...!*

## MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE TAMBO - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS

### Generales:

- **Localidad** : Varios
- **Distrito** : Santiago de Chocorvos
- **Provincia** : Huaytará
- **Estado** : En Ejecución

**Monto de inversión:** 1,003,711.21

**Objetivo:** Elevar la calidad de vida de los pobladores ubicados en la zona influencia directa del proyecto a través de las mejoras sociales y económicas.

**Situación actual:** mantenimiento de la plataforma alcanzando el 12.04% de meta física.

**Metas:** 59 + 659 km de mantenimiento de plataforma, 66 alcantarillas encofrado perdido, 52 alcantarillas tipo marco, 90 ml. de cunetas revestidas, 55,840 ml de cunetas de tierra, 1,400 cunetas en roca suelta

**Logros y beneficios** Número de los Beneficiarios Directos: 530 personas..



*Trabajamos para todos...!*

NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO TOTAL (S/.)	FINANCIERO	FISICO	ESTADO ACTUAL
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA	HUARIBAMBA	934,760.92	91.73%	100.00%	OBRA CULMINADA, EN TRAMITE CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE <u>TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE</u> - PROVINCIA DE TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	774,761.40	53.50%	59.89%	OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA <u>INSTITUCION EDICATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO</u> , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	1,937,226.74	0.55%	2.20%	OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE <u>SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114-SACHACOTO</u> , DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	SURCUBAMBA	1,534,042.39	6.53%	0.25%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE LA <u>I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE</u> , DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	SURCUBAMBA	1,191,117.69	0.00%	0.00%	OBRA EN COORDINACIONES PARA INICIAR
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE <u>SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC</u> , DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	SURCUBAMBA	1,814,725.10	0.00%	0.00%	OBRA EN COORDINACIONES PARA INICIAR

*Trabajamos para todos...!*

## CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE PARIACC, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA

### Generales:

- **Localidad** : Pariacc
- **Distrito** : Huaribamba
- **Provincia** : Tayacaja
- **Estado** : Culminado

**Monto de inversión:** S/. 934,760.92

**Objetivo:** Adecuada prestación de servicios del puesto de salud de Pariacc, Microred de Pazos-red Tayacaja, Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

**Situación actual:** Obra culminada, en tramite conformación del comité de recepción de obra

**Metas:** Construcción de nueva infraestructura con material noble, construcción de 01 sala de espera-pasadizo, 01 consultorio médico y 01 sala de parto

**Logros y beneficios:** Adecuada prestación de servicios del puesto de salud de Pariacc, para el bienestar de la población beneficiaria, generar puestos de labor temporal.



*Trabajamos para todos...!*

## CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA

### Generales:

- **Distrito** : Multidistrital
- **Localidad** : Varios
- **Provincia** : Tayacaja
- **Estado** : Ejecucion

**Monto de inversión:** 774,761.40

**Objetivo:** Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se deriven. En tal sentido el objetivo central que se plantea seta encaminado al "fácil y rápido acceso a los mercados de consumo y servicios públicos tanto locales como regionales

**Metas:** Construcción de una trocha carrozable de 33.08 Km. a nivel de sub rasante, de ancho de plataforma de 4.00 mts. Mas obra de arte (alcantarillas y badenes) Velocidad directriz: 30 Km/hr Radio mínimo nominal: 25 m. Radio mínimo de volteo: 15 m. Pendiente mínima: 0.50% Pendiente: variable Pendiente máxima: 8.0% Cunetas triangulares: 0.30\*0.50 m. Taludes de corte: variable Taludes de rellenos: 1:1

**Logros y beneficios:** Mejora la calidad de vida y comunicación de los 1,858 beneficiarios directos



*Trabajamos para todos...!*

## MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDICATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA

### Generales:

- **Distrito** : San Marcos de Rocchac
- **Localidad** : Quimllo
- **Provincia** : Tayacaja
- **Estado** : Ejecución

**Monto de inversión:** 1,937,226.74

**Objetivo:** Poblacion escolar de la I.E. Maciste Díaz Abad con adecuadas condiciones pedagógicas para la prestación del servicio educativo

**Metas:** Construcción de 05 ambientes destinadas a aulas, 1 ambiente para área administrativa, 1 sala de profesores, 1 almacén, 1 biblioteca, 1 sala de computo, 1 laboratorio, 1 ambiente para útiles deportivos y música, cerco perimétrico, losa deportiva, patio cívico, asta de bandera, 2 módulos de SSHH, adquisición de carpetas, mesas, computadoras, pizarras, libros, otros mobiliarios, capacitaciones

**Logros y beneficios:** Población escolar de la institución educativa Maciste Díaz Abad de Quimllo con adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios educativos.

*Trabajamos para todos...!*

## MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA

### Generales:

- Localidad : Sachacoto
- Distrito : Surcubamba
- Provincia : Tayacaja

**Monto de inversión:** S/. 1,534,042.39

**Objetivo** : Adecuadas prestación de servicio educativo en la I.E. N° 31114 – Sachacoto.

**Metas** : Const. en dos niveles 06 aulas, Dirección, biblioteca, centro de computo y SS.HH. con tanque séptico y pozo percolador, muro perimétrico, de material noble, equipamiento y capacitación.

**Situación Actual** : Obra en ejecución Iniciado el 24/11/2011. 0.25%Físico 6.53% Presupuestal

**Logros y Beneficios:** Número de los Beneficiarios Directos 170 (N° de personas)



*Trabajamos para todos...!*

## CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA

### Generales:

- Localidad : Vista Alegre
- Distrito : Surcubamba
- Provincia : Tayacaja

**Monto de inversión:** S/. 1,191,117.69

**Objetivo** : Adecuada condiciones físicas para la prestación de servicio educativo en la I.E. de San Martin de Porres del centro poblado de Vista Alegre - Surcubamba

**Metas** : Construcción de 05 aulas pedagógicas de concreto construcción de 01 ambiente para centro de computo construcción de 2 módulos de servicios higiénicos. construcción de 01 ambiente para dirección construcción de 01 sala de profesores. construcción de 01 ambiente de recepción secretaria. construcción de cerco perimétrico construcción de patio de honor

**Situación Actual:** Se está coordinando para el inicio de Obra

**Logros y Beneficios:** Generar puestos de trabajo temporal y la calidad educativa acorde a nuestro tiempo

*Trabajamos para todos...!*

## MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO-CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

### Generales:

- **Localidad** : Tinyac, Huaycco y Chiquiac
- **Distrito** : Surcubamba
- **Provincia** : Tayaquila

**Monto de inversión:** S/. 1,814,725.10

**Objetivo** : Ingremento de la producción agrícola

**Metas** : 01 unid. de bocatoma de concreto armado de  $fc' = 175$  KG/CM2.- 01 unid. desarenador  $FC' = 175$  KG/CM2.- Instalación De 1500ml De Línea De Conducción Con tubería hdpe 200mm y 7500mm de tubería perfilada de 200mm.- 45 und. caja de inspección - 02 und pozas de disipación - 01 muro de contención de 60 ml - 02 unid. pase aéreo - talleres de capacitación en manejo de cultivos y sistemas de riego- mejora y aplicación del plan de desarrollo agrícola.- organización de junta de regantes y fortalecimiento y capacitación para uso del sistema de riego

**Situación Actual:** Se está coordinando para el inicio de Obra

**Logros y Beneficios:** Número de los Beneficiarios Directos 400 (N° de personas)

*Trabajamos para todos...!*

# GRACIAS

*Trabajamos para todos...!*
