



I Audiencia Pública Regional HUANCAVELICA 2011

Trabajamos para todos...!

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27962 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.



UNIDAD EJECUTORA 007
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

LIC. WUALTER TORNERO CONISLLA
GERENTE

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27962 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

TEMA : GESTIÓN PRESUPUESTAL




GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

- ❑ El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de diciembre del año en curso de la Gerencia Sub Regional por toda Fuente de Financiamiento (**Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras**), asciende a la cantidad de **S/. 33'904,405.00** nuevos soles, de los cuales para:
- ❑ Gastos Corrientes (remuneraciones, Pensiones y Bienes y Servicios), es de **s/. 22'297,159.00** que representa el **65.77%**.
- ❑ Gastos de Capital (Obras de Inversión), es de **s/. 11'607,246.00** que representa el **34.23%**.

PRESUPUESTO 2011

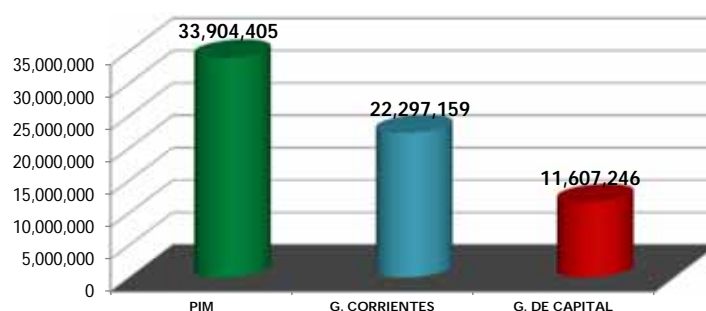


GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

PRESUPUESTO ASIGNADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO (En nuevos Soles) |
|---|----------------------------|
| 1 . RECURSOS ORDINARIOS (R.O) | 29,367,918.00 |
| 2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.R) | 36,998.00 |
| 3 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (D.T) | 634,398.00 |
| 5 . RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON...) | 3,865,091.00 |
| TOTAL | 33,904,405.00 |

GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

PRESUPUESTO POR SECTORES (UNIDADES OPERATIVAS)

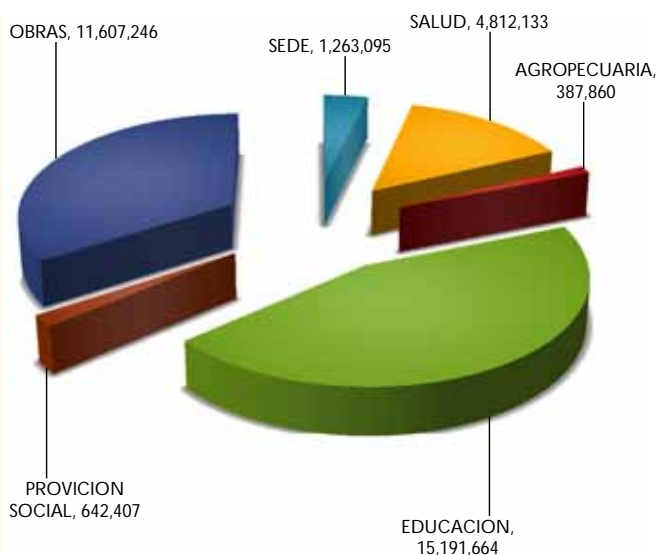

| SECTOR | PIM | % |
|------------------|----------------------|---------------|
| SEDE | 1,263,095.00 | 3.73 |
| SALUD | 4,812,133.00 | 14.19 |
| AGROPECUARIA | 387,860.00 | 1.14 |
| EDUCACION | 15,191,664.00 | 44.81 |
| PROVICION SOCIAL | 642,407.00 | 1.89 |
| OBRAS | 11,607,246.00 | 34.24 |
| TOTAL | 33,904,405.00 | 100.00 |


TEMA : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GERENCIA (SEDE)


| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|-------|---|--------------|--------------|------------|----------|
| 1/00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 373,957.00 | 216,462.36 | 157,494.64 | 57.88 |
| 1/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) | 671,540.00 | 645,092.4 | 27,415.53 | 95.92 |
| 2/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (R.D.R) | 36,998.00 | 18,276.80 | 18,721.00 | 49.40 |
| 5/18 | 2.3 BIENES Y SERVICIO | 80,000.00 | 78,890.17 | 1,109.83 | 97.88 |
| 1/00 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100,000.00 | 92,373.02 | 7,626.98 | 92.37 |
| TOTAL | | 1,263,095.00 | 1,050,126.82 | 212,968.18 | 83.14 |

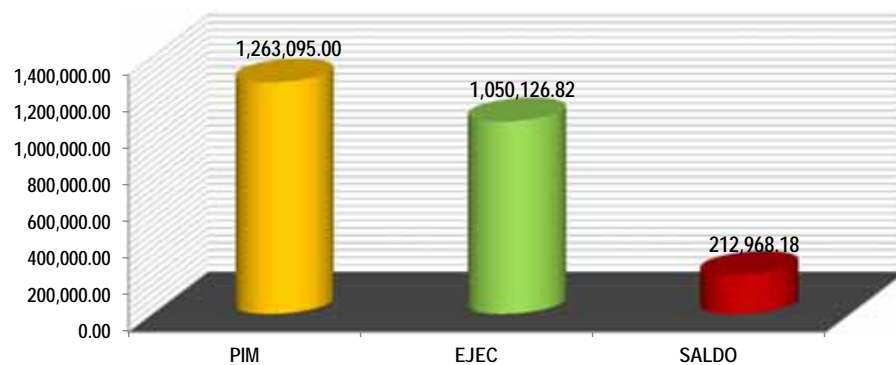

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


UNIDAD OPERATIVA - RED DE SALUD HUAYTARA

| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|-------|--|--------------|--------------|------------|----------|
| 1/00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,082,071.00 | 1,955,322.03 | 126,748.98 | 93.91 |
| 1/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) | 430,503.00 | 364,660.76 | 65,842.24 | 84.71 |
| 1/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (AISPED) | 155,998.00 | 148,581.71 | 7,416.29 | 95.25 |
| TOTAL | | 2,668,572.00 | 2,468,564.50 | 200,007.50 | 92.51 |

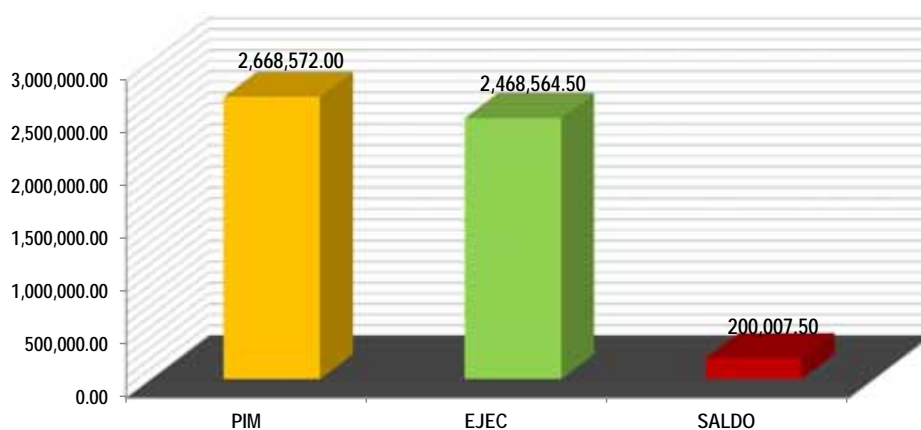

PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR – SALUD) - EUROPAN


| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|-------|--|------------|------------|------------|----------|
| 4/13 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) | 634,398.00 | 494,545.12 | 139,852.88 | 77.96 |
| TOTAL | | 634,398.00 | 400,662.92 | 233,735.08 | 63.16 |

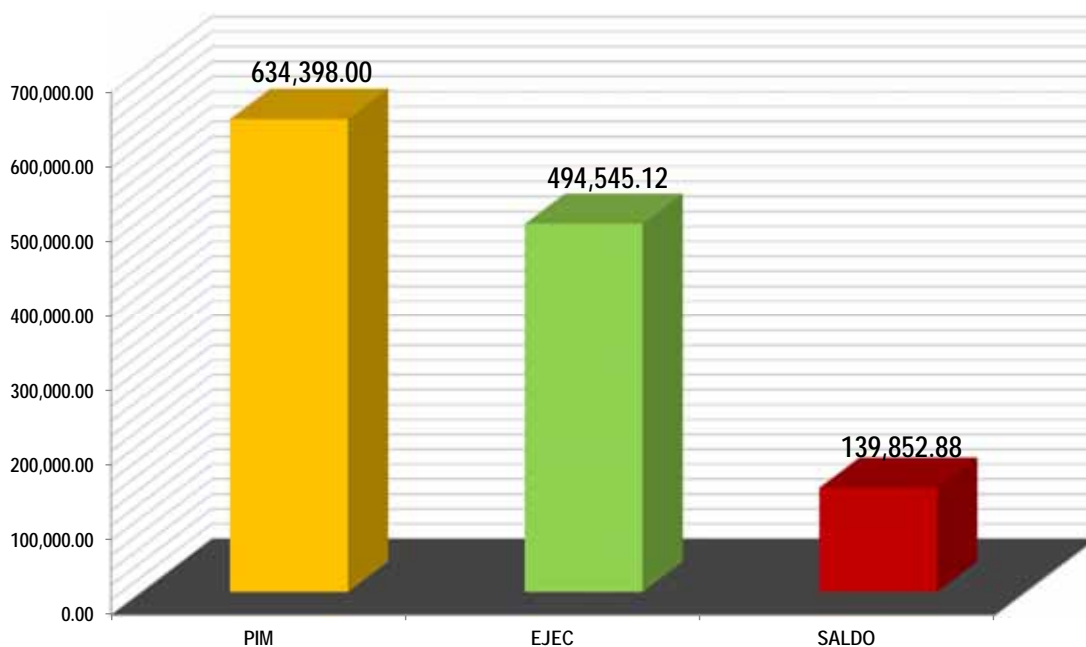

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


UNIDAD OPERATIVA - EDUCACIÓN

| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1/00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,717,373.00 | 12,462,111.00 | 1,255,261.90 | 90.85 |
| 1/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) | 209,458.00 | 191,228.27 | 18,229.73 | 91.29 |
| 1/00 | 2.3 BIENES Y SERVICIO (UNIDAD DE COSTEO) | 157,285.00 | 152,848.90 | 4,436.10 | 97.18 |
| TOTAL | | 14,084,116.00 | 12,806,188.17 | 1,277,927.83 | 90.93 |

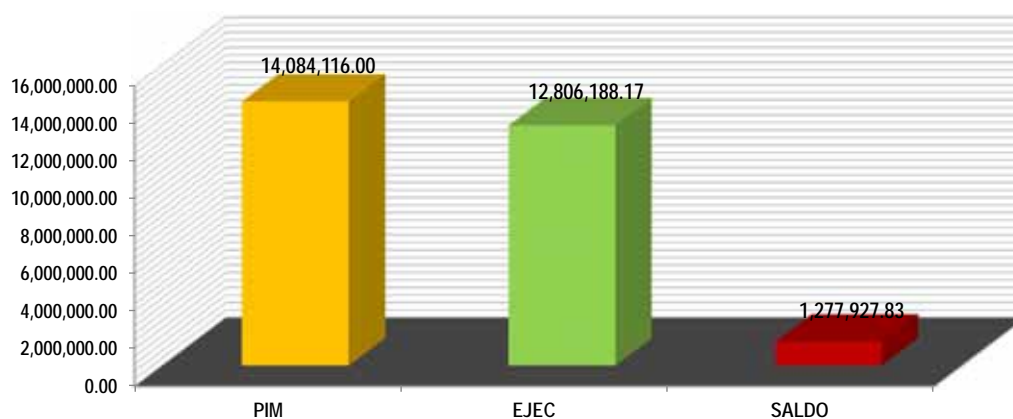


PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR – SALUD)

| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1/00 | 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 923,414.00 | 762,997.57 | 160,415.43 | 82.63 |
| 1/00 | 0002 – SALUD MATERNO NEONATAL | 408,612.00 | 361,096.00 | 47,516.00 | 88.37 |
| 1/00 | 0016 – TBC/VIH SIDA | 85,863.00 | 66,248.31 | 19,614.69 | 77.16 |
| 1/00 | 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS | 8,475.00 | 3,402.29 | 5,072.71 | 40.15 |
| 1/00 | 0018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 82,799.00 | 55,502.46 | 27,296.54 | 67.03 |
| TOTAL | | 1,509,163.00 | 1,249,246.73 | 259,916.27 | 80.18 |

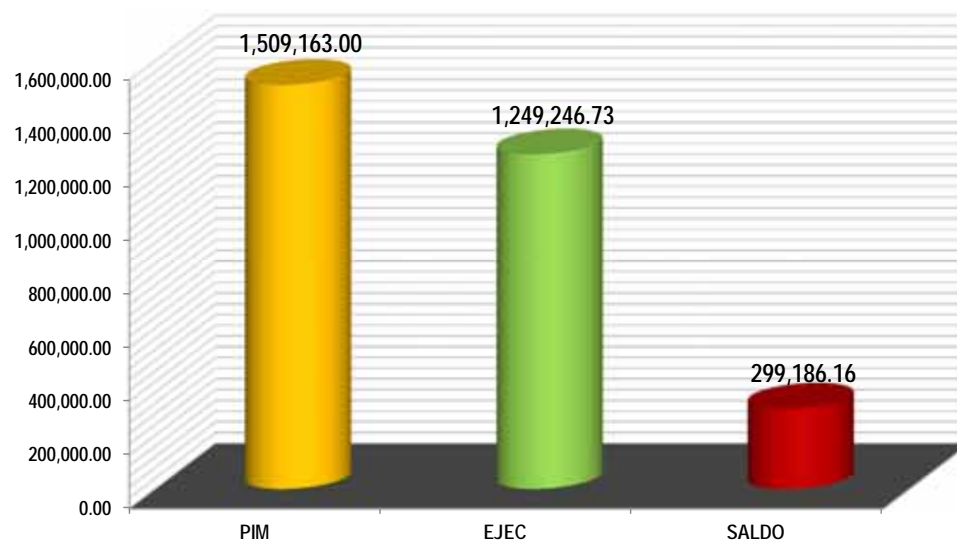

PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR)


| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|-------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 1/00 | 0003 – ANIMADORES PRONOEI | 120,529.00 | 110,224.00 | 10,305.00 | 91.45 |
| 1/00 | 0003 – LOGROS DE APRENDIZAJE | 987,019.00 | 897,876.27 | 89,142.73 | 90.97 |
| TOTAL | | 1,107,548.00 | 1,008,100.27 | 99,447.73 | 91.02 |

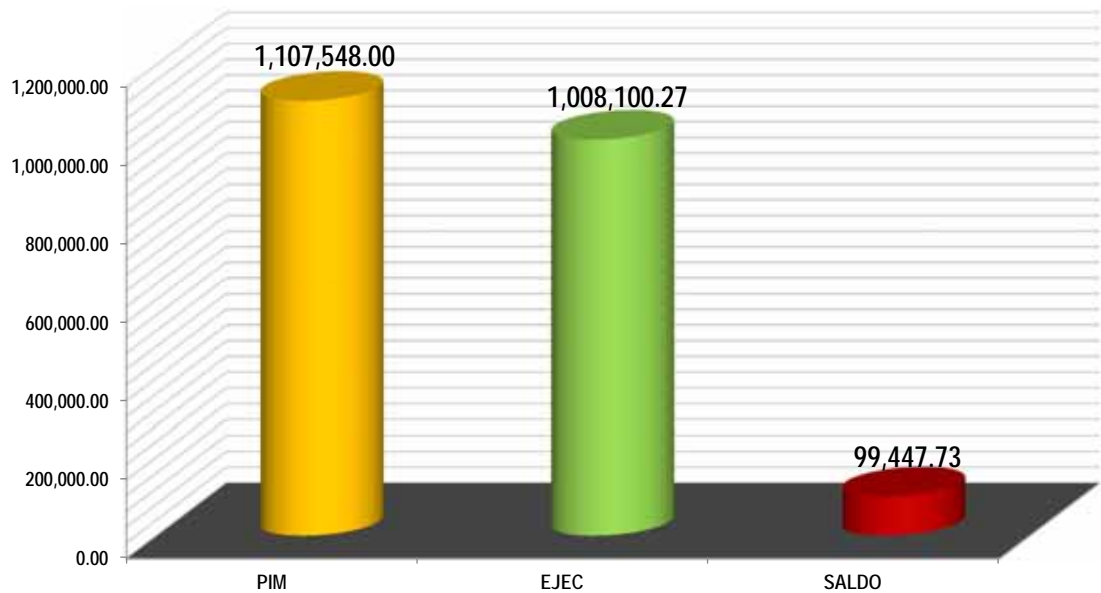

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROVISIÓN SOCIAL

| FF/RB | GENERICA DE GASTO | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|-------|---|------------|------------|-----------|----------|
| 1/00 | 2.2 PENSION Y PTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 595,407.00 | 515,448.60 | 79,958.40 | 86.57 |
| TOTAL | | 595,407.00 | 515,448.60 | 79,958.40 | 86.57 |

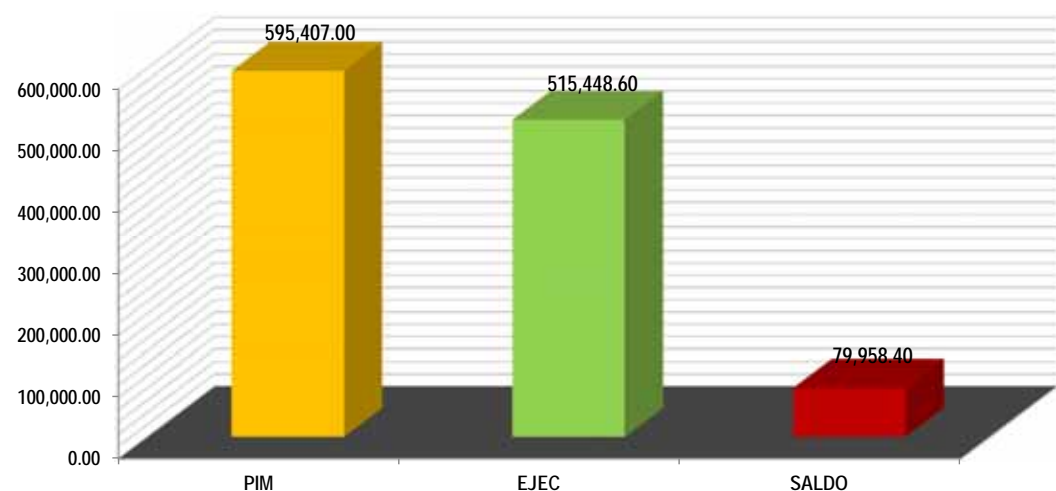

UNIDAD EJECUTORA 007
GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

LIC. WUALTER TORNERO CONISLLA
GERENTE


OBRAS Y ACTIVIDADES

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27860 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XXV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27967 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL – OBRAS 2011

- Gastos de Capital (Obras de Inversión), es de **s/. 11'607,246.00** a toda fuente de Financiamiento

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 7,822,755.00 | 5,649,278.59 | 2,173,476.41 | 72 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 3,784,491.00 | 2,906,164.88 | 878,326.12 | 77 |
| TOTAL | 11,607,246.00 | 8,555,443.47 | 3,051,802.53 | 74 |

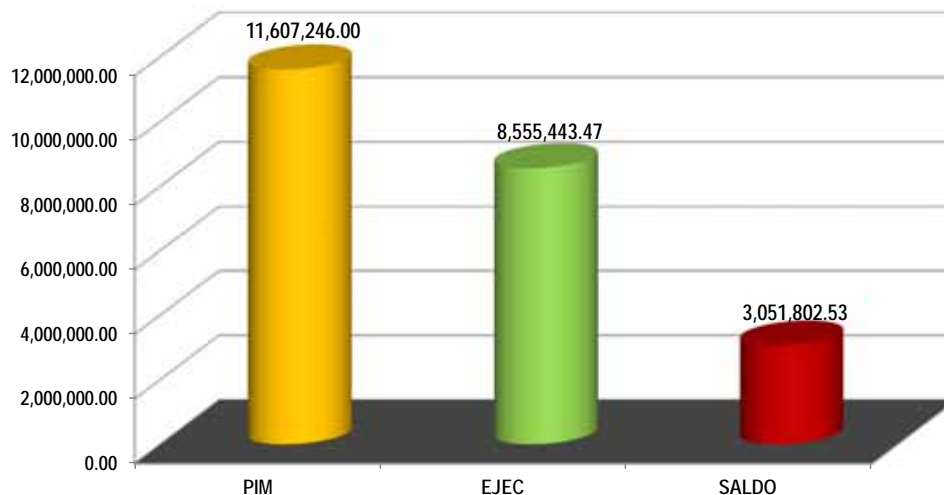


EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Santiago de Chocorvos)
- **Monto de inversión Continuidad:** 1,581,236.00
- **Objetivo:** Mejorar la capacidad operativa y resolutive de los servicios de atención materno perinatal e infantil de los establecimientos de salud de núcleo Santiago de Chocorvos.
- **Avances:** 95% Ps. Palmacancha y Mejorada y 90% Ps. Olaya, 100% Ps. Acora, Corerac, Olaya, S.M. Curis, Andaymarca
- **Situación actual:** Los trabajos se viene realizando en forma rápida, con la finalidad de culminar a un 100% las metas del Proyecto. Actualmente se tiene culminado 06 Puestos de Salud, y 03 Puestos que dentro de unos 25 días se culminarán.
- **Logros y beneficios:** Construcción Puestos de Salud para una adecuada atención de la población, en especial de los niños, madres gestantes y ancianos.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 1,581,236.00 | 1,124,150.08 | 457,085.92 | 71 |
| TOTAL | 1,581,236.00 | 1,124,150.08 | 457,085.92 | 71 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

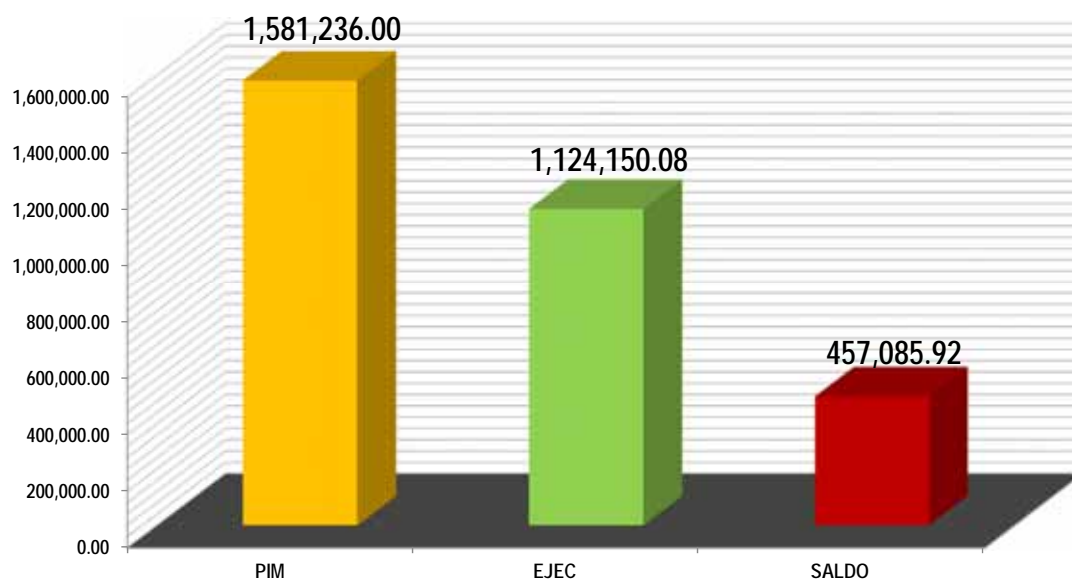


EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE DE LA MICRORRED HUAYTARÁ, RED HUAYTARÁ DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Santo Domingo de Capillas)
- **Monto de inversión Continuidad:** 1,396,138.00
- **Objetivo:** Incremento del acceso de atención a los servicios de salud en las localidades de Santo Domingo de Capillas, Huañacancha y Vista Alegre de la Microrred Huaytará.
- **Avances:** 98% de avance físico.
- **Situación actual:** Los trabajos se vienen realizando en forma regular debido al abastecimiento de material, pero se a programado en el lapso de 30 días la culminación a un 100%.
- **Logros y beneficios:** Los beneficiados serán los pobladores de las localidades de Santo Domingo de Capillas, Huañacancha y Vista Alegre, por lo que son vulnerables a cualquier enfermedad por su bajo nivel socio-económico, por lo tanto hay una mayor preocupación en la implementación de los servicios de salud a la comunidad beneficiaria..



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 1,396,138.00 | 663,066.52 | 733,071.48 | 47 |
| TOTAL | 1,396,138.00 | 663,066.52 | 733,071.48 | 47 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

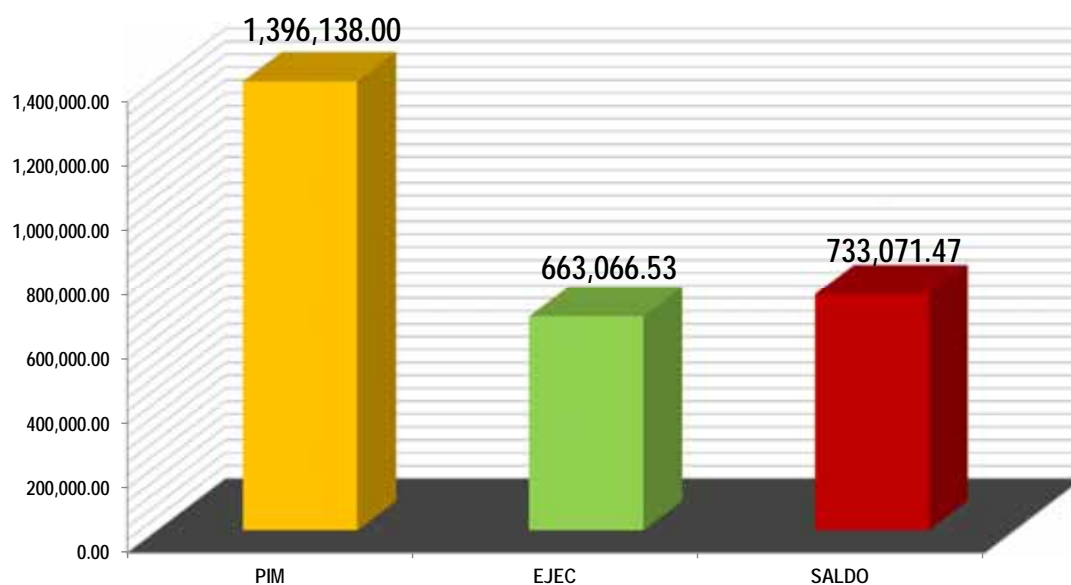


EJECUCION DEL PROYECTO:
 "INTERVENCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN
 EDUCATIVA MIXTO TÉCNICO AGROPECUARIO ARTESANAL DE
 LLILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARÁ – HVCA".

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca, localidad de Llillinta)
- **Monto de inversión Continuidad:** 6,918.00
- **Objetivo:** La adecuada atención de los Servicios Educativos para los niños de la localidad de Llillinta.
- **Avances:** Esta en 92% el avance físico
- **Situación actual:** Se han realizado la instalación de puertas y ventanas y así mismo la culminación del cerco perimétrico.
- **Logros y beneficios:** Se ha logrado dar la construcción del cerco perimétrico y la Infraestructura educativa en función pedagógica, administrativa y servicios, con material noble, techo cubierta de teja andina.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 6,918.00 | 6,916.00 | 2.00 | 100 |
| TOTAL | 6,918.00 | 6,916.00 | 2.00 | 100 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

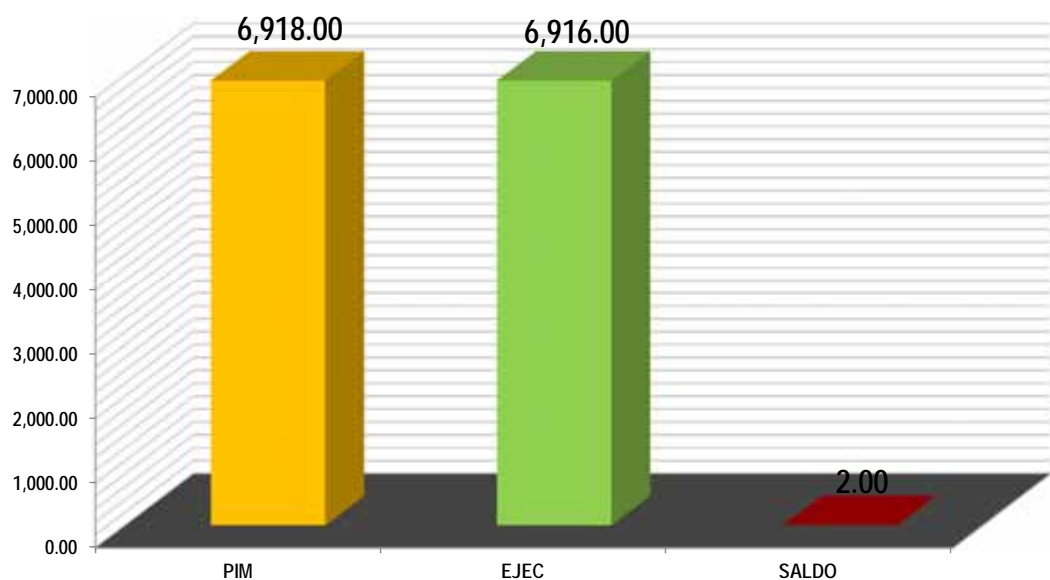


EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLCCAPAMPA - SANTA ROSA DE LLILLINTA"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)
- **Monto de inversión Continuidad:** 1,682,485.00
- **Objetivo:** Construcción de trocha carrozable de 28.50 km. drenaje, badenes, alcantarilla y construcción de obras de arte.
- **Avances:** 60% de avance físico.
- **Situación actual:** ya esta encaminada la obra, se están realizando las obras de arte y así mismo se continua con la apertura de trocha, y ya se adjudicado los servicios de afirmado.
- **Logros y beneficios:** La construcción de la trocha, mejorar la interacción comercial de productos agropecuarios y Facilitar en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 1,682,485.00 | 1,679,358.89 | 3,126.11 | 100 |
| TOTAL | 1,682,485.00 | 1,679,358.89 | 3,126.11 | 100 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

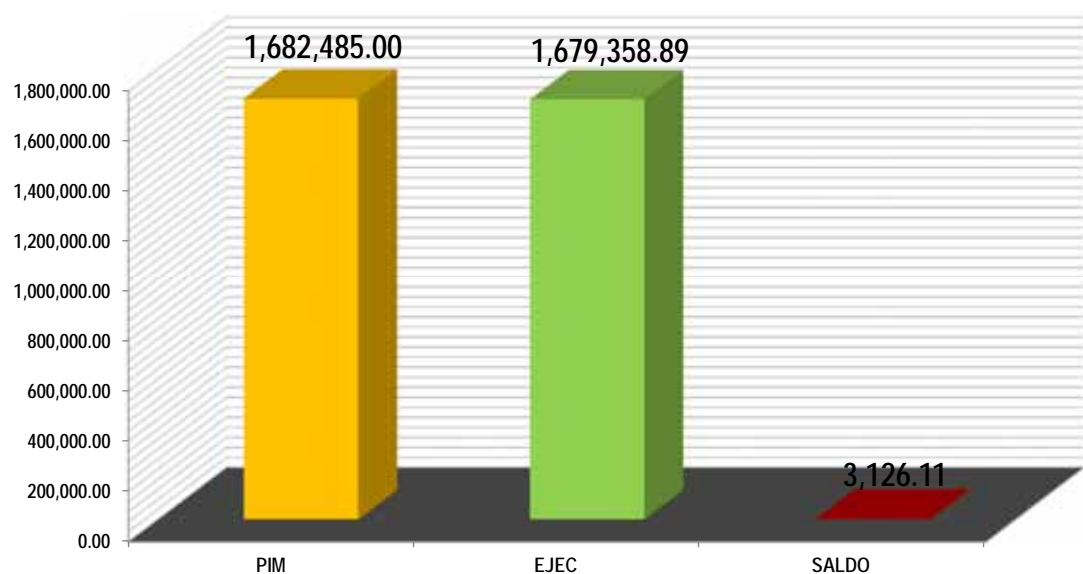


EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CARRETERA CORERAC - SAN MIGUEL DE CURIS - SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA - TAMBO CRUZ"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Santiago de Chocorvos)
- **Monto de inversión Continuidad:** 120,770.00
- **Objetivo:** Consiste en el mejoramiento de 33.00 km. de carretera, incidiéndose en las obras de arte y drenaje, señalización con postes kilométricos, visibilidad de paso 80 mts.
- **Avances:** 96.72% de avance físico
- **Situación actual:** ya ha sido reiniciado los trabajos faltantes, en lapso de 20 días se culminara a un 100% todas las partidas de proyecto.
- **Logros y beneficios:** El mejoramiento de l carretera, beneficiara a la interacción comercial de productos agropecuarios y así Facilitar en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo locales y regionales.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 120,770.00 | 102,655.91 | 18,114.09 | 85 |
| TOTAL | 120,770.00 | 102,655.91 | 18,114.09 | 85 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

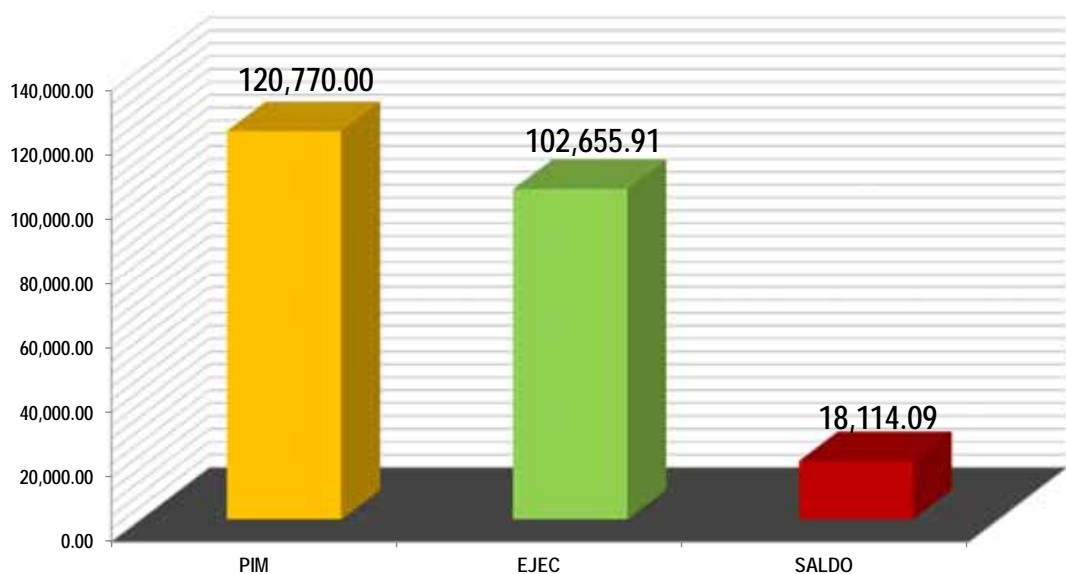

EJECUCION DEL PROYECTO: "INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUAYTARA – HUANCVELICA".

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Huaytará)
- **Monto de inversión Continuidad:** 157,131.00
- **Objetivo:** Adecuadas condiciones de infraestructura para el sistema administrativo de la provincia de Huaytará.
- **Avances:** se informa que el monto de inversión transferido mas el monto ejecutado en el ejercicio anterior superaría la sensibilidad del proyecto, $157,131.00 + 1,506,823.15 = S/. 1,663,954.15$, indicando que de acuerdo a normas el monto a ejecutar en un proyecto no puede ser mayor a un 30% del monto de presupuesto del perfil.
- **Situación actual:** Actualmente se esta realizando la liquidación técnico y Financiera.
- **Logros y beneficios:** Los beneficiarios del proyecto son 555 docentes entre nombrados, contratados y animadoras, 32 personal administrativo de los centros educativos que pertenecen a la jurisdicción de la UGEL y los 36 trabajadores administrativos de la UGEL Huaytará, entre funcionarios y administrativos.


EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y ANEXO QUISUARPATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARÁ – HUANCVELICA"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Antonio de cusicancha)
- **Monto de inversión PIM 2011:** 1,655,033.00
- **Objetivo:** Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable con la Instalación de 5,175.90 ml. de Tubería, Construcción de reservorios de apoyo, la Construcción del Sistema de Alcantarillado, la Instalación de Tubería, de la Construcción de 2 tanques imhoff para el tratamiento de Aguas servidas.
- **Avances:** 30% de avance físico
- **Situación actual:** Se han iniciado las excavacione de la red de desague, así mismo los trámites para poder satisfacer a 40 viviendas que por errar no fueron contempladas dentro del Proyecto
- **Logros y beneficios:** Dotar de Abastecimiento de Agua Potable con la Instalación de Tubería , Construcción de reservorios de apoyo, y Capacitación a Operadores y Capacitación a beneficiarios en hábitos de higiene.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 1 RECURSOS DETERMINADOS | 1,655,033.00 | 1,628,036.19 | 26,996.81 | 98 |
| TOTAL | 1,655,033.00 | 1,628,036.19 | 26,996.81 | 98 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

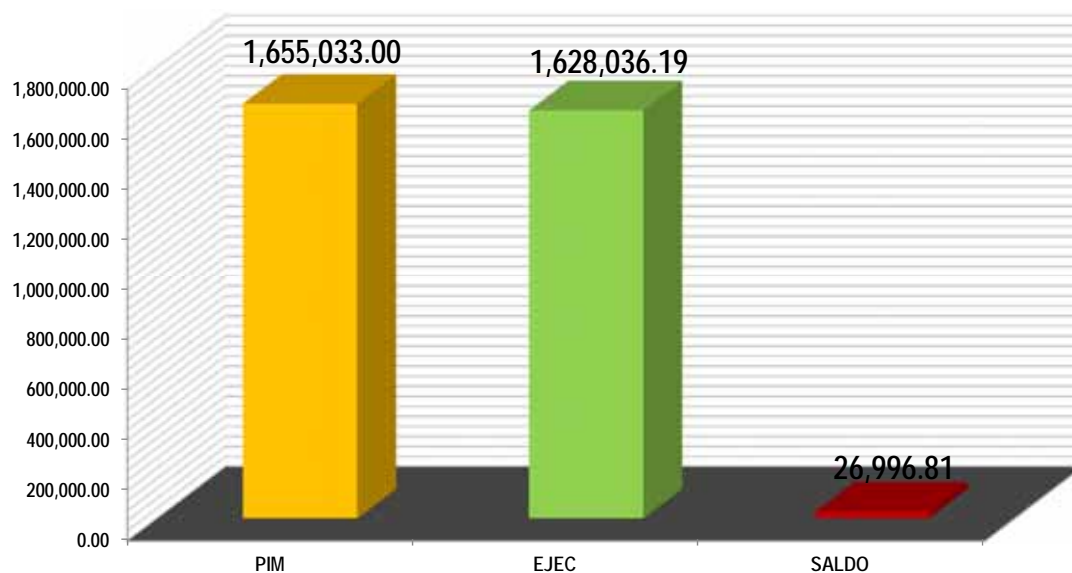


EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE TOCHA CARROZABLE QUIRAHUARA CCANCCAIRO - SAN BARTOLOMÉ - DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARÁ - HVCA".

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Quirahuara)
- **Monto de inversión PIM 2011:** 1,506,853.65
- **Objetivo:** Culminación de la Construcción de la Carretera a nivel de Afirmado desde el tramo km 27+720 al km 42+064 y construcción de obras de arte.
- **Avances:** 75% avance físico.
- **Situación actual:** Se tiene realizado la apertura de tocha hasta el kilómetro 38+000, con sus respectivas obras de arte.
- **Logros y beneficios:** El grupo beneficiario que se identifica para este proyecto incluye a la población de Santiago de Quirahuara y sus anexos Ccanccairo y San Bartolomé, de los cuales 450 se encuentran en el área urbana y 1075. en el área rural, cuya actividad principal que desarrollan son las de agricultura y ganadería .



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 1,519,231.00 | 1,498,528.56 | 20,702.44 | 99 |
| TOTAL | 1,519,231.00 | 1,498,528.56 | 20,702.44 | 99 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

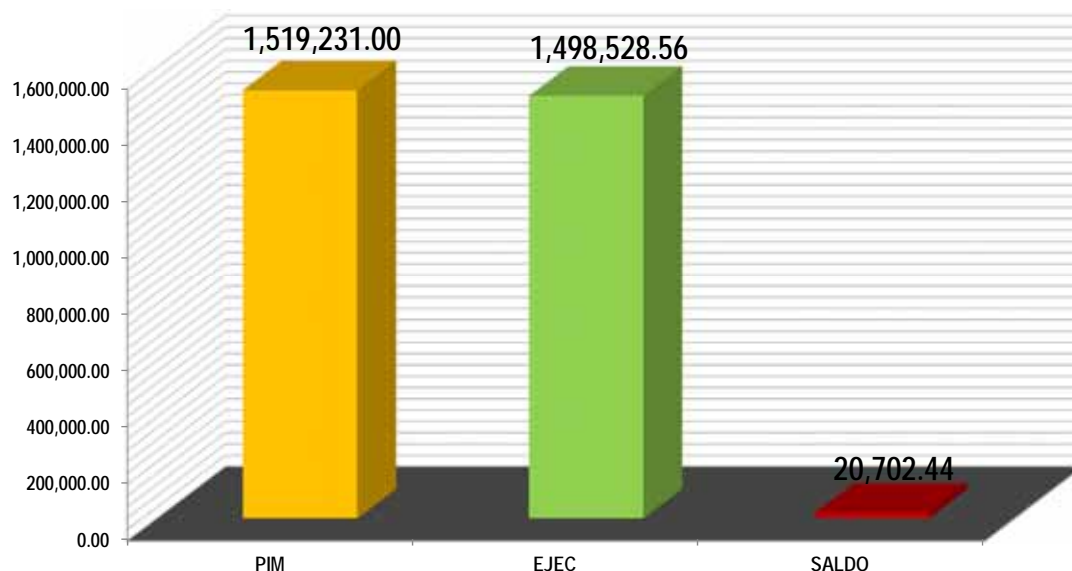

EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHA"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de San Isidro de Huirpacancha)
- **Monto de inversión Continuidad:** 647,654.00
- **Objetivo:** Consiste en la culminación de la Construcción de una Represa y Canal de Riego
- **Avances:** La represa tiene un avance de 50%
- **Situación actual:** Evaluación de los Saldos para poder licitar las Maquinarias que van a cumplir con el traslado de agregados y de esa manera se culminará la Construcción de la Represa
- **Logros y beneficios:** La construcción de un canal de riego para la mejorar la producción de los productos agropecuarios, por lo que el proyecto se espera elevar la producción agrícola, ya que ello le permitirá mejorar los ingresos de los productores de las localidades del Área de influencia del proyecto.




EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE CHOCORVO - ARMA - HUAYANTO - QUINCHIHUA - ACOMAYO"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Quito Arma)
- **Monto de inversión PIM 2011:** 1,402,216.00
- **Objetivo:** Culminación de la Construcción de la carretera vecinal tipo trocha carrozable de 24+096 Km, inicio en la localidad de Chocorvo Arma Huayanto, Quinchihua, culminando en la localidad de Acomayo, y construcción de obras de arte.
- **Avances:** 25% de Avance Físico Proceso de Movimiento de Tierras, licitado y adjudicado Entrega de terreno 15-11-2011y ya esta en ejecución
- **Situación actual:** Apertura de Trocha 2 km
- **Logros y beneficios:** La construcción de la trocha, mejorar la interacción comercial de productos agropecuarios, entre los centros de producción con los mercados de consumo.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 1,402,216.00 | 1,213,656.41 | 188,559.59 | 87 |
| TOTAL | 1,402,216.00 | 1,213,656.41 | 188,559.59 | 87 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

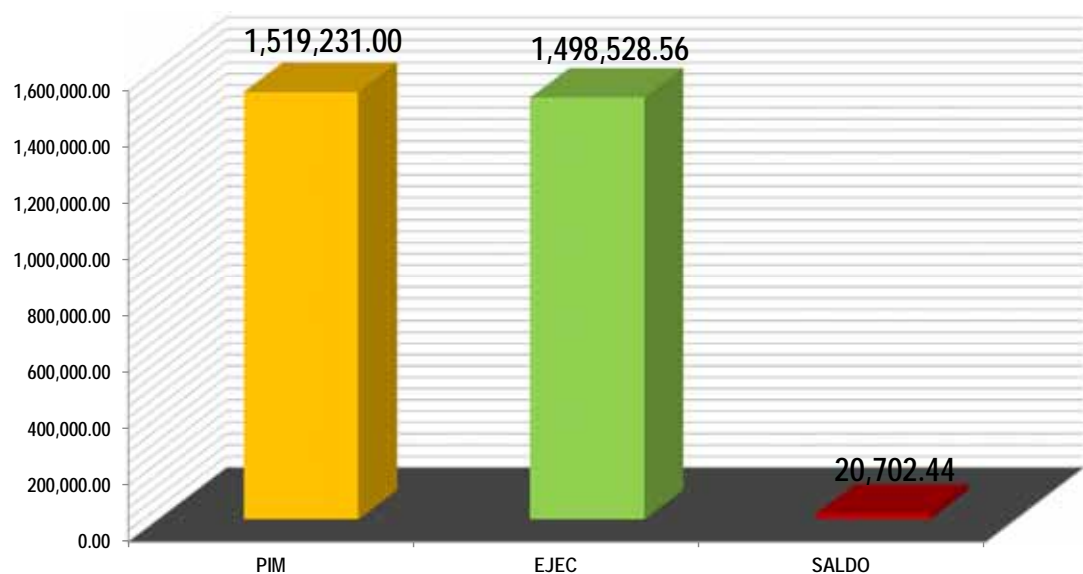

EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN ISIDRO DE POTACA-SAN JUAN DE VISTA ALEGRE-EMPALME A VÍA DE SAN LUIS DE CORERAC DE SANTIAGO DE CHOCORVOS"

- **Datos Generales:** (Huancavelica, Huaytará, distrito de Quito Arma)
- **Monto de inversión PIM 2011:** 271,218.00
- **Objetivo:** Construcción de la Carretera: Movimiento de Tierras, Afirmado, Obras de Arte.
- **Avances:** RTM presentados a Logística
- **Situación actual:** Proceso de Licitación – Servicios de Movimiento de Tierras
- **Logros y beneficios:** La construcción de la trocha, mejorará la interacción comercial de productos agropecuarios y Facilitar en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo.

EXPEDIENTES TÉCNICOS

| FF/RB | EXPEDIENTES TECNICOS | PIM | EJECUCIÓN | SALDO | AVANCE % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1/00 | Mejoramiento y Construcción de la Carretera santo domingo de capillas - santa cruz de Tomacc - san José de yanama - san francisco de sangayaico. | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Mejoramiento de la carretera Santiago de Chocorvos – Otuto –Quishuarccasa – Andaymarca - Pampahuasi | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Construcción de carretera san Felipe – Incapampa. | 71,797.00 | 71,797.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Construcción y mejoramiento de la carretera santa rosa de mejorada san José de Llactacha de Santiago de chocorvos. | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Construcción y equipamiento del centro educativo técnico productivo N° 34020 Huaytará. | 15,070.00 | 15,070.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Construcción de cerco Perimétrico de la I.E. Pacamarca, distrito de Pacamarca – Huaytará – Huancavelica. | 10,597.00 | 10,500.00 | 97.00 | 99.00 |
| 1/00 | Mejoramiento e Implementación de la infraestructura de la I.E. Santa rosa, del distrito de tambo, provincia de Huaytará - Huancavelica | 25,945.00 | 25,945.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/00 | Construcción sistema de riego seco – Quirahuara. | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | | 397,409.00 | 397,312.00 | 97.00 | 99.98 |

| FF/RB | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | PIM | EJECUCIÓN |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1/00 | Instalación del servicio de agua del sistema de riego bilinyayocc - Huirpacancha, distrito de san isidro de Huirpacancha – Huaytará - Huancavelica. | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1/00 | Instalación del servicio de agua del sistema de riego chipta - vista alegre del anexo de pampapuquio, distrito de san Antonio de Cusicancha – Huaytará – Huancavelica | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1/00 | Mejoramiento del sistema de riego en el anexo de Mutanga, distrito de quito arma – Huaytará – Huancavelica | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1/00 | Instalación del servicio de agua del sistema de riego la quitana, distrito de ayaví - Huaytará – Huancavelica | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1/00 | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en el sector huacotulloc, distrito de santo domingo de capillas – Huaytará – Huancavelica | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1/00 | Creación del camino vecinal entre puye – Pampahuasi – los libertadores, distrito de tambo, provincia de Huaytará – región de Huancavelica | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1/00 | Instalación del servicio de agua del sistema de riego acco, distrito de Huaytará – Huancavelica | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1/00 | Mejoramiento del servicio de agua para uso agrícola en los sectores chupalla y huayta challo del distrito de ocoyo, provincia de Huaytará - Huancavelica | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1/00 | Instalación de los servicios de salud del puesto de salud en la localidad de ccollpapata, distrito de pilpichaca, provincia de Huaytará - Huancavelica | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 1/00 | Recuperación de suelos en la localidad de chuñacancha, del distrito de huayacundo arma, provincia de Huaytará - Huancavelica | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 1/00 | Construcción de plaza principal en el C.P. Santa rosa de acora del distrito de san francisco de sangayaico | 10,500.00 | 10,500.00 |
| TOTAL | | 215,400.00 | 215,400.00 |
