

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	75	2	0	1	3	6	51	2	0	0	0	13
ANGARAES	49	3	0	0	3	4	22	0	0	0	0	20
CASTROVIRREYNA	52	2	0	0	2	6	26	0	0	0	0	18
CHURCAMP	42	7	0	0	7	10	17	3	0	0	0	5
HUANCAMELICA	92	4	2	1	7	2	56	0	0	0	0	27
HUAYTARA	37	1	0	0	1	5	22	0	0	0	0	9
TAYACAJA	79	3	0	0	3	4	70	0	0	0	0	2
TOTAL =	426	22	2	2	26	37	264	5	0	0	0	94

TOTAL DE OBRAS ==>

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO

SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	15	0	0	0	0	1	7	0	0	1	0	6
ANGARAES	9	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
CASTROVIRREYNA	21	0	0	0	0	2	13	0	0	1	0	5
CHURCAMP	30	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	13
HUANCAMELICA	42	0	0	0	0	1	31	0	1	0	0	9
HUAYTARA	18	1	0	0	1	1	9	0	0	0	0	7
TAYACAJA	34	1	0	0	1	2	20	0	0	0	0	11
TOTAL =	169	2	0	0	2	8	101	0	1	2	0	55

TOTAL DE OBRAS ==>

REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA


SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	8	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	2
ANGARAES	8	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	3
CASTROVIRREYNA	11	1	1	0	2	1	5	0	0	1	0	2
CHURCAMP	4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
HUANCAMELICA	31	12	1	1	14	3	6	1	0	2	0	5
HUAYTARA	43	3	0	0	3	5	11	0	0	0	0	24
TAYACAJA	16	2	0	0	2	3	7	0	0	0	0	4
TOTAL =	121	21	2	2	25	14	36	1	0	3	0	42

TOTAL DE OBRAS ==> 716


REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	
OBRAS POR INICIAR	6
OBRAS EN EJECUCION	53
OBRAS TERMINADAS	401
OBRAS PARALIZADAS	59
OBRAS SIN INFORMACION	1
OBRAS LIQUIDADAS	191
OBRAS RESUELTO	5
TOTAL DE OBRAS	716

PROVINCIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						CONVENIO						CONTRATA						TOTAL DE OBRAS	TOTAL SEGÚN LAS 3 MODALIDADES				
	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO		TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	LIQUIDADOS	POR INICIAR
ACOBAMBA	75	51	3	6	2	13	15	7	0	1	0	6	8	3	2	1	0	2	98	61	5	8	21	2
ANGARAES	49	22	3	4	0	20	9	4	0	1	0	4	8	3	1	1	0	3	66	29	4	6	27	0
CASTROVIRREYNA	52	26	2	6	0	18	21	13	0	2	0	5	11	5	2	1	0	2	84	44	4	9	25	0
CHURCAMP	42	17	7	10	3	5	30	17	0	0	0	13	4	1	1	0	0	2	76	35	8	10	20	3
HUANCAVELICA	92	56	7	2	0	27	42	31	0	1	0	9	31	6	14	3	1	5	165	93	21	6	41	1
HUAYTARA	37	22	1	5	0	9	18	9	1	1	0	7	43	11	3	5	0	24	98	42	5	11	40	0
TAYACAJA	79	70	3	4	0	2	34	20	1	2	0	11	16	7	2	3	0	4	129	97	6	9	17	0
TOTAL	426	264	26	37	5	94	169	101	2	8	0	55	121	36	25	14	1	42	716	401	53	59	191	6


CUADRO DE RESUMEN ESTADISTICO DE OBRAS

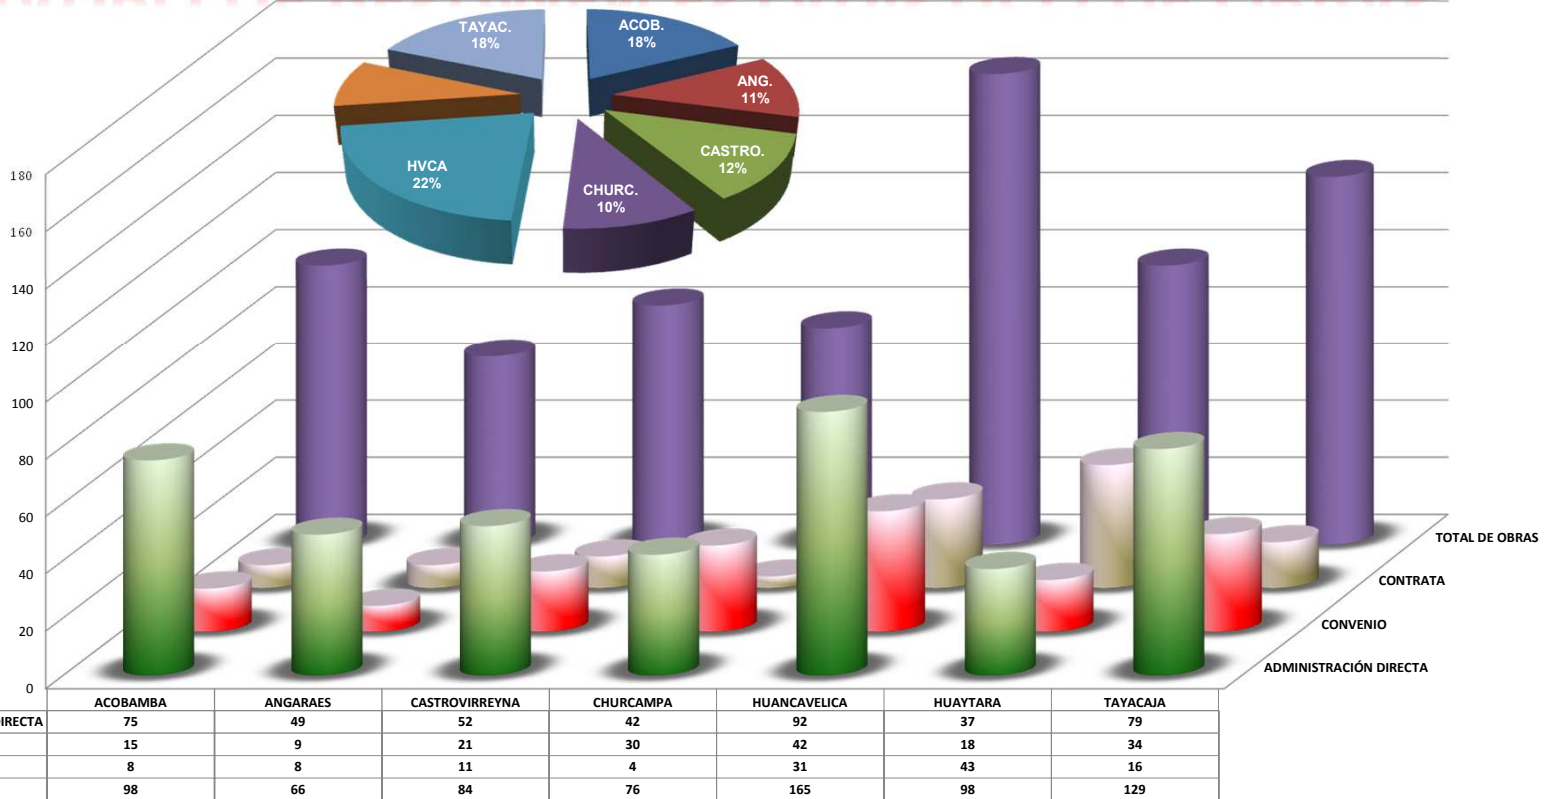


REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

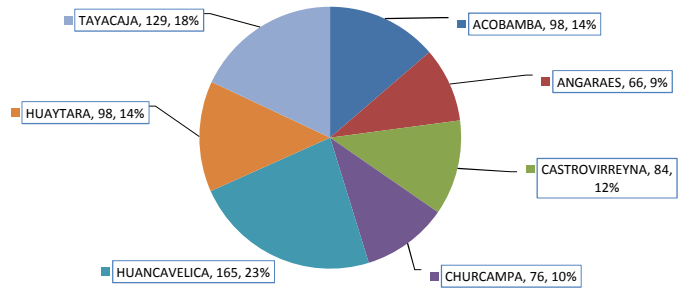

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL

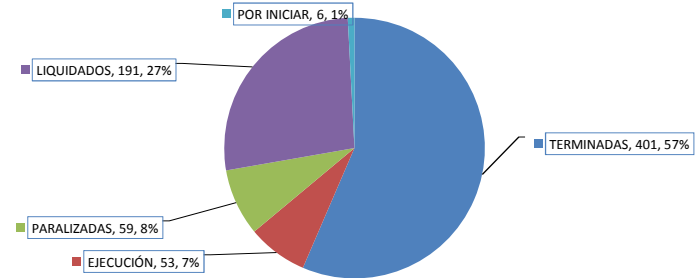

EJECUCIONES DE OBRAS POR MODALIDAD

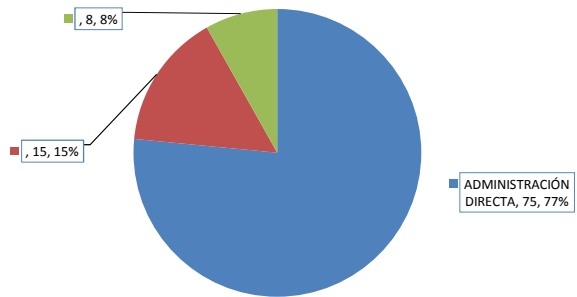

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN

