

2019

II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL



Maciste —
Díaz GOBERNADOR
Abad REGIONAL



**Maciste
Díaz
Abad**

—
GOBERNADOR
REGIONAL
—





regionhuancavelica.gob.pe


GERENCIAS SUB REGIONALES

GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA”

2019

INVERSIÓN TOTAL **6,811,676**

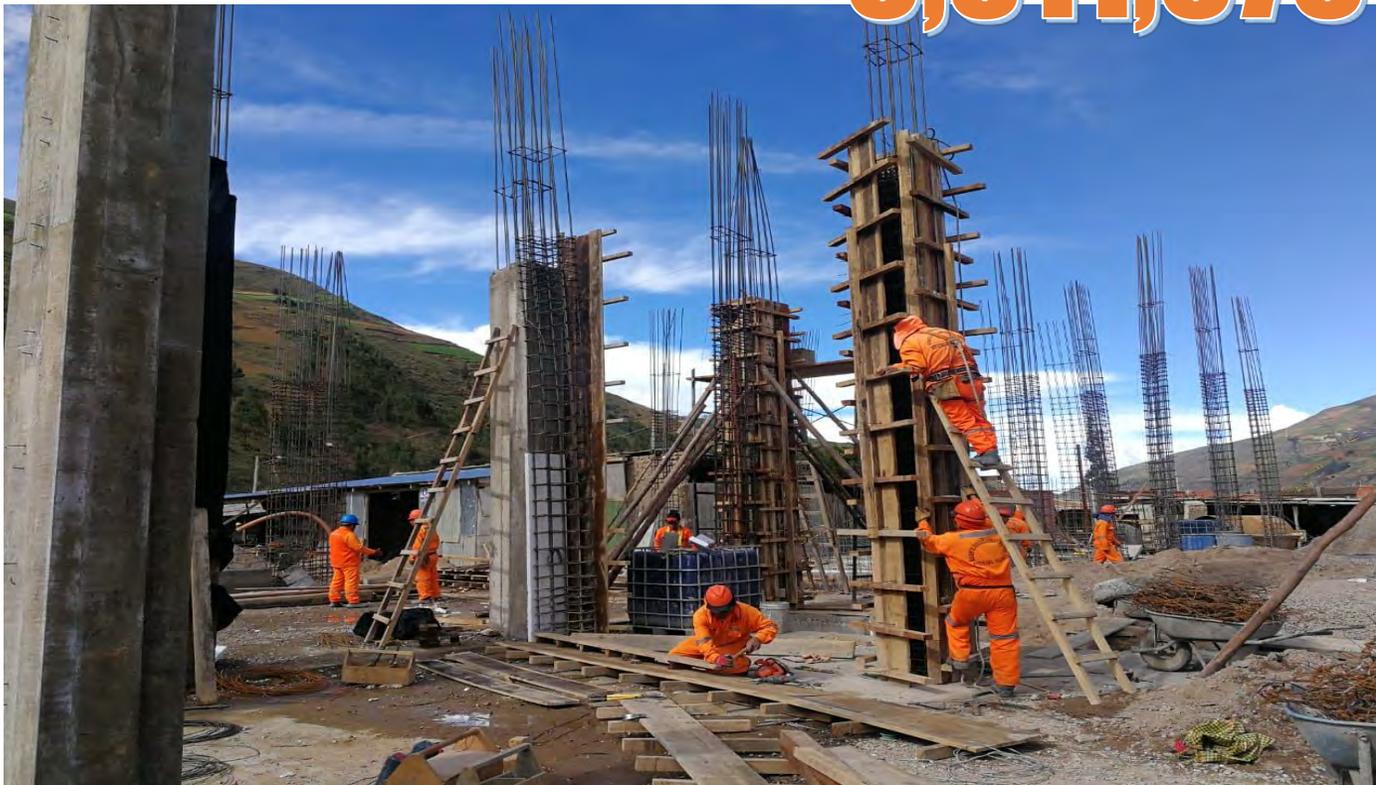

Componentes:

- Bloque A consta de tres niveles
- Bloque B consta de tres niveles
- Bloque C consta de tres niveles
- Bloque D consta de dos niveles

Beneficiarios

21 distritos



2,200
puestos de
trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,764,129	S/ 2,131,711.3	33.09%	21.11%

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES



“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES ”

2019

INVERSIÓN TOTAL 4,950,581



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Sede Sub Gerencia Regional
- Modulo maquinaria
- Cerco perimétrico
- Equipamiento

60,178 Beneficiarios

200

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 713 MIL	S850 MIL	100%	99.82%



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.N°36746 DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CONSTANCIA CENTRO, DISTRITO DE LIRCAY ”

2019

INVERSIÓN TOTAL

3,019,079



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Diversos Módulos
- Área de Esparcimiento
- Cerco y Veredas Perimétricas
- Equipos Y Mobiliario

275 Alumnos

455 puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2'504,727.00	S/ 2'177,207.42	72.11%	73.86%



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36513 DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES ”

2019

INVERSIÓN TOTAL **4,047,329**



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- 3 Módulos (aulas, centro de innovación, tópico, sala de multiusos y administrativos
- Cerco Perimétrico

142 Alumnos

560

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 3'719,232.00	S/ 3,308,332.00	82.00%	78.11%



“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO DE PUEBLO VIEJO Y BARRIO DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE LIRCAY- PROVINCIA DE ANGARAES”

2019

INVERSIÓN TOTAL 1,185,705

ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Estructura de pavimentos
- Acera peatonal
- Sistema pluvial
- Reconexión y reparación de instalaciones
- Rehabilitación de canal existente
- Señalización

33,492

Beneficiarios

160 puestos de trabajo



Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 599,869.00	S/ 1,106,401	93.31%	100%



“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS, EN LOS DOCE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES ”

2019

INVERSIÓN TOTAL 1,513,179



ANTES



ACTUAL



Componentes:

Mejorar los niveles de producción agropecuaria y piscícola proporcionando su desarrollo competitivo y sostenible

33,492
Beneficiarios

1440
puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 335,405.00	S/ 1,452,255.00	95.97%	100%

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA – LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO - LIRCAY”

2019

INVERSIÓN TOTAL

5,910,460



Componentes: -

- Bocatoma
- Canal con tubería
- Muro de contención con gaviones
- 2 reservorios de 325M3
- 2 reservorios de 2692M3
- Cámaras de inspección
- Acueducto de concreto armado
- 04 alcantarillas

250 Familias

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 464,804.00	S/ 87,750.90	1.48%	SIN INICIO

GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA



“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL CENTRO POBLADO RURAL DE SAN MARTÍN DE MAYUNMARCA - ANDABAMBA

2019

INVERSIÓN TOTAL **11,694,431**



ANTES



ACTUAL



Componentes: -

- Escalinatas de concreto.
- Veredas de concreto.
- Muros de contención.
- Sardineles armados.
- Alcantarillas, badenes, drenaje

1,150 Beneficiarios

60
puestos de
trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 5'238,461.00	S/ 4'005,444.24	34.25%	10.21%



“MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA ”

2019

INVERSIÓN TOTAL **11,694,431**



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Equipamiento de módulos de computo.
- Sub estación eléctrica.
- Generador eléctrico de emergencia.
- Ascensor de ocho pasajeros

62,685

Beneficiarios

90

puestos de trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 446,647.00	S/ 4,116,460.43	93.08%	94.50%

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMP A - ACOBAMBA”

2019

INVERSIÓN TOTAL 9,589,248



ANTES



Componentes: -

- Puente reticulado
- Losas de aproximación
- Mejoramiento de accesos con tratamiento tipo Otta Seal.

ACTUAL



12,095

Beneficiarios
Provincias Acobamba y Churcampa

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S / 2'265,998.00	S/ 9'386,538.41	99.36%	100%

95
puestos de trabajo

GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA



“CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ABEL YANCE EN EL DISTRITO DE LA MERCED - CHURCAMPÁ”

2019

INVERSIÓN TOTAL 3,292,855



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Modulo I: Aulas
- Módulo II: Escalera, dispensa, cocina, salón de usos múltiple, laboratorio y 2 depósitos en el segundo piso.

- Módulo III
- Módulo IV
- Modulo V

60 Beneficiarios

200
puestos de
trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 2,720,160.00	S/ 1,697,112.86	62.40%	51.56%

“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA GERENCIA DE LA SUB REGIONAL DE CHURCAMP”

2019

INVERSIÓN TOTAL **7,414,476**



ANTES



ACTUAL



Componentes: -

- Sótano
- Primer piso
- Segundo piso
- Tercer piso
- Cuarto piso
- Azotea
- Obras exteriores y equipamiento

1004 Beneficiarios

200
puestos de
trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 312,645.00	S/ 7,397,340.53	100%	97.00%

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LA COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA, CHURCAMPAMPA”

2019

INVERSIÓN TOTAL **1,486,225**



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- 1ra Etapa
- Línea primaria
- Red primaria
- 2da Etapa
- Línea primaria y red primaria Ccasir y Mosoccpampa
- Redes secundarias

749 Beneficiarios

50
puestos de
trabajo

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 15,000.00	S/ 1,184,039.7	79%	96.33%

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

2019



RESULTADOS

- 30 personas capacitados para brindar apoyo y contribuir frente a los eventos adversos de la comunidad de Huanchos, del Distrito de Paucarbamba-Churcampa.
- Fortalecimiento de las capacidades a las población y líderes comunitarios para reducir los riesgos de desastres en las comunidades y minimizar sus efectos adversos

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
Comunidad del Centro Poblado Huanchos	S/ 9,276	Comunidad del Centro Poblado Huanchos	Red de Salud Churcampa

2019



RESULTADOS

- 30 Atención a la población vulnerable afectados a la salud por bajas temperaturas como Churcampa un total de 883 personas atendidos, Paucarbamba un total de 829 personas atendidos, Anco un total de 892 personas atendidos y San Pedro de Coris un total de 570 personas atendidos, por el equipo de Especialistas, Enfermeras y Tec. En Enfermería, logrando un total de 3174 atenciones de la población de Churcampina.

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
Churcampa, Anco, San Pedro de Coris y Paucarbamba	S/ 129,500	3174 personas	Red de Salud Churcampa

FORTALECIMIENTO PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN A NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO TEMPERATURAS 2019

2019



RESULTADOS

- Enseñar y concientizar a la madre para cocinar nutritivamente, para el proceso de la disminución de la anemia en los niños menores de 5 años de edad en la provincia de Churcampa.



Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
Niños menores de 5 años	S/ 69,950	3174 personas	Equipo multisectorial de salud

2019



RESULTADOS

- La cobertura en la campaña de atención de inmunización al 98%

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
Niños menores de 5 años	S/ 2,140,069	Niños menores de 5 años	Equipo multisectorial de salud

IMPLEMENTACIÓN EN MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CRED CON ENFOQUE DEL DIT

2019



RESULTADOS

- Durante el 2019 se realizó la implementación de los servicios de salud en los consultorios de cred con enfoque DIT a fin de garantizar la atención en los niños menores de 5 años .

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
Niños menores de 5 años	S/ 2,973.985	Niños menores de 5 años	Equipo multisectorial de salud

GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO – QUICHUA DEL DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA”

2019

INVERSIÓN TOTAL **3,434,140**

Componentes: -

Sistema de Riego querco – accoylla:

- Construcción de 4640 ml de canal de concreto (sección rectangular 0.40m x 0.40m).
- 4220 ml de línea de distribución (riego)

Sistema de Riego Quichua:

- Construcción de 1800 ml de canal de concreto (sección rectangular 0.40m x 0.40m).
- 4240 ml de línea de distribución (riego)

620 Beneficiarios

**Proyecto
Culminado**



Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 1'371,816.00	S/ 3'434,140.48	100%	92.99%



PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL , ESTRATEGIA DE INMUNIZACIONES: 1ER PUESTO PROVINCIA HUAYTARÁ EN LA VACUNACION VPH 2019

2019

SEGUIMIENTO DE VACUNA VPH POR REDES DE SALUD - REGION HUANCAVELICA 2019												
REDES DE SALUD	TOTAL DE MATRICULADOS PRIMARIA 5TO GRADO 2019 (META VPH 2019)	BRECHA 2018 1RAS DOSIS (JUL - DIC 2018)	TOTAL META 2019 2DA DOSIS	DOSIS APLICADAS			COBERTURAS 2019				CONDICION X 2DA DOSIS (2019 + BRECHA 2018 1RAS)	FALTA VACUNAR 2DA DOSIS
				1RA	2DA	TOTAL 2019	1RA DOSIS R/C META 2019	2DA R/C 1RA BRECHA (2018) + 1RA 2019	2DA DOSIS R/C META 2019	2DA (2018 BRECHA +2019)		
RED HUANCAVELICA	1210	20	1230	1174	1110	2284	97.02	92.96	91.74	90.24	5TO PUESTO	84
RED ACOBAMBA	408	8	416	371	377	748	90.93	99.47	92.40	90.63	4TO PUESTO	2
RED ANGARAES	555	7	562	486	461	947	87.57	93.51	83.06	82.03	7MO PUESTO	32
RED CHURCAMP	401	22	423	350	364	714	87.28	97.85	90.77	86.05	6TO PUESTO	8
RED CASTROVIRREYNA	155	13	168	138	152	290	89.03	100.66	98.06	90.48	2DO PUESTO	-1
RED HUAYTARA	144	2	146	156	155	311	108.33	98.10	107.64	106.16	1ER PUESTO	3
RED TAYACAJA	877	19	896	814	828	1642	92.82	99.40	94.41	92.41	3ER PUESTO	5
REGIÓN HUANCAVELICA	3750	91	3841	3489	3447	6936	93.04	96.28	91.92	89.74	MEDIANO RIESGO	133

FUENTE: DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMATICA DIRESA HVCA -SISTEMA WEB VPH 2019 CORTE: 03/12/2019 HORA:10:00 AM.

RESULTADOS

- La provincia de Huaytará una vez mas muestra el primer lugar en la vacunación VPH, protegiendo al 100% de niñas vacunadas a nivel de 5to grado de primaria y niñas de 10 años de edad con segunda dosis siendo protegidas 3 niñas en otras regiones el cual se realizo seguimiento estricto, se agradece al personal de enfermería por su labor realizado y su compromiso de trabajo

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
155	S/ 100,000.00	155	Red Salud Huaytará e Instituciones Educativas



RESULTADOS

- Se logro controlar a 162 gestantes concluyendo en parto institucionales ,enmarcado en la disminucion de la morbimortalidad materna perinatal.
- Cabe mencionar que se capacito al personal asistencial sobre el manejo de las emergencias obstetricas Y sobre el énfasis de los métodos de larga duración.

Beneficiarios	Inversión	Participantes	Instituciones
162 gestantes	S/ 40,843.00	162 gestantes	Red Salud Huaytará

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

“MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA GERENCIA DE LA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA”

2019

INVERSIÓN TOTAL 4,196,879



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Obras preliminares.
- Movimiento de tierra.
- Pavimentos.
- Obras de arte.
- Señalización y seguridad vial.
- Protección ambiental.
- Flete.
- Control de calidad.


1538 Beneficiarios

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 611,003.00	S/ 2'810,576.16	66.96%	53.13%

“MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 372 DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA”

2019

INVERSIÓN TOTAL **1,089,395**

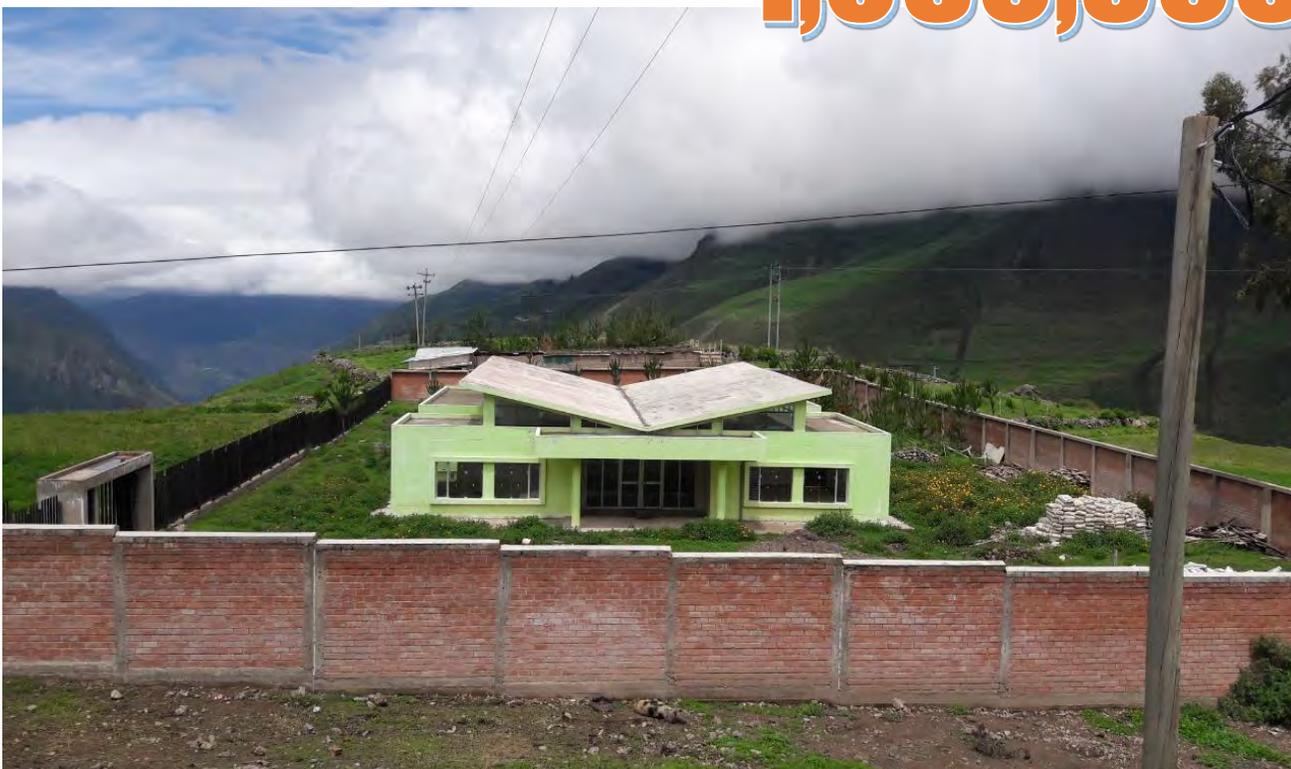

ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Obras exteriores
- Construcción de módulos educativos.
- Construcción de cocina-comedor.
- Cerco perimétrico.
- Tanque séptico y pozo percolador.
- Mobiliario y material didáctico.

400 Beneficiarios

Proyecto Sin Culminar

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 0.00	S/ 1'087,145.27	99.79%	85.66%



“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA –HUANCAVELICA”

2019

INVERSIÓN TOTAL 3,699,807



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Estructura
- Arquitectura.
- Equipamiento y mobiliario.
- Capacitación.
- Mitigación ambiental.
- Instalación eléctrica.
- Instalación sanitaria.

9916 Beneficiarios

Proyecto Sin Culminar

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 0.00	S/ 3'672,985.23	99.79%	62.75%



“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SAN CRISTÓBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO HUACHOS”

2019

INVERSIÓN TOTAL **4,220,732**



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Obras provisionales
- Construcción bloque I, II, III y IV.
- Construcción cerco perimétrico.
- Construcción losa deportiva.
- Adquisición de equipos, materiales y mobiliarios.

1004 Beneficiarios

Proyecto Culminado

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 51,994.00	S/ 4'220,732.75	100%	100%

“CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE CORREGIDOR SANTUARIO HUACA HUACA –JUAN DE LOZA DE DISTRITO DE TICRAPO – CASTROVIRREYNA”

2019

INVERSIÓN TOTAL 1,044,451

ANTES




ACTUAL



Componentes:

- Obras preliminares.
- Movimiento de tierra.
- Obras de arte y drenaje.
- Señalización y seguridad vial.
- Impacto ambiental

955 Beneficiarios

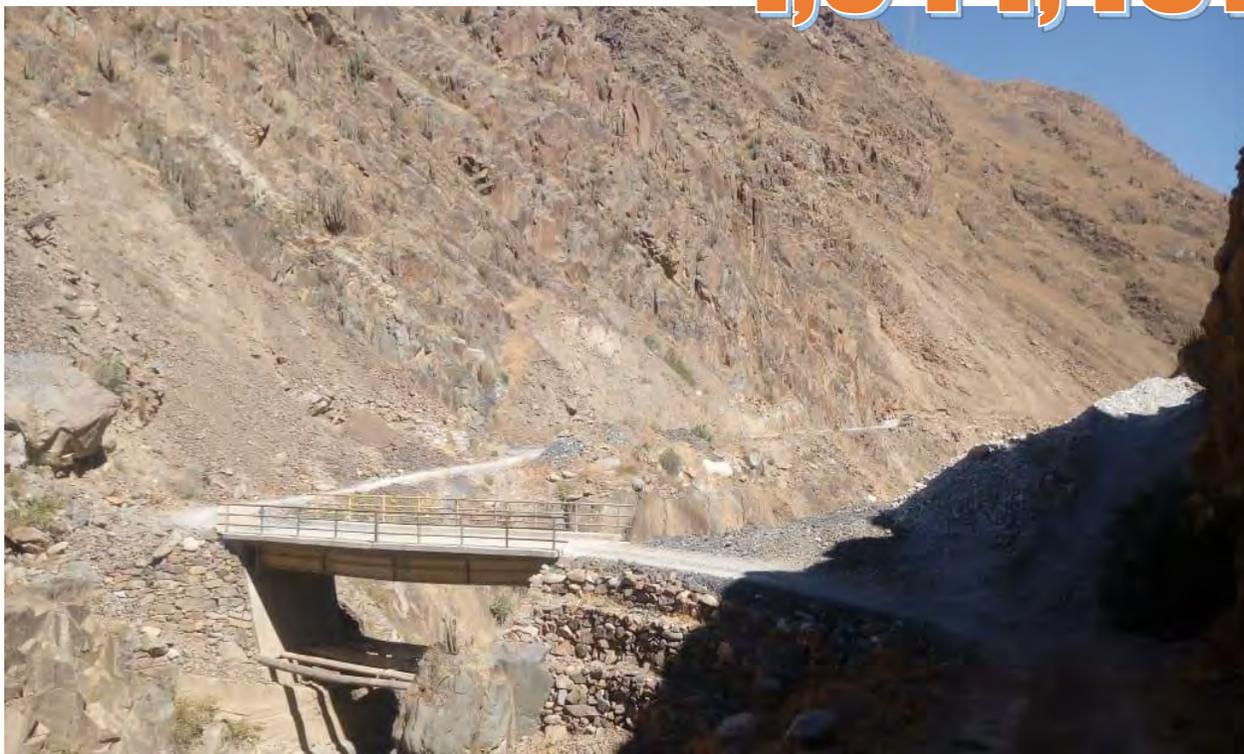

Proyecto Sin Culminar

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 0.00	S/ 666,359.91	83.55%	63.80%

“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO ESMERALDA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA ”

2019

INVERSIÓN TOTAL **1,214,016**



ANTES



ACTUAL



Componentes:

- Obras preliminares.
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Muros de mampostería de piedra.
- Campo deportivo.
- Malla olímpica.
- Escaleras.

240 Beneficiarios

**Proyecto
Culminado**

Asignación 2019	Ejecución Acumulada	Avance Financiero	Avance Físico
S/ 26,323.00	S/ 1'214,016.06	100%	100%

IOARR



ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AURAHUA - AURAHUA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

2019



RESULTADOS


- Se entregó al centro de Salud de Aurahuá y se encuentra en funcionamiento



RESULTADOS

Se realizo la entrega al centro de salud de Ticrapo y se encuentra en funcionamiento.

2019

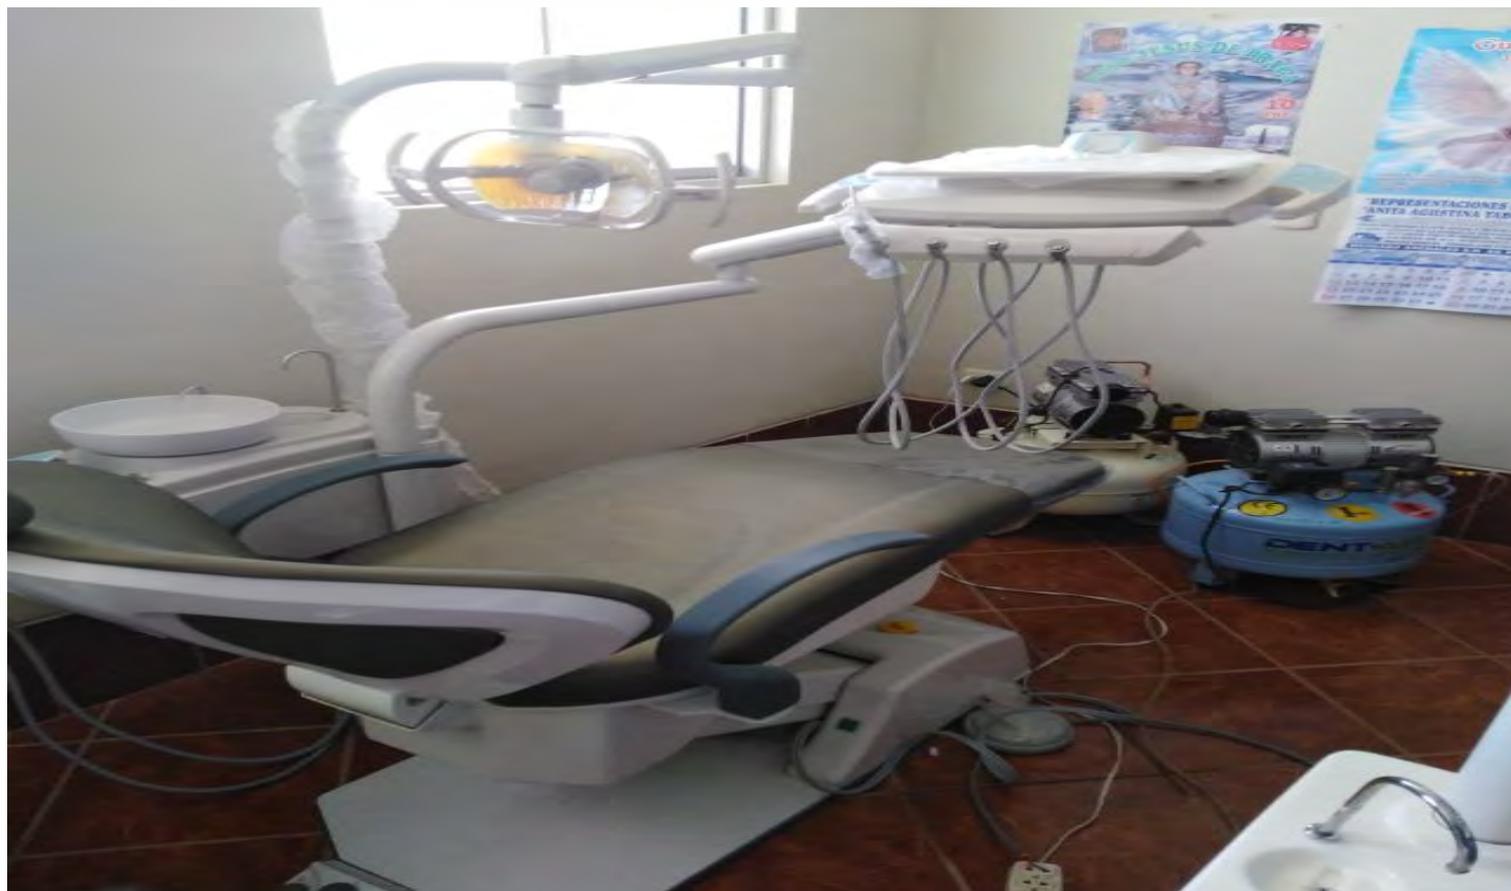

RESULTADOS

Se entregó al centro de salud de Cocas y se encuentra en funcionamiento al servicio de la población

ADQUISICION DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO Y CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

2019



RESULTADOS

Se entregó al centro de Castrovirreyna. Y se encuentra en funcionamiento al servicio de la población

ADQUISICION DE ESTERILIZADOR Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS COTAS - ARMA DISTRITO DE ARMA, CASTROVIRREYNA

2019



RESULTADOS

Se entrego al puesto de salud de Cotas y se encuentra en funcionamiento
