



TEMA : GESTIÓN PRESUPUESTAL






GESTIÓN PRESUPUESTAL

- El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de diciembre del año en curso de la Gerencia Sub Regional por toda Fuente de Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras), asciende a la cantidad de S/. 33'904,405.00 nuevossoles, de los cuales para:
- Gastos Corrientes (remuneraciones, Pensiones y Bienes y Servicios), es de s/. 22'297,159.00 que representa el 65.77%.
- Gastos de Capital (Obras de Inversión), es de s/. 11'607,246.00 que representa el 34.23%.

PRESUPUESTO 2011

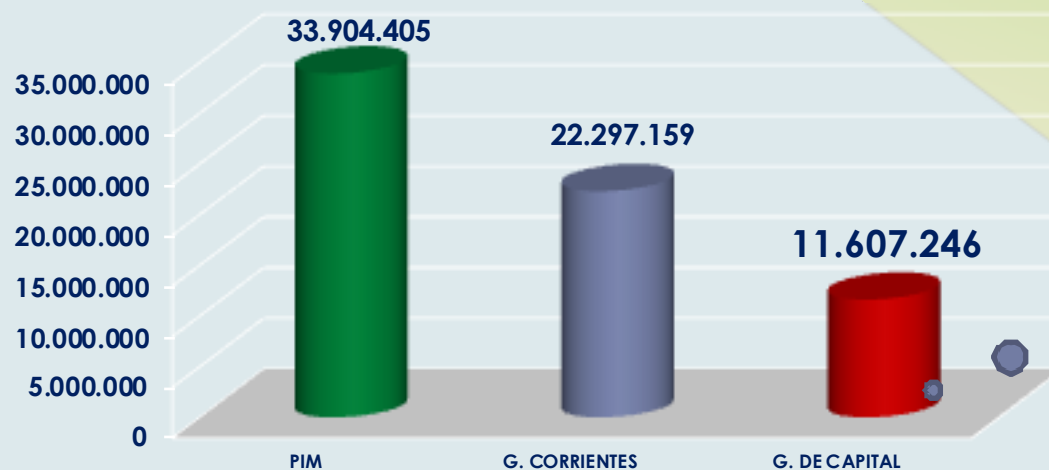

TEMA : EJECUCIÓN DE OBRAS



HUA



PROYECTOS DE INVERSION - EJECUCION 2010 - 2011 (RECURSOS ORDINARIOS)

PROYECTO	META	F.F/ RB	PIM	EJEC. (27-12- 2011)	AVANCE % (27-12- 2011)	SALDO X EJECUTA R (27-12- 2011)
NUCLEO MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD DE: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA ALEGRE	0092	1/00	1,396,138.00			
INTERVENCION CON LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO TECNICO AGROPECUARIO ARTESANAL DE LILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA - HVCA.	0093	1/00	6,918.00			
CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TOCHA CARROZABLE QUIRAHUARA CCANCCAIRO - SAN BARTOLOME - DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HVCA.	0124	1/00	1,519,231.00			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y ANEXO QUISUARPATA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA	0135	1/00	1,655,033.00			
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO - ARMA - HUAYANTO - QUINCHIHUA - ACOMAYO	0136	1/00	1,402,216.00			
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHA	0137	1/00	647,654.00			
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN ISIDRO DE POTACA-SAN JUAN DE VISTA ALEGRE-EMPALME A VIA DE SAN LUIS DE CORERAC DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	0138	1/00	271,218.00			
TOTAL			6,898,408.00			



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDADES OPERATIVAS



GERENCIA (SEDE)

FF/RB	GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	373,957.00	268,530.28	7,418.72	71.80
1/00	2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO)	671,540.00	667,580.40	3,959.60	99.41
5/18	2.3 BIENES Y SERVICIO	80,000.00	78,890.17	1,709.83	98.61
1/00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	96,608.32	3,391.68	96.60
TOTAL		1,263,095.00	1,131,029.17	38,007.43	92.29





AGRICULTURA


FF/RB	GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,056.00	326,055.66	0.34	99.99
1/00	2.3 BIENES Y SERVICIO	60,460.00	59,588.13	871.87	98.55
TOTAL		386,516.00	385,643.79	872.21	99.77





PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR – SALUD) - EUROSPAN


FF/RB	GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
4/13	2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO)	634,398.00	565,851.06	68,546.94	89.19
TOTAL		634,398.00	565,851.06	68,546.94	89.19

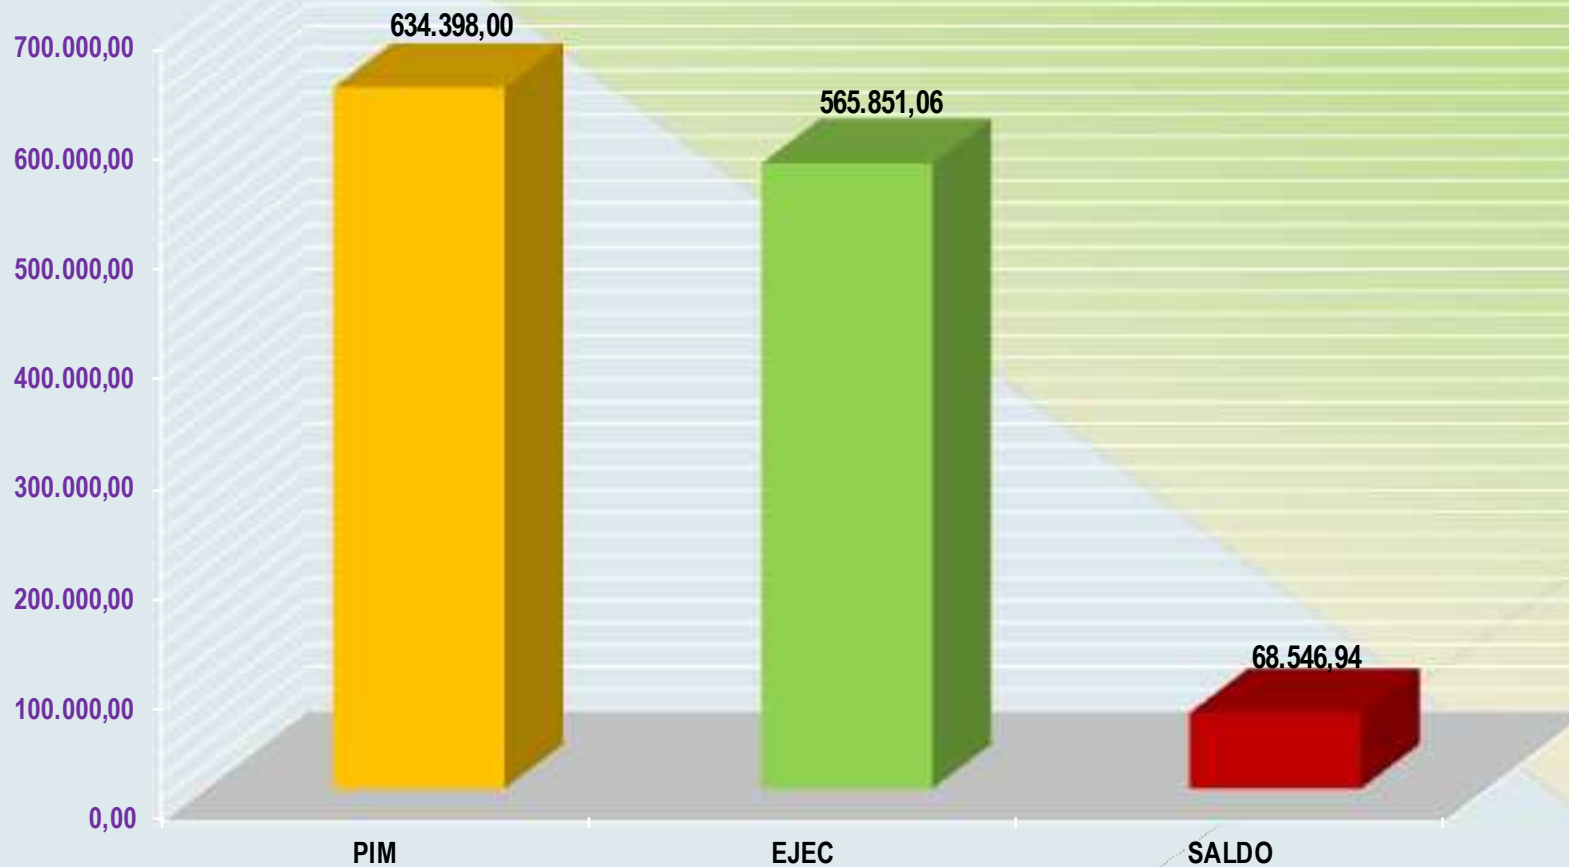



PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR)

FF/RB	GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	0003 – ANIMADORES PRONOEI	120,529.00	110,224.00	10,305.00	91.45
1/00	0003 – LOGROS DE APRENDIZAJE	987,019.00	897,876.27	89,142.73	90.97
TOTAL		1,107,548.00	1,008,100.27	99,447.73	91.02

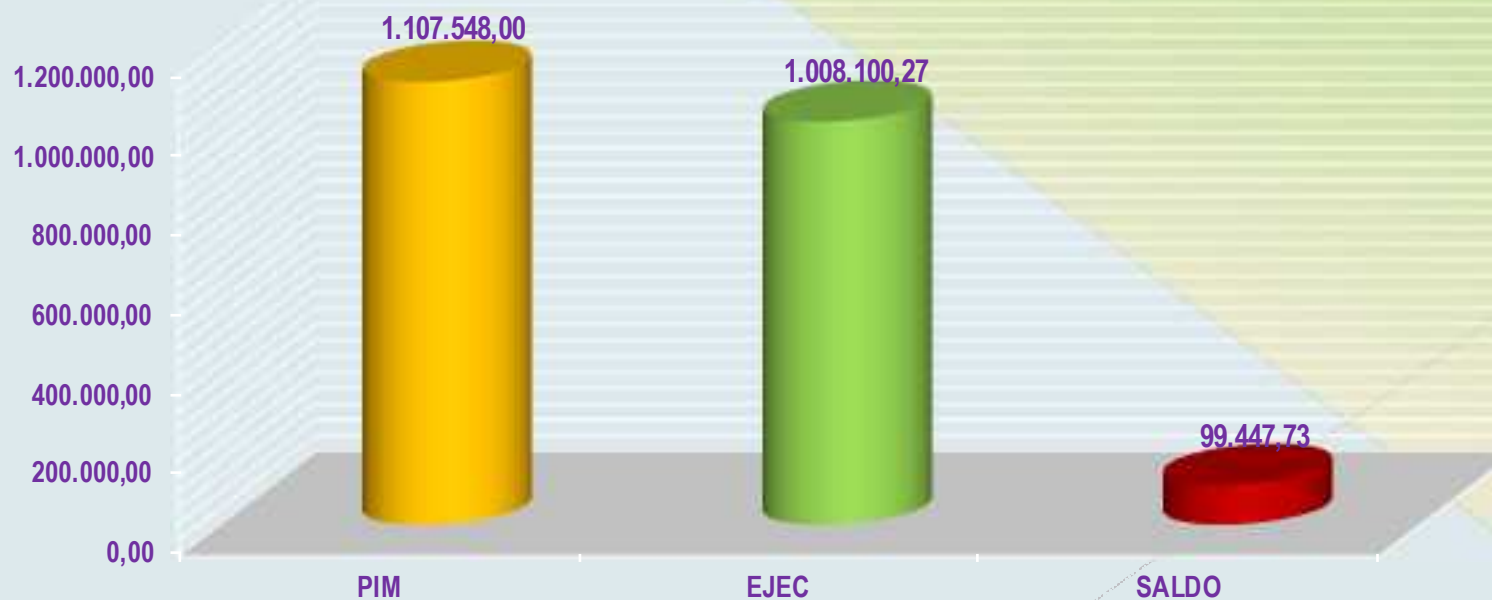



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROVISIÓN SOCIAL (CESANTES)

FF/RB	GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	2.2 PENSION Y PTRAS PRESTACIONES SOCIALES	595,407.00	589,707.00	5,700.00	99.04
TOTAL		595,407.00	589,707.00	5,700.00	99.04





PUESTO DE SALUD SANTO DOMINGO DE CAPILLAS

OBRA DE CONTINUIDAD



○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santo Domingo de Capillas
- Ubicación : Anexo de Capillas

○ Monto de Inversión : S/ 625,554.56

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 85 % avance físico.

□ Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma regular inauguración 15 de Enero del 2012.

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de Santo Domingo de Capillas que podrán acceder a un servicio de salud de calidad que permitirá disminuir los riesgos de enfermedades.





PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE

OBRA DE CONTINUIDAD

○ Datos Generales:

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santo Domingo de Capillas
- Ubicación : Anexo de Vista Alegre

○ Monto de Inversión: S/ 654,190.15

- Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

- Avance : En un 90 % físico.

- Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma regular inauguración 15 de Enero del 2012.

- Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de la comunidad de Vista Alegre que accederán a un servicio de salud de calidad que permitirá disminuir los riesgos de enfermedades.





PUESTO DE SALUD HUAÑACANCHA

OBRA DE CONTINUIDAD

○ Datos Generales:

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santo Domingo de Capillas
- Ubicación : Anexo de Huañacancha

○ Monto de Inversión : S/ 543,950.83

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados y equipamiento que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 80 % físico.

□ Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma regular normal

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de Huañacancha que podrán acceder a un servicio de salud de calidad que permitirá disminuir los riesgos de enfermedades.





PUESTO DE SALUD SANTA DE ANDAYMARCA

OBRA DE CONTINUIDAD (Núcleo Santiago de Chocorvos)



○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : Andaymarca

○ Monto de Inversión : S/ 391,703.73

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 100 % en Proceso de Informe Final

□ Situación Actual : Obra Culminada

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de Andaymarca que contará con ambientes modernos y profesionales de calidad brindarán atención, en especial de los niños, madres gestantes y ancianos





PUESTO DE SALUD SANTA DE ROSA DE OTUTO

OBRA DE CONTINUIDAD (Núcleo Santiago de Chocorvos)

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : Santa Rosa de Otuto


○ Monto de Inversión : S/ 402,921.14

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 100 % en Proceso de Informe Final

□ Situación Actual : Obra Culminada

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de Santa Rosa de Otuto que brindara una adecuada atención de la población, en especial de los niños, madres gestantes y ancianos

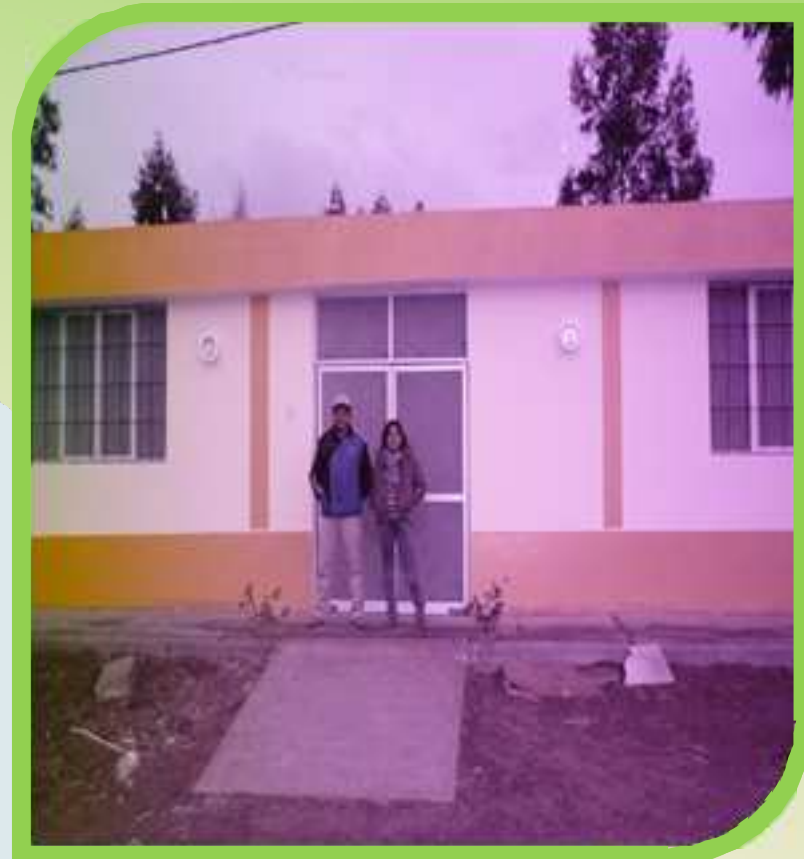



PUESTO DE SALUD SANTA DE ROSA DE ACORA

OBRA DE CONTINUIDAD (Núcleo Santiago de Chocorvos)

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : Santa Rosa de Acora

○ Monto de Inversión : S/ 435,806.79

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 100 % en Proceso de Informe Final

□ Situación Actual : Obra Culminada

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de Santa Rosa de Acora que contara con ambientes modernos y profesionales de calidad para una adecuada atención de la población, en especial de los niños, madres gestantes y ancianos





PUESTO DE SALUD SAN LUIS DE CORERAC

OBRA DE CONTINUIDAD (NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS)

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : Anexo de San Luis de Corerac

○ Monto de Inversión : S/ 394,586.89

○ Objetivo : Optimizar los servicios de salud con ambientes adecuados de primer atención de calidad a favor de la población de San Luis de Corerac.

□ Avance : En un 100 % en Proceso de Informe Final

□ Situación Actual : Obra Culminada

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de San Luis de Corerac que contarán con ambientes modernos que ofrecerán a la población de la zona una atención de calidad con equipamiento moderno y profesionales.





PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE CURIS

OBRA DE CONTINUIDAD (Núcleo Santiago de Chocorvos)

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : San Miguel de Curis

○ Monto de Inversión : S/ 405,178.83

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 100 % en Proceso de Informe Final

□ Situación Actual : Obra Culminada

○ Logros y Beneficios: Los beneficiarios serán la población de San Miguel de Curis que accederán aun servicio de salud de calidad que en favor de los niños, madres gestantes y ancianos.





REHABILITACION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLAYA

OBRA DE CONTINUIDAD (NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS)

- Datos Generales :
 - Provincia : Huaytará
 - Distrito : Santiago de Chocorvos
 - Ubicación : Santa Rosa de Olaya
- Monto de Inversión : S/ 121,392.39
- Objetivo : Optimar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población mas vulnerable
- Avance : En un 85% avance físico.
- Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en ejecución normal.
- Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán la población de Santa Rosa de Olaya que contaran con ambientes mas modernos que le permitirá acceder un servicio de salud de óptima calidad.





REHABILITACION PUESTO DE SALUD SAN MARTIN DE PALMACANCHA

OBRA DE CONTINUIDAD (NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS)

- Datos Generales :
 - Provincia : Huaytará
 - Distrito : Santiago de Chocorvos
 - Ubicación : Anexo de San Martín de Palmacancha
- Monto de Inversión : S/ 225, 842.21
- Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población
 - Avance : En un 98 % avance físico.
 - Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma regular
- Logros y Beneficios: Permitirá a la población de San Martín de Palmacancha un adecuado servicio de salud .





PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE MEJORADA

OBRA DE CONTINUIDAD (NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS)

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Santiago de Chocorvos
- Ubicación : Anexo de Santa Rosa de Mejorada.

○ Monto de Inversión : S/ 438,735.56

○ Objetivo : Mejorar los servicios de salud con ambientes adecuados que brinden una atención de calidad a favor de la población

□ Avance : En un 90 % avance físico.

□ Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma normal

○ Logros y Beneficios: La población de Santa Rosa de Mejorada contarán un puesto de salud moderno y con profesionales de calidad brindando una adecuada y oportuna atención en favor de la población.





CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA DE LLILLINTA

- Datos Generales :
 - Provincia : Huaytará
 - Distrito : Pilpichaca
 - Ubicación :

- Monto de Inversión de Continuidad : S/
1,682,485.00

- Objetivo : Mejorar la vía de acceso entre las comunidades aledañas que permitirán pueblos alejados de las zonas unir con otras redes viales que le permitirán el desarrollo socio económico de población

- Avance : En un 70% físico.

- Situación Actual : La obra esta realizando el afirmado obras de arte se continua con la apertura de la trocha .

- Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán la población de Santa Rosa Lillinta que le permitirá la interacción de comercial del traslado de sus productos propios de la zona con las diferentes comunidades aledañas en busca de mejoras económicas.





CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA CONTINUACION DE TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA CCANCAIRO SAN BARTOLOME PARA EL TRAMO KM-27+720 AL KM42+046

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Cusicancha
- Ubicación : Ccancairo Piscco Pampa
Santiago de Quirahuara

○ Monto de Inversión : S/ 1,460,506.56

- Objetivo : Mejorar la vía de acceso entre las comunidades aledañas que permitirán pueblos alejados de las zonas unir con oras redes viales que le permitirán el desarrollo socio económico de población

○ Fecha de Inicio de Obra: 01 Setiembre 2011

- Avance : En un 85 % avance físico.

- Situación Actual : La obra esta realizando el afirmado obras de arte se continua con la apertura de la trocha .

- Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán la población Quirahura Ccancairo que le permitirá la interacción de comercial del traslado de sus productos propios de la zona con las diferentes comunidades aledañas en busca de mejoraras económicas.





MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA Y ANEXO QUISUARPATA

○ Datos Generales:

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Cusicancha
- Ubicación : Distrito de Cusicancha y Anexo de Quisuarpata

○ Monto de Inversión : S/ 2,002,978.80

○ Objetivo : Incrementar la sostenibilidad de los servicios de primera necesidad en favor de la población de Cusicancha

□ Avance : En un 36.54 % avance físico

□ Inicio de Obra : 02 de Noviembre del 2011.

□ Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando en forma regular normal.

○ Logros y Beneficios:. Mejorar e incrementar la calidad de los servicios básicos y disminuir las enfermedades gastrointestinales y endoparasitarias





CONSTRUCCION DETROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA HUAYANTO QUINCHIHUA ACOMAYO

○ Datos Generales :

- Provincia : Huaytará
- Distrito : Quito Arma.
- Ubicación : Anexo de Chocorvo Arma.

○ Monto de Inversión : S/ 2,632,958.78

○ Objetivo : Mejoramiento de la carretera entre comunidades de Chocorvo Arma y Huayanto Quinchihua Acomayo viabilizando así la intercomunicación y por ende el comercio entre comunidades aledañas

- Avance : En un 22% avance físico.
- Inicio de Obra : 24 de Noviembre del 2011
- Situación Actual : Los trabajos se vienen realizando la apertura de trocha y movimiento de tierra en forma regular
- Logros y Beneficios:. La comercialización de bienes y productos entre comunidades. El desarrollo socioeconómico de dichas comunidades.





“MEJORAMIENTO DE CARRETERA CORERAC - SAN MIGUEL DE CURIS - SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA - TAMBO CRUZ”

- Datos Generales:
- Provincia : Huaytará
- Distrito . Santiago de Chocorvos
- Monto de inversión Continuidad: S/ 120,770.00
- Objetivo: Consiste en el mejoramiento de 33.00 km de señalización con postes kilométricos, visicarretera, incidiéndose en las obras de arte y drenaje, visibilidad de paso 80 mts.
- Avances: 98.72% de avance físico
- Situación actual: La obra continua con los os trabajos faltantes, en lapso de 20 días se culminara a un 100% todas las partidas de proyecto.
- Logros y beneficios: El mejoramiento de la carretera, beneficiara a la interacción comercial de productos agropecuarios y así facilitar en el traslado de productos agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo locales y regionales





EXPEDIENTES TECNICOS



FF/R B	PROGRAMA ESTRATEGICO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	Mejoramiento y Construcción de la Carretera santo domingo de capillas - santa cruz de Tomacc - san José de yanama - san francisco de sangayaico.	66,000.00	66,000.00	0.00	100.00
1/00	Mejoramiento de la carretera Santiago de Chocorvos – Otuto –Quishuarccasa – Andaymarca - Pampahuasi	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00
1/00	Construcción de carretera san Felipe – Incapampa.	71,797.00	71,797.00	0.00	100.00
1/00	Construcción y mejoramiento de la carretera santa rosa de mejorada san José de Llactacha de Santiago de chocorvos.	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
1/00	Construcción y equipamiento del centro educativo técnico productivo N° 34020 Huaytará.	15,070.00	15,070.00	0.00	100.00
1/00	Construcción de cerco Perimétrico de la I.E. Pacamarca, distrito de Pacamarca – Huaytará – Huancavelica.	10,597.00	10,500.00	97.00	99.00
1/00	Mejoramiento e Implementación de la infraestructura de la I.E. Santa rosa, del distrito de tambo, provincia de Huaytará - Huancavelica	25,945.00	25,945.00	0.00	100.00
1/00	Construcción sistema de riego seco – Quirahuara.	48,000.00	48,000.00	0.00	100.00
TOTAL		397,409.00	397,312.00	97.00	99.98



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSÉ DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO

Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, Distrito de San Isidro de Huirpacancha)

Monto de inversión PIM 2011: S / 25,000.00

Objetivo: Elaboración de Estudio de Pre inversión.

Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.

Logros y beneficios: Construcción de la Represa de Bilinyayocc e instalación de 12984ml de línea de conducción, con la finalidad de incrementar la producción agrícola en el distrito de San Isidro.



EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS - OTUTO - QUISHUARCCASA - ANDAYMARCA - PAMPAHUASI

Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Stgo. de Chocorvos, localidad de Otuto–Quishuarccasa– Andaymarca - Pampahuasi)

Monto de inversión PIM 2011: S/ 110,000.00

Objetivo: Es el mejoramiento de la carretera de 75.00 Km., a nivel de afirmado, con obras de arte (badenes, alcantarillas y cunetas), ampliación de las curvas de volteo y la señalización correspondiente.

Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.

Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de Huaytará.

Logros y beneficios: Interconectar la Comunidad de Otuto–Quishuarccasa– Andaymarca - Pampahuasi con la Carretera de Stgo chocorvos, permitiendo a la población de éstas comunidades sacar sus productos a la Ciudades de Lima e Ica, mejorando de ésta manera su desarrollo socioeconómico.



EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FELIPE – INCAPAMPA".

- ◉ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca, localidad de San Felipe, Huaytará, Nueva Alianza e Incapampa)
- ◉ Monto de inversión PIM 2011: S/ 71,797.00
- ◉ Objetivo: Construcción de carretera de 25.80 km. Afirmado y construcción de obras de arte. Para Facilitar el traslado de productos pecuarios a los centros de comercialización y acceso de la población a servicios públicos.
- ◉ Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.
- ◉ Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de Huaytará.
- ◉ Logros y beneficios: La población objetivo asciende a 693 personas, el sustento de las familias está principalmente por la actividad pecuaria, esta actividad les permite obtener los ingresos para el sustento, el vestido, la educación y salud de todos los integrantes de la familia.



EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARÁ".

- ◉ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Huaytará)
- ◉ Monto de inversión PIM 2011: S/ 15,070.00
- ◉ Objetivo : Construcción de la infraestructura área técnico pedagógica, complementarias, servicios y extensión académica, con material noble y equipamiento con mobiliario, equipos para las especialidades; de computación e informática, industrias alimentarias y la especialidad de manualidades.
- ◉ Avances : Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.
- ◉ Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de Huaytará.
- ◉ Logros y beneficios: El proyecto contribuirá a mejorar el servicio educativo con las condiciones físicas (de comodidad, en el desarrollo de las actividades académicas. igualmente el proyecto mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje.



EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERÍMETRO DE LA I.E. PACOMARCA, DISTRITO DE PACOMARCA - HUAYTARÁ - HVCA".

- ◉ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pacamarca)
- ◉ Monto de inversión PIM 2011: S/ 10,597.00
- ◉ Objetivo: La construcción de 320.00 m. de cerco perimétrico de albañilería, para brindar adecuadas condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades educativas y administrativas en la I.E. pacamarca.
- ◉ Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.
- ◉ Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de Huaytará.
- ◉ Logros y beneficios: El proyecto optimizara las condiciones educativas, en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, los beneficiados, estudiantes y docentes de la i.e. pacamarca, verán satisfecha su demanda con la mejora de seguridad.



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ – HUANCAVELICA".

- Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Santa Rosa de Tambo)
- Monto de inversión PIM 2011: S/ 25,945.00
- Objetivo: Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de mobiliarios y equipos para brindar un buen servicio.
- Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.
- Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de Huaytará.
- Logros y beneficios: Construcción de ambientes con techo y Sustitución de los techos del taller de carpintería, con cobertura de teja andina, acabados en los pisos y contra zócalos de cemento pulido, Construcción de cerco perimétrico con muros de ladrillo,, Construcción de cisterna y tanque elevado, Construcción de oficina de administración (Dirección - sala de profesores y Implementación de mobiliario y equipos de todas las áreas.



EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA MIXTA MULTIGRADO N 22118 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE INGAHUASI-PILPICHACA-HUAYTARÁ"

- ◉ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)
- ◉ Monto de inversión PIM 2011: S/ 46,295.00
- ◉ Objetivo : Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de mobiliarios y equipos para brindar un buen servicio.
- ◉ Avances: -----
- ◉ Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y no puede existir duplicidad en inversión.
- ◉ Logros y beneficios: Se pide habilitar dichos montos de expedientes a otros proyectos de envergadura y para ello ser coordinado con la autoridad edil y se plantea en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos.



EXPEDIENTE TECNICO: "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 693- INGABUASI - DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

- ⊙ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)
- ⊙ Monto de inversión PIM 2011: S/ 14,000.00
- ⊙ Objetivo: Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de mobiliarios y equipos para brindar un buen servicio.
- ⊙ Avances:-----
- ⊙ Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y no puede existir duplicidad en inversión.
- ⊙ Logros y beneficios: Se ha pedido habilitar dichos montos de expedientes a otros proyectos de envergadura y para ello ser coordinado con la autoridad edil y se plantea en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARÁ – HUANCAVELICA".

- ⊙ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)
- ⊙ Monto de inversión PIM 2011: 60,000.00
- ⊙ Objetivo: Culminación de la Construcción de la Carretera a nivel de y construcción de obras de arte.
- ⊙ Avances: -----
- ⊙ Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y no puede existir duplicidad en inversión.
- ⊙ Logros y beneficios: Se ha pedido habilitar dichos montos de expedientes a otros proyectos de envergadura y para ello ser coordinado con la autoridad edil y se plantea en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos.

FF/RB	PROGRAMA ESTRATEGICO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1/00	Instalación del servicio de agua del sistema de riego bilinyayocc - Huirpacancha, distrito de san isidro de Huirpacancha – Huaytará - Huancavelica.	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00
1/00	Instalación del servicio de agua del sistema de riego chipta - vista alegre del anexo de pampapuquio, distrito de san Antonio de Cusicancha – Huaytará – Huancavelica	10,800.00	10,800.00	0.00	100.00
1/00	Mejoramiento del sistema de riego en el anexo de Mutanga, distrito de quito arma – Huaytará – Huancavelica	10,800.00	10,800.00	0.00	100.00
1/00	Instalación del servicio de agua del sistema de riego la quitana, distrito de ayaví - Huaytará – Huancavelica	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
1/00	Instalación del servicio de agua del sistema de riego en el sector huaccotulloc, distrito de santo domingo de capillas – Huaytará – Huancavelica	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
1/00	Creación del camino vecinal entre puye – Pampahuasi – los libertadores, distrito de tambo, provincia de Huaytará – región de Huancavelica	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00
1/00	Instalación del servicio de agua del sistema de riego acco, distrito de Huaytará – Huancavelica	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
1/00	Mejoramiento del servicio de agua para uso agrícola en los sectores chupalla y huayta challo del distrito de ocoyo, provincia de Huaytará - Huancavelica	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
1/00	Instalación de los servicios de salud del puesto de salud en la localidad de ccollpapata, distrito de pilpichaca, provincia de Huaytará - Huancavelica	32,500.00	32,500.00	0.00	100.00
1/00	Recuperación de suelos en la localidad de chuñacancha, del distrito de huayacundo arma, provincia de Huaytará - Huancavelica	10,800.00	10,800.00	0.00	100.00
1/00	Construcción de plaza principal en el C.P. Santa rosa de acora del distrito de san francisco de sangayaco	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00
TOTAL		215,400.00	215,400.00	0.00	100.00



PERFIL DE PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BILINYA YOCC - HUIRPA CANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE HUIRPA CANCHA – HUA YTARA - HUANCAVELICA".

- ⦿ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de San Isidro de Huirpacancha)
- ⦿ Monto de inversión PIM 2011: 25,000.00
- ⦿ Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.
- ⦿ Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.
- ⦿ Logros y beneficios: Construcción de la Represa de Bilinyayocc e instalación de 12984ml de línea de conducción, con la finalidad de incrementar la producción agrícola en el distrito de San Isidro.



PERFIL DE PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHIPTA - VISTA ALEGRE DEL ANEXO DE PAMPAPUQUIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA – HUAYTARA – HUANCAVELICA".

- ⦿ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Antonio de Cusicancha)
- ⦿ Monto de inversión PIM 2011: 10,800.00
- ⦿ Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.
- ⦿ Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.
- ⦿ Logros y beneficios: Construcción de 7184ml de canal de concreto con sus respectivas obras de arte, con la finalidad de incrementar la producción agrícola en el Anexo de Pampapuquio del distrito de San Antonio de Cusicancha.



PERFIL DE PIP: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE MUTANGA, DISTRITO DE QUITO ARMA – HUAYTARA – HUANCAVELICA”.

- ⦿ Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Quito Arma)
- ⦿ Monto de inversión PIM 2011: 10,800.00
- ⦿ Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.
- ⦿ Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.
- ⦿ Logros y beneficios: Mejoramiento de canales de riego en un longitud de 1,572.09 ml, y el mejoramiento de 01 reservorio nocturno con capacidad de almacenamiento de 750 m³, con la finalidad de incrementar la producción agrícola en el Anexo de Mutanga del distrito de Quito Arma.



HUANCVELICA



HUANCVELICA
