



IV audiencia pública

Ing. GUILLERMO QUISPE TORRES

**GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA**

Gestión 2011 - 2014

ORGANIGRAMA



COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:
SOPORTE TÉCNICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS (SEDE CENTRAL) LOGROS Y AVANCES

OBRAS - AR
OBRAS - AR

OBRAS CULMINADAS

OBRAS CULMINADAS AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
OBRAS DEL SECTOR EDUCACION					
1	SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº 36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	TACSANA	S/. 1.203.204,63
2	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA	HUANCAVELICA	ACORIA	HUAYLLATOCC	S/. 1.791.407,65
3	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	ANCO	ANCO	S/. 862.874,80
4	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ANTACCOCHA	S/. 1.419.053,74
5	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE. Nº 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	BUENOS AIRES	S/. 1.297.965,86
6	"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA - NUEVO OCCORO"	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	NUEVO OCCORO	S/. 1.962.940,00
7	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36080 SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	PUCACCOCHA	S/. 1.051.701,25
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.	HUANCAVELICA	YAULI	AMBATO	S/. 1.682.557,69
9	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA	ACOBAMBA	CAJA .ESPIRITU	POMACCOCHA	S/. 2.052.629,27
10	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TECHO DE LA I.E. Nº 36002-LAS AZULES-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	S/. 223.784,00
11	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAVELICA	CHURCAMP	CHINCHIHUASI	CHINCHIHUASI	S/. 949.404,17
12	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CCASAPATA	S/. 1.295.463,82
13	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELIXA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	HUANASPAMPA	S/. 1.356.212,49
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLPA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	YANACCOLPA	S/. 1.105.065,37
15	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	HUANCALPAI	S/. 1.790.072,77
16	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	PUTACCA	S/. 1.426.007,43
OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE					
17	CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI	ACOBAMBA	ROSARIO	UTCUÑI	S/. 2.511.094,75
18	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA	HUANCAVELICA	ASCENSION	LACHOCC	S/. 2.749.156,39
19	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI, LLACCO, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	FIERRO RUMI	S/. 674.167,55
20	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ACORIA	MULTILOCAL	S/. 426.107,29
21	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE HUANDO	HUANCAVELICA	HUANDO	OLLANTAYTAMBO	S/. 174.103,18
OTROS SECTORES					
22	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PAMPACHACRA	S/. 754.481,82
23	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL	S/. 2.246.366,09
					31.005.822,01

OBRAS - AD

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAS - POMACANCHA

CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Coras Pomacancha
 - ⦿ **Distrito** : Caja Espiritu
 - ⦿ **Provincia** : Acobamba
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,052,629.27
- ❑ **Beneficiarios** : 704 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para la Institución Educativa de Coras Pomacancha.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminado e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 10 aulas, 01 laboratorio de física-química, 01 laboratorio de biología, 01 Salón de Usos Múltiples, 01 Centro de Cómputo, 01 biblioteca, Ambientes Administrativos, 01 Batería de Servicios Higiénicos, 01 Losa Deportiva, Módulos escolares, 01 laboratorios, 01 Biblioteca, Cerco perimétrico.



CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA MANTARO - UTCUÑI



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Rosario
 - ⦿ **Provincia** : Acobamba
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,511,094.75
- ❑ **Beneficiarios** : 1,927 Pobladores
- ❑ **Objetivo**: Fácil traslado de los excedentes de producción hacia los principales mercados.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción de 11.5 KM de carretera entre Villa Mantaro - Utcuñi, ancho de calzada 3.50 m. con materiales afirmados fino (e=25CM), obras de artes (16 badenes, 09 alcantarillas circulares TMC 48(cunetas y muros de contención).



OBRAS - AD
OBRAS - AD

ACOBAMBA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCVELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Chinchihuasi
 - ⦿ **Distrito** : Chinchihuasi
 - ⦿ **Provincia** : Churcampa
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 949,404.17
- ❑ **Beneficiarios** : 2,110 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para la I. E. Ingenio de la localidad de Chinchihuasi.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurado.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción 01 sala de usos múltiples, 01 Centro de computo, 01 Biblioteca, 01 Laboratorio, 01 losa Deportiva, Cerco perimétrico 63 ml.



OBRAS - AD

CHURCAMP

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPAMPA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Anco
 - ⦿ **Distrito** : Anco
 - ⦿ **Provincia** : Churcampa
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 862,874.8
- ❑ **Beneficiarios** : 2,918 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para la Institución Educativa La esmeralda de Anco.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Mejoramiento de 07 aulas, 02 SS.HH., 01 biblioteca, 01 laboratorio, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 sala de espera, 6 ml de muro contención, construcción de 01 losa deportiva multiuso, construcción de 80 ml. Muro perimétrico, adquisición de 05 mobiliarios para laboratorio, adquisición de 05 mobiliarios para ambiente administrativo y materiales pedagógicos y lúdicos.



OBRAS - AD

CHURCAMPAMPA

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Antacocha
 - ⦿ **Distrito** : Huancavelica
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,419,053.74
- ❑ **Beneficiarios** : 598 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos en el nivel secundario de la institución educativa Santa Isabel de Antacocha.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 98.12% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 05 aulas, 01 Laboratorio de física, 01 Sala de Profesores, 01 Dirección, 01 Secretaria, 01 Salón de Usos Múltiples, 01 Centro de Computo, 01 Biblioteca, SS.HH. para damas y varones, losa deportiva, cerco perimetral, Equipamiento (125 carpetas, 20 pupitres, 145 sillas, 30 taburetes, 20 computadoras, 10 proyector multimedia, 01 equipo de sonido)



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO YAULI - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Ambato
 - ⦿ **Distrito** : Yauli
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,682,557.69
- ❑ **Beneficiarios** : 2 500 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada prestación de servicios educativos de formación secundaria en la I.E. Antonio Raymondi del C.P. de Ambato.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 101% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminado e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 06 aulas, 01 sala de profesores, 01 laboratorio, 01 sala de computo, 01 SS.HH, Cerco perimétrico, losa deportiva, Equipamiento (20 computadoras con respectivo muebles)



OBRAS - AD

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 36080 SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Pucacocha
 - ⦿ **Distrito** : Acoria
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,051,701.25
- ❑ **Beneficiarios** : 1,381 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para el nivel primario de la I.E. N°36080 San Miguel de Pucacocha.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 99.09% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminado e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 6 aulas, 01 Sala de cómputo, 01 Dirección, 01 Albergue docente, Cerco perimétrico, Losa multifuncional, 01 Tanque séptico, 01 Poso percolador, Equipamiento (Mobiliario escolar, Equipo de cómputo).



OBRAS - AD

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA

CULMINADA

❑ **Generales:**

- ⦿ **Localidad** : Ccasapata
- ⦿ **Distrito** : Yauli
- ⦿ **Provincia** : Huancavelica

❑ **Monto de inversión** : S/. 1,207,463.82

❑ **Beneficiarios** : 806 pobladores

❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para el nivel Primario de la Institución Educativa de Ccasapata.

❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal

❑ **Situación Actual** : Obra culminado e inaugurada

❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 09 Aulas Pedagógicas, 01 Dirección, 01 sala de profesores 02 Baterías de SS.HH., Cerco perimétrico de 197 ml, 01 Patio de usos múltiples, Equipamiento(13 módulos de oficina escritorio y sillas, 15 para adulto, 120 mesas unipersonales, 09 pizarras acrílicas, 10 Computadoras y 01 proyector multimedia)



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS LOCALIDAD DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Putacca
 - ⦿ **Distrito** : Palca
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,426,007.43
- ❑ **Beneficiarios** : 1 008 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para el nivel Primario de la Institución Educativa Palca.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminado e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción de 05 Aulas, 01 Dirección, 01 salón de usos múltiples, 01 Laboratorio, 01 Biblioteca, 01 Centro de computo, 01 Batería de SS.HH, Cerco perimétrico, Equipamiento(21 Computadoras, 120 mesas y sillas y Modulo de laboratorio de Biología y Química)



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA LEONCIO PRADO GUTIÉRREZ DEL CENTRO POBLADO DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA



CULMINADA

Generales:

- Localidad : Huanaspampa
 - Distrito : Acoria
 - Provincia : Huancavelica
- Monto de inversión : S/. 1,356,212.49

Beneficiarios : 889 pobladores

Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos de la Institución Mixta Leoncio Prado Gutiérrez del Centro Poblado Huanaspampa.

Avances: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal

Situación Actual : Obra culminado e inaugurada

Logros y Beneficios: Construcción de 06 aulas pedagógicas, 01 Dirección, 02 Baterías de SS.HH. Para alumnos y adultos, 01 Biblioteca, Cerco perimétrico de 864 ml, 01 Centro Computo, 01 Sala de usos múltiples, Adquisición de muebles y equipos computo, equipamiento de biblioteca y oficinas administrativas.



OBRAS - AD

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

GRI

INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. Mx. MANUEL GONZALES PRADA – NUEVO OCCORO



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Nuevo Occoro
 - ⦿ **Distrito** : Nuevo Occoro
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1, 962,940.00
- ❑ **Beneficiarios** : 540 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para la C.E. Mx Manuel Gonzales Prada - Nuevo Occoro
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 06 Aulas, 1 Laboratorio de física química, 01 Biblioteca, 01 Centro de computo, 01 Administración, 01 Tópico, 1 Batería de SS.HH., 01 Patio, 01 Tanque elevado, Cerco perimétrico, Mobiliario y equipos de computo y data



HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.N°36117 DE TACSANA-DISTRITO YAULI-HUANCAVELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Tacsana
 - ⦿ **Distrito** : Yauli
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,242,380.15
- ❑ **Beneficiarios** : 793 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para la Institución Educativa N° 36117 de Tacsana.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 06 aulas y ambientes administrativos y complementarias, servicio higiénico con tanque séptico, pozo de percolación, refacción de aulas, adquisición de mobiliario escolar y equipos de informática, losa de multiuso y cerco perimétrico.



OBRAS-AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Huayllayocc
 - ⦿ **Distrito** : Acoria
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,791,407.65
- ❑ **Beneficiarios** : 599 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para la Institución Educativa N° 36313 de Huayllayocc.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción de 06 aulas pedagógicas, 01 Aula de usos Múltiples, 01 centro de cómputo incluido accesorios, Equipamiento(20 Computadora, 04 Laptop, 01 Ecran, 105 Mesas de Madera y 230 sillas de madera, 01 Proyector LCD Multimedia, 01 Minicomponente 3 bandejas, 07 Televisores LCD 42", 01 Cámara digital 12.1 Mega pixeles)



OBRAS - AD
OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.E.N° 36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Buenos Aires
 - ⦿ **Distrito** : Nuevo Occoro
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,297,965.86
- ❑ **Beneficiarios** : 460 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para la E.E. N° 36009 Buenos Aires - Nuevo Occoro
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción de 03 Aulas, 01 Centro de Cómputo, 01 Biblioteca, 01 Dirección y Secretaría, Comedor – Cocineta, 2 Dormitorios, Patio Multifuncional, Cerco Perimétrico, Modulo de Servicio Higiénico, Implementación con Mobiliario Educativo (Mesas, Sillas, Estantes), Implementación con 18 Computadores.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TECHO DE LA I.E. N°36002-LAS AZULES-HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Huancavelica
 - ⦿ **Distrito** : Huancavelica
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 223,784.00
- ❑ **Beneficiarios** : 800 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuada oferta de servicios educativos para la I. E. N° 36002 las azules.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: La rehabilitación de la cobertura que cuenta la infraestructura destinados a áreas pedagógicas, áreas administrativas, y servicios higiénicos, pintado general e instalaciones eléctricas.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Yanacollpa
 - ⦿ **Distrito** : Huando
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,010,582.9
- ❑ **Beneficiarios** : 940 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuada oferta de servicios educativos para la I. E. del nivel Secundario Pedro Paulet Distrito Huando.
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 05 aula, 01 Centro de Computo, 01 Ambiente Administrativo, 01 Laboratorio, SS.HH. Cerco Perimétrico, Losa Deportiva Multifuncional, Equipamiento(12 Computadoras, 12 Muebles de computadora, 08 Escritorio para docente, 07 Sillas giratorias y 24 taburetes)



HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

CULMINADA

❑ Generales:

- ⦿ **Localidad** : Huancalpi
- ⦿ **Distrito** : Vilca
- ⦿ **Provincia** : Huancavelica

❑ Monto de inversión : S/. 1,790.072,77

❑ Beneficiarios : 950 Pobladores

❑ Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos para la I. E. José Carlos Mariátegui de Huancalpi Distrito Vilca

❑ Avances: 100.00% Físico 100.0% Presupuestal

❑ Situación Actual : Obra culminada.

❑ Logros y Beneficios: Construcción de pabellón para áreas administrativas, centro de computo, laboratorio, almacén, salón de profesores, construcción de SS.HH, losa deportiva, vivero, Tanque séptico, adquisición de 31 taburetes, 180 sillas, 35 módulos de computadora, 6 mesas para biblioteca, 4 estantes para biblioteca, 4 escritorios, 5 pizarras acrílicas, 2 proyectores, 1 tv, 1 DVD, 1 equipo de sonido, 1 Ecran y 06 parlantes



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Lachocc
 - ⦿ **Distrito** : Ascensión
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2.749.156,39
- ❑ **Beneficiarios** : 1215 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Facilidad en el traslado de pasajeros y productos pecuarios a los mercados de consumo
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de la trocha carrozable “Lachocc – Orccobamba” con una longitud de 23+00 Km. con 3.5 m. de ancho de calzada, con obras de arte de alcantarilla de TMC y badenes de concreto ciclópeo.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI, LLACCO, DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA DE HUANCAVELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Fierro Rumí
 - ⦿ **Distrito** : Acoria
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 674.167,55
- ❑ **Beneficiarios** : 615 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Facilidad en el traslado de pasajeros y productos pecuarios a los mercados de consumo
- ❑ **Avances:** 100.00% Físico 100.0% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de la carretera de 4+797 km. de Longitud con sus respectivas obras de arte y señalización vial.



HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

OBRAS - AD

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Acoria
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 426,107.29
- ❑ **Beneficiarios** : 740 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuado acceso para trasladar productos agropecuarios a los mercados de consumo y para la integración distrital y provincia.
- ❑ **Avances:** 100 % Físico 100 % Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** Obra Culminada
- ❑ **Logros y Beneficios:** Mejoramiento de la carretera de 4+720 Km, alcantarillas y señalización de la vía.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

OBRAS EN EJECUCIÓN

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	AVANCE FISICO	PRESUPUESTO
OBRAS DEL SECTOR EDUCACION						
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	VILCA	VILCA	86.39%	S/. 1.306.070,35
2	"AMPLIACION, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº36561-LECCLESPAMPA-ACOBAMBA "	ACOBAMBA	ROSARIO	LECCLESPAMPA	35,71%	S/. 1.332.960,00
3	"MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMON CASTILLA MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO Y PROVINCIA -HUANCVELICA "	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SANTA ANA	10.92%	S/. 6.347.774,65
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN GAMARRA-HUANDO	HUANCVELICA	HUANDO	HUANDO	32.66%	S/. 2.441.455,70
5	CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CCACCASIRI	97.64%	S/. 2.782.745,51
6	CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, DIRECCION, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CERCO PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E P Nº 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	LARIA	ZUÑIPAMPA	77.34%	S/. 1.202.318,00
7	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 37475 SAN GERONIMO - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SAN GERONIMO	0,00%	S/. 1.090.769,27
OBRAS DEL SECTOR TRANSPORTE						
8	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL	94.33%	S/. 13.703.020,90
9	MEJORAMIENTO DE LA AV. ASCENCION Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA, DISTRITO DE ASCENCION-HVCA-HVCA	HUANCVELICA	ASCENCION	ASCENCION	93.99%	S/. 4.402.610,54
10	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CERRETERA PUCALOMA- MOLINO- PATIBAMBA-YLLPE- VILLAMAYO-PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DPTO. HVCA	CHURCAMP	SAN PEDRO DE CORIS	MULTILOCAL	29.15%	S/. 7.392.119,16
11	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA, RIO RUNTUHUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC-DISTRITO DE PALCA-HUANCVELICA "	HUANCVELICA	PALCA	PALCA	62.08%	S/. 3.420.791,15
12	CARRETERA Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROCHACC SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	SANTA ROSA DE PIQUIS	97.00%	S/. 2.440.111,04
13	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN CITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-HUANCVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	HUARACCO	50.17%	S/. 1.427.824,87
14	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	COTAY	15.49%	S/. 6.808.940,62
15	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA -PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.	ACOBAMBA Y ANGARAES	ANCHONGA	PONGOS GRANDE	15.85%	S/. 6.782.796,59
OTROS SECTORES						
16	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HAUANCVELICA	ACORIA	QUIMINA	56.93%	S/. 1.884.588,83
17	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA	CHURCAMP	LOCROJA	SOCOCOCHA	42-34%	S/. 2.953.915,55
18	ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE LA COMUNIDAD DE ALTO ANDINA DEL DISTRITO DE ASCENCION - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENCION	ALTO ANDINA	7.70%	S/. 206.474,67
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE POLICIAS - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SAN CRISTOBAL	9.06%	S/. 418.719,75
20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	CCASAPATA	12.00%	S/. 350.665,00
21	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - REGION HUANCVELICA	HVCA	TODOS	MULTILOCAL	25,00%	S/. 9.800.487,20
22	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCVELICA	ACOBAMBA	TODOS	MULTILOCAL	25,00%	S/. 7.893.486,30
23	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - REGION HUANCVELICA	ANGARAES	TODOS	MULTILOCAL	25,00%	S/. 7.908.891,20
24	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP - REGION HUANCVELICA	CHURCAMP	TODOS	MULTILOCAL	25,00%	S/. 7.894.027,20
						S/. 102.193.564,05


OBRAS - AD

CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA



EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Ccaccasiri
 - ⦿ **Distrito** : Acoria
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,501,108.82
- ❑ **Beneficiarios** : 884 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios educativos de la I.E. Manuel Scorza Torres de Ccaccasiri.
- ❑ **Avances:** 97.64 % Físico 95.53% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** En acabados, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y pintura en general.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de: 07 aulas, 01 sala de uso múltiple, 01 centro computo, 02 laboratorios, 01 biblioteca, losa deportiva, ambientes administrativos, batería de SS.HH., cerco perimétrico y respectivo equipamiento. .

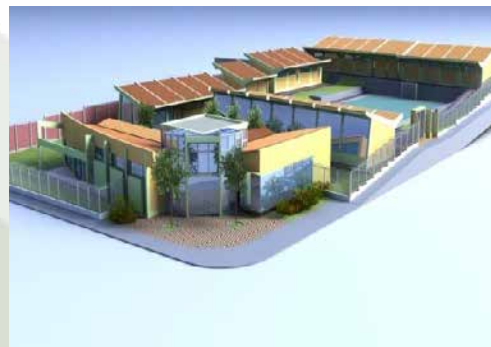

OBRAS - AD

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO DE LA I.E. RAMÓN CASTILLA MARQUESADO DEL BARRIO DE SANTA ANA DISTRITO Y PROVINCIA -HUANCAVELICA



EN EJECUCIÓN

❑ Generales:

- ⦿ **Localidad** : Huancavelica
- ⦿ **Distrito** : Huancavelica
- ⦿ **Provincia** : Huancavelica

❑ **Monto de inversión** : S/. 6,347,774.65

❑ **Beneficiarios** : 1,348 pobladores



❑ **Objetivo:** Adecuadas condiciones físicas para el servicio educativo en la institución educativa de nivel secundario Ramón Castilla y Marquesado del barrio de Santa Ana, distrito y provincia de Huancavelica.

❑ **Avances:** 10.92% Físico 26.15% Presupuestal

❑ **Situación Actual:** Construcción de aulas, gimnasio , cimentación de las bases de la piscina y la biblioteca.

❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 12 aulas, Rehabilitación de 06 aulas, 02 Centros de computo, 02 Biblioteca, 01 taller y rehabilitación de 03 talleres, 01 piscina temperada, 01 Gimnasio, cerco perimétrico 560 ml, losa deportiva, Modulo de SS.HH., Equipamiento (Mobiliario escolar, sala de computo-laboratorio y talleres).



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTÍN GAMARRA-HUANDO

EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Huando
 - ⦿ **Distrito** : Huando
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,441,455.7
- ❑ **Beneficiarios** : 816 pobladores



- ❑ **Objetivo:** Adecuadas condiciones físicas para el servicio educativo en la institución educativa de nivel secundario Mariscal Agustín Gamarra Distrito Huando, Provincia de Huancavelica.
- ❑ **Avances:** 32.66% Físico **40.23%** Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** Techado de aulas, asentado de ladrillos, concreto en columnas.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 15 Aulas, 06 SS.HH, 02 Ambientes Dirección y sub Dirección, 02 Ambiente Secretaria y sala de Profesores, 02 laboratorios, 02 Centro de Computo, 01 Sala de usos múltiples, Cerco perimétrico de 179 Ml, losa deportiva, Equipamiento (120 mobiliarios para alumno y 20 mobiliarios para docentes, 17 equipos de cómputos, 01 retroproyector, 01 Ecran materiales para laboratorio.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N°36561-LECCLESPAMPA-ACOBAMBA

EN EJECUCIÓN

❑ Generales:

- ⦿ **Localidad** : Lecclespampa
- ⦿ **Distrito** : Rosario
- ⦿ **Provincia** : Acobamba

❑ Monto de inversión : S/. 1,351,968.18

❑ Beneficiarios : 723 pobladores

❑ Objetivo: Adecuadas condiciones físicas para el servicio educativo en la Institución Educativa N° 36561 Lecclespampa - Acobamba.

❑ Avances: 50.77% Físico **53.32%** Presupuestal

❑ Situación Actual: Obra en ejecución normal (Encofrado para techo , tarrajeo de muro)

❑ Logros y Beneficios: Construcción de 06 Aulas, una dirección, sala de profesores, Losa deportiva, cerco perimétrico 165.11 ml, Material didáctico, mobiliario escolar y equipamiento con equipos de cómputo



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO DE VILCA - HUANCAMELICA



EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Vilca
 - ⦿ **Distrito** : Vilca
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 1,143,270.35
- ❑ **Beneficiarios** : 578 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Adecuadas condiciones físicas para el servicio educativo en la Institución Educativa San Juan Bautista, Distrito Vilca
- ❑ **Avances**: 86.39% Físico 97.81% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual**: Obra en ejecución normal.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Cerco perimétrico de 111.47 ml, 01 laboratorio de biología química, 01 salón de usos múltiples, 01 centro de computo, 01 biblioteca, 01 vivero agrícola, equipamiento (31 taburetes para laboratorio; 180 sillas metálicas, 06 mesas de madera, 04 estantes, 04 escritorios, 05 pizarras acrílicas, 36 computadoras, 02 proyectores, 01 tv, 01 DVD, 01 equipo de sonido y 02 Ecam.



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COTAY - TIPICOCHA

EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Cotay - Tipicocha
 - ⦿ **Distrito** : Multidistrital
 - ⦿ **Provincia** : Castrovirreyna
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 6,808,940.62
- ❑ **Beneficiarios** : 15,765 pobladores



- ❑ **Objetivo:** Fácil traslado de los excedentes de producción hacia los principales mercados desde las localidades de Cotay y Tipicocha de las provincias de Huancavelica y Castrovirreyna del departamento de Huancavelica.
- ❑ **Avances:** 15 .49% Físico 6.43% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** Replanteo y apertura de trocha carrozable.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de carretera nueva a nivel de afirmado de 36.04 Km, 70 Alcantarillas TMC de 24", 13 Alcantarillas TMC de 36", 03 Alcantarillas TMC de 36"x2, 05 Pontón L=6.0 m y L=5.0 m, 21 Badenes, 18 Alcantarillas de Concreto, 150 ml Muros Secos, Mejoramiento de Sub rasante.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA- MOLINO- PATIBAMBA-YLLPE- VILLAMAYO- PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP

EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : San Pedro de Coris, Pachamarca
 - ⦿ **Provincia** : Churcampa
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 7,392,119.16
- ❑ **Beneficiarios** : 2,530 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Facilidad en el traslado de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo.
- ❑ **Avances:** 29.15% Físico 51.16% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** Obra en ejecución, trazo y replanteo, movimiento de tierra en roca suelta con maquinaria y mejoramiento de plataforma de rodadura.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Construcción y mejoramiento a nivel de afirmado 54.85 Km, Construcción de vía 8.76 km, Mejoramiento de vía 46.09 Km, Obras de arte(70 alcantarillas, 26 badenes, 08 Muros secos, 02 pontones) y Señalización.



MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - CAJA ESPÍRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY

EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Multidistrital
 - ⦿ **Provincia** : Acobamba
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 13,703,020.90
- ❑ **Beneficiarios** : 10,416 pobladores
- ❑ **Objetivo**: Facilidad en el traslado de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo.
- ❑ **Avances**: 94.33% Físico 89.56% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual**: Obra en ejecución de obras de arte, afirmado de plataforma de rodadura, limpieza de cuneta.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080 km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m. de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m.se construirá los pontones, badenes, alcantarillas, mejoramiento de las cunetas laterales y alcantarillas, señalización con postes kilométricos.



MEJORAMIENTO DE LA AV. ASCENSIÓN Y ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA, DISTRITO DE ASCENCION-HVCA EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Ascensión
 - ⦿ **Distrito** : Ascensión
 - ⦿ **Provincia** : Huancavelica
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 4,402,610.54
- ❑ **Beneficiarios** : 8,486 pobladores
- ❑ **Objetivo:** Mejora de la vía para un mejor transitabilidad.
- ❑ **Avances:** 93.99% Físico 99.75% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** colocado de adoquines, concreto en la pista.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Pavimento tipo rígido de concreto de las Av. Ascensión y los accesos al Terminal Terrestre Alberto Benavides de la Quintana a través del Malecón Independencia y Jr. Santa Rosa, espesor 0.18 m, en una área total de 8,697.60 M2 construcción de muro de encauzamiento en la margen izquierda del rio Ichu en una longitud 443 m.



CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PALCA RIO RUNTUHUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC-DISTRITO DE PALCA-HUANCAVELICA

EN EJECUCIÓN



❑ **Generales:**

- **Localidad** : Palca
- **Distrito** : Palca
- **Provincia** : Huancavelica

❑ **Monto de inversión** : S/. 3,420,791.15

❑ **Beneficiarios** : 1,845 pobladores

❑ **Objetivo:** Mejora de la seguridad para evitar el desembalse del río.

❑ **Avances:** 62.08% Físico 75.33% Presupuestal

❑ **Situación Actual:** Obra en ejecución de muros de contención y muro seco

❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de muros de concreto ciclópeo 715.75 ml, Mejoramiento de muro de Contención 523.55 ml, muros secos 934.43 ml, Mejoramiento y reforzamiento de cimentación de muros en 405.54 ml, 01 puente peatonal metálico, pontón de 8 metros de Luz y 02 alcantarillas.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ROCHACC SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE ANCO PROVINCIA DE CHURCAMP

EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Anco
 - ⦿ **Provincia** : Churcampa
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,440,111.04
- ❑ **Beneficiarios** : 1,130 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Facilidad en el traslado de pasajeros y productos agropecuarios a los mercados de consumo
- ❑ **Avances:** 97.00% Físico 99.45% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** afirmado de plataforma de rodadura y ejecución de alcantarillas y badenes y limpieza de cuneta.
- ❑ **Logros y Beneficios:** Mejoramiento y Construcción de una carretera vecinal a nivel de afirmado en 8+700 Km, con un ancho de plataforma de 4.00 m y una base de 0.15m, obras de arte (alcantarillas, badenes de drenaje y muros de contención)



MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARÁ-HUANCAVELICA



EN EJECUCIÓN

❑ **Generales:**

- ⦿ **Localidad** : Huaracco
- ⦿ **Distrito** : Pilpichaca
- ⦿ **Provincia** : Huaytará

❑ **Monto de inversión** : S/. 1,427,824.87

❑ **Beneficiarios** : 416 Pobladores

❑ **Objetivo:** Adecuadas condiciones de habitabilidad del poblador del anexo de Huaracco, Distrito de Pilpichaca de la Región de Huancavelica.

❑ **Avances:** 50.17% Físico 57.99% Presupuestal

❑ **Situación Actual:** Armado de techo y Techado de las viviendas

❑ **Logros y Beneficios:** Construcción de 29 módulos de vivienda unifamiliar con muros de adobe reforzados con geomallas, pisos de madera machihembrado cobertura de calamina.



OBRAS - AD

HUAYTARA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA -PAMPALCO- SANCAYPAMPA - HUARICHA.



EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Anchonga
 - ⦿ **Provincia** : Angaraes
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 6,782,796.59
- ❑ **Beneficiarios** : 6,616 Pobladores
- ❑ **Objetivo:** Adecuado nivel de acceso para el traslado de carga y pasajeros en las comunidades de los distritos de Anchonga provincia de Angaraes, Anta y Paucara provincia de Acobamba, departamento Huancavelica.
- ❑ **Avances:** 15. 85% Físico 33.29% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual:** trazo y replanteo de, movimiento de tierra, ampliación de trocha, concreto para ponton
- ❑ **Logros y Beneficios:** Mejoramiento y Construcción 37+280km, alcantarillas, badenes, puentes, pontones, cunetas sin revestir y señalización de la vía.



OBRAS - AD

ANGARAES

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA



EN EJECUCIÓN

❑ Generales:

- ⦿ **Localidad** : Quimina
- ⦿ **Distrito** : Acoria
- ⦿ **Provincia** : Huancavelica

❑ **Monto de inversión** : S/. 1,884,588.83

❑ **Beneficiarios**: 940 Pobladores

❑ **Objetivo**: Disminuir los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de Quimina.

❑ **Avances**: 56.93% Físico 59.70% Presupuestal

❑ **Situación Actual**: Reservorio de agua, Instalación de tubería, pozo séptico.

❑ **Logros y Beneficios**: 01 captación, 01 Reservorio de 20 m³, Mejoramiento de la línea de conducción en 2,592.27 ml, Mejoramiento de la línea de aducción y distribución en 3,978.38 ml, 5,303.00 ml. De red de alcantarillado, 135 conexiones domiciliarias de alcantarillado, 02 tanques sépticos y 04 pozos percoladores, 58 buzones de concreto.



OBRAS - AD

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

GRI

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA



EN EJECUCIÓN

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Sococcocha
 - ⦿ **Distrito** : Locroja
 - ⦿ **Provincia** : Churcampa
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2.953.915,55
- ❑ **Beneficiarios** : 1,436 Pobladores
- ❑ **Objetivo**: Aumentar la producción de agrícola.
- ❑ **Avances**: 42.34% Físico 45.13% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual**: Entubado en la línea de conducción.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Construcción de 02 diques con geomenbrana, (uno con 102 m. de longitud, altura de 10.5 m y otro con 159 m de longitud, altura de 12 -5m), 01 tubería de descarga de presa, 01 canal entubado de conducción de agua de 12.4 km y obras de arte. .



OBRAS - AD

CHURCAMP

Trabajamos para todos

GRI

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN



OBJETIVOS

- Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura dentro del ámbito regional teniendo en cuenta las funciones consignadas en el ROF:
- Normar, monitorear, **supervisar**, liquidar y transferir obras.

OBRAS CULMINADAS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBRAS CULMINADAS AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	VARIOS	1,936,160.63
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA	1,648,134.64
3	CONSTRUCCION E IMPLMETACION DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE JULCAMARCA DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	JULCAMARCA	2,814,313.88
4	CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	PALERMO	1,874,657.99
5	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO- HUANCVELICA-HUANCVELICA	HUANCVELICA	NUEVO OCCORO	OCCORO VIEJO	969,226.49
6	REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA	HUANCVELICA	CONAYCA CUENCA	CONAYCA CUENCA	1,850,131.86
7	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E . LOS ANGELES DE CCARAHUASA-ACORIA-HVCA	HUANCVELICA	ACORIA	CARAHUASA	1,923,812.88
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HVCA - HVCA.	HUANCVELICA	PILCHACA	PILCHACA	1,600,458.56
9	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	MANTACRA	3,671,475.07
10	SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	LIRIO	1,236,013.29
11	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPCANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	SAN JUAN DE HUIRPCANCHA	774,761.40
12	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANAL CHECCE, LANLANYA, DISTRITO SANTIAGO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CORDOVA	SANTIAGO DE CORDOVA	1,331,823.12
13	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E.Nº 22023 HUAYTARA- HUANCVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	2,108,069.16
14	RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E.SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	2,012,801.72
15	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)	HUAYTARA	CORDOVA, OCOYO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA.	VARIOS	2,671,466.92
16	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM	HUAYTARA	VARIOS	VARIOS	126,051.33
17	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SACHACOTO	1,534,042.39
18	CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	VISTA ALEGRE	1,191,117.69
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	CHIQUIAC	1,814,725.10
					33,089,244.11

OBRAS - CONTRATA

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCOCHATAY - AZAFRAN - SORAPATA - SAN MIGUEL - LIRCAYCCASA EN LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,936,160.63 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/.1,687,418.09 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 248,742.54 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO CONSTRUCTORA CyZ (Jose Samuel Carhuamaca Vasques), Contrato N° 603-2011/ORA (14/NOV/1011)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Henry Barrientos Quispe
- ❑ **Inicio de Obra**: 30/11/2011
- ❑ **Culminación**: 27/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 87.15% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminado, observaciones hechas por la comisión, lo cual se encuentra en proceso de levantamiento.
- ❑ **Metas**: Mejoramiento de la carretera 24.64 km, Impacto ambiental.



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y MAICENA DE LA MICRORED DE SECCLLA DE LA RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,648,134.64 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,374,455.86 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 273,678.78 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO NUEVO PERU, N° 0650-2011/ORA (14/DIC/2011)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Hernan Laurente Olaya Avilez
- ❑ **Inicio de Obra**: 29/12/2011
- ❑ **Culminación**: 20/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 83.39% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada, en proceso de levantamiento de observaciones hechas por la comisión de recepción
- ❑ **Metas**: Const. 02 Puestos de Salud, 02 Tanques sépticos, 2 Pozo percolador, Equipamiento medico.



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION MEJORAIENTO E MPLEMENTACION DE LA I.E. JESUS DE NAZARENO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA.



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,814,313.88
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 2,814,313.88 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: Consorcio VAUS
- ❑ **Supervisor**: CONSORCIO R&M Ing. Benny Richard Carrillo Balcazar
- ❑ **Inicio de Obra**: 02/02/2012
- ❑ **Culminación**: 17/08/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 0.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En verificación de levantamiento de observaciones planteadas por el comité de recepción, que fue venció el 02-11-2012.
- ❑ **Metas**: Const. 06 aulas, 01 sala de computo, 03 ambientes Administrativo, 02 SS.HH., 02 laboratorios, 02 depositos, 01 Biblioteca.



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LABORATORIOS SS.HH. AREAS ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E. JOSE SANTOS CHOCANO DE PALERMO - EL CARMEN - CHURCAMPANA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,874,657.99
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,874,536.83 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 121.16 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: EMPRESA CONSTRUCTORA GRA.P.H. S.R.L., 0048-2012/ORA (01/FEB/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Edgar Sabino Alarcon Huallpa
- ❑ **Inicio de Obra**: 23/02/2012
- ❑ **Culminación**: 01/10/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 99.99% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada, pendiente por pagar última valorización
- ❑ **Metas**: Constr. De 06 aulas, 01 aula innovadora, 01 laboratorio un depósito de materiales, SS. HH. Alumnos y Docentes, patio de usos múltiples cerco perimétrico y rehabilitación de dos módulos, equipamiento.



OBRAS - CONTRATAS

CHURCAMPANA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OCCORO VIEJO DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 969,226.49 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 969,226.49 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: AD&J INGENIEROS CONSULTORES SAC.
- ❑ **Supervisor**: Ing. Johny Bendezu Acero
- ❑ **Inicio de Obra**: 30/09/2011
- ❑ **Culminación**: 11/02/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Con resolución de liquidación del contrato de obra
- ❑ **Metas**: Const. tanque imhoft, instalación de tubería 4+838 km, 150 conexiones domiciliarias.



REHABILITACIÓN DE TROCHA CARROZABLE DISTRITO CONAYCA - CHAKICOCHA - CUENCA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,850,131.86 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,850,131.86 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO JEMA L.P. N° 011-2011, N°0602-2011/ORA
- ❑ **Supervisor**: Ing. Juan Manuel Hernandez Izaguirre
- ❑ **Inicio de Obra**: 25/11/2011
- ❑ **Culminación**: 08/08/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Con resolución de liquidación del contrato de obra
- ❑ **Metas**: Const. 06 Aulas, 03 SS.HH., 01 Patio Multiusos, Cerco perimétrico 296.5 ml, Rehabilitación de 04 ambientes, Equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E . LOS ANGELES DE CCARAHUASA-ACORIA-HVCA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,923,812.88 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,923,821.88 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO HUANCAVELICANOS ASOCIADOS, N°0646-2011/ORA
- ❑ **Supervisor**: Arq. Benigno Nino Soto Cabello
- ❑ **Inicio de Obra**: 29/12/2011
- ❑ **Culminación**: 25/06/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En proceso de liquidación del contrato de obra.
- ❑ **Metas**: Const. 06 aulas, 05 ambientes Adm., 01 Tanque séptico pozo percolador, 01 tanque cisterna y elevado, 01 losa multideportiva, cerco Perimétrico, SS.HH.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. ALFONSO UGARTE PILCHACA PROVINCIA DE HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,600,458.56 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,600,458.56 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. -0.01 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO ALFONSO UGARTE, N° 0027 - 2012 /ORA (17/ENE/2012)
- ❑ **Supervisor**: Arq. Alipio Edgar Miranda Romero
- ❑ **Inicio de Obra**: 02/02/2012
- ❑ **Culminación**: 30/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En proceso de liquidación del contrato de obra.
- ❑ **Metas**: Cont. 03 Aulas, 03 ambientes adm., 01 aula de computación, 04 ambientes varios, 03 ss.hh. Cerco perimétrico, Patio cívico y equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO TRAMO MANTACRA - JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 3,671,475.07 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 3,376,023.09 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 295,451.98 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SAN FRANCISCO
- ❑ **Supervisor**: Ing. Ruben Ramos Maguiña
- ❑ **Inicio de Obra**: 24/04/2012
- ❑ **Culminación**: 20/10/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 91.95% Presupuesta.
- ❑ **Situación Actual** : Conformación del comité para la recepción de obra.
- ❑ **Metas**: Construcción de puente de 42 Mts lineales con estructura metálica.



SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MIXTO JOSÉ SANTOS CHOCANO - LIRIO - ACORIA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,236,013.29 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,236,013.29 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO NUEVA ALIANZA, N° 0126 - 2012 /ORA (21/MAR/2012)
- ❑ **Supervisor**: CONSORCIO FENIX, Arq. David Balvin Denegrí
- ❑ **Inicio de Obra**: 17/04/2012
- ❑ **Culminación**: 13/09/2012
- ❑ **Avances**: **100.00%** Físico **100.00%** Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Recepcionada, en proceso de liquidación de ejecución de obra
- ❑ **Metas**: Const.05 aulas, 01 Laboratorio + Biblioteca, 01 Sala de computo, 02 Ss.Hh., 01 tanque séptico + pozo percolador, 01 tanque elevado + cisterna, Emobiliario, laboratorio y computo



OBRAS - CONTRATA

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.E. N° 22023 HUAYTARA- HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,108,069.16 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 2,108,069.16 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO ARKA I, CONTRATO N° 0668-2011/ORA
- ❑ **Supervisor**: Arq. Margot Salazar
- ❑ **Inicio de Obra**: 07/01/2012
- ❑ **Culminación**: 04/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra recepcionada y Liquidada.
- ❑ **Metas**: 14 Aulas, 01 Aula taller Textil
04 ambientes admin., 02 SS.HH.
Cerco Perimétrico L= 42. MI 385 Módulos escolares.
13 Módulos para persona docente
20 Equipos de comuto con su mobiliarios



OBRAS - CONTRATA

HUAYTARÁ

Trabajamos para todos

ORSYL

RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E.SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYTARA



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,012,801.72 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 2,012,801.72 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO ARKA I, N° 0645 - 2011/ORA
- ❑ **Supervisor**: Arq. Juan Valcárcel Dueñas
- ❑ **Inicio de Obra**: 29/12/2011
- ❑ **Culminación**: 20/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra recepcionada Liquidada.
- ❑ **Metas**: 11 Aulas, 07 Ambientes admin.,05 SS.HH. 180 Módulos escolares.10 Módulos para persona docente, 20 Equipos de computo con su mobiliarios.



OBRAS - CONTRATA

HUAYTARÁ

Trabajamos para todos

ORSYL

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CORDOVA - HUAMANI - AYAMARCA - LAMARI - SANTIAGO DE QUIRAHUARA (70+000 KM.)

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,671,466.65 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 2,665,742.82 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 5,723.83 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO MIFER, N° 031-2012/ORA (18-01-2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. José Arenales Granados
- ❑ **Inicio de Obra**: 03/02/2012
- ❑ **Culminación**: 22/06/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** :Obra recepcionada y Liquidada.
- ❑ **Metas**: Mejoramiento de la carretera en 73+500 km. Obras de arte varios.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, LONG 31+500 KM

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 126,051.33 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 126,051.33 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: IBEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES, N° 001 - 2012 / GGR (17/ ENE/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. William Paco Chipana (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 11/02/2012
- ❑ **Culminación**: 11/04/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra recepcionada y Liquidada.
- ❑ **Metas**: Mejoramiento de la carretera (Perfilado y compactado) en 31+500 km.



MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 31114 - SACHACOTO, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,534,042.39 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,509,817.39 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 24,221.69 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SURCUBMABA, N° 599-2011/ORA (10/nov/2011).
- ❑ **Supervisor**: Arq. Judith Pérez Cárdenas
- ❑ **Inicio de Obra**: 24/11/2011
- ❑ **Culminación**: 10/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 98.42% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra Recepcionada y liquidada
- ❑ **Metas**: Const. 06 aulas, 03 Ambientes Administrativos, SS.HH. 01 tanque séptico y pozo percolador, muro perimétrico, equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,191,117.69 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,191,117.69 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA, N° 606-2011/ORA. (16/NOV/2011)
- ❑ **Supervisor**: Consorcio VE&CU Consultores, Arq. Hilda M. Cuevas De La Cruz
- ❑ **Inicio de Obra**: 02/12/2011
- ❑ **Culminación**: 13/07/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra recepcionada y liquidada
- ❑ **Metas**: Const. 05 aulas , 01 centro de computo, 03 SS.HH, 03 ambientes administrativos, muro perimétrico y equipamiento.



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO TINYAC HUAYCO- CHIQUIAC, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,814,725.10 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,593,346.85 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 221,378.25 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SURCUBAMBA, N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)
- ❑ **Supervisor**: CONSORCIO SAN JUAN- Ing. Edwin Tunque Raymundo
- ❑ **Inicio de Obra**: 22/11/2011
- ❑ **Culminación**: 17/08/2012
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 87.80% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Culminado.
- ❑ **Metas**: Const. De 9,000 ml de línea de conducción, Riego a 40.37 Has.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA LIRCAY – DVO QUISPICANCHA – SECCLLA - JULCAMARCA, (LONG. = 70+000 Km)



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 342,603.89
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 342,603.89 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: Desarrollo de la Ingeniería los Audaces S.C.R.L
- ❑ **Supervisor**: Ing. William Paco Chipana (inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 13/10/2012
- ❑ **Culminación**: 15/11/2012
- ❑ **Avances**: 100.00 % Físico 1000.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Culminada en proceso de recepción de obra
- ❑ **Metas**: Perfilado y Compactado de la Sub Rasante en una Longitud de 70.00 Km..



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO CARRETERA PUCARA - LACHOCHICO (LACHOCCASA), (LONG. = 26.87 Km)



CULMINADA

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 143,445.19 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 143,445.19 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: L&S Constratsitas y Servicios Generales Multiples S.A.C
- ❑ **Supervisor**: Ing. William Paco Chipana (inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 12/10/2012
- ❑ **Culminación**: 31/10/2012
- ❑ **Avances**: 100.00 % Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Culminada en proceso de recepción de obra
- ❑ **Metas**: Perfilado y Compactado de la Sub Rasante en una Longitud de 26.87 Km.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

OBRAS EN EJECUCION

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBRAS EN EJECUCION AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	PAUCARÁ	CHOPCCAPAMPA	S/. 2,049,809.43
2	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	ANGARAES	LIRCAY	RUMICHACA	S/. 1,576,753.34
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORED SECCLLA, RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	CONGALLA	CONGALLA	S/. 990,774.34
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	VILLA DE ARMA	COTAS	S/. 876,066.14
5	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	CHUPAMARCA	S/. 922,642.44
6	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	MULTILOCAL	S/. 11,189,029.59
7	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC	CHURCAMP	COLCABAMBA MAYOCC	MULTILOCAL	S/. 14,962,729.72
8	RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA	HUANCVELICA	ACORIA	ACORIA	S/. 1,519,279.52
9	CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	AÑANCUSI	S/. 5,970,616.35
10	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	LAIMINA	S/. 1,356,687.00
11	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELIC	HUANCVELICA	ACORIA	ACORIA	S/. 5,677,917.97
12	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MANTA	SANTA ROSA	S/. 3,217,165.46
13	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- HUANCVELICA- HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	LLAHUECC	S/. 2,005,617.29
14	CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	AÑANCUSI	S/. 2,379,745.92
15	REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARILLA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA YAULI HVCA	MULTILOCAL	S/. 1,412,045.27
16	MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	MOYA	MOYA	S/. 1,744,900.22
17	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	CACHI LLALLAS	S/. 2,523,168.85
18	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANDO	LARIA	S/. 2,792,826.74
19	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	S/. 1,229,348.75
20	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA*	HUAYTARA	CORDOVA	MULTILOCAL	S/. 5,419,711.56
21	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA	TAYACAJA	MULTIDISTRITAL	SAN ISIDRO ROBLE	S/. 4,810,000.00
22	AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL - PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MULTILOCAL	S/. 1,029,743.35
23	MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDICATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	QUIMILLO	S/. 1,937,226.74
24	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDIVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	LLAMACANCHA	S/. 2,868,192.52
25	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	VARIOS	S/. 901,511.62

81,363,510.10

OBRAS - CONTRATA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOPCCAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,049,809.41 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,647,492.02 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 402,317.39 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO ANDINO (Renee De La Cruz Acevedo), N° 0531-2012/ORA-OL (15/AGO/2012).
- ❑ **Supervisor**: Ing. Renato C. Coronel Sánchez
- ❑ **Inicio de Obra**: 30/08/2012
- ❑ **Culminación**: 26/01/2013
- ❑ **Avances**: 80.37% Físico 80.37% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En ejecución Movimiento de tierra para reservorio
- ❑ **Metas**: Línea de Conducción de 4+040 km, Riego de 70 Has,



OBRAS - CONTRATA

ACOBAMBA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36423 EN EL CENTRO POBLADO DE RUMICHACA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCATELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,576,753.34 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,255,353.69 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 321,399.65 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO INGENIEROS, N° 003-2012/OR.A.
- ❑ **Supervisor**: CONSORCIO INGENIEROS Ing. Marino Peña Dueñas
- ❑ **Inicio de Obra**: 19/01/2012
- ❑ **Culminación**: 29/11/2012
- ❑ **Avances**: 77.61% Físico 95.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : en ejecución.
- ❑ **Metas**: Const. 3 ambientes Administrativos, 06 aulas, batería de SS.HH, patio de Honor, Losa Multideportiva, equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CONGALLA DE LA MICRORRED DE SECCLLA, RED ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HVCA.



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 990,774.34 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 990,774.33 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 0.01 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: Consorcio Congalla, N° 0485-2012/ORA-OL
- ❑ **Supervisor**: Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana
- ❑ **Inicio de Obra**: 07/08/2012
- ❑ **Culminación**: 04/12/2012
- ❑ **Avances**: 71.91% Físico 100.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En ejecución.
- ❑ **Metas**: 01 Modulo de salud, 01 Tanque séptico y pozo percolador, 01 Tanque elevado, Equipamiento Medico.



OBRAS - CONTRATA

ANGARAES

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD I-1 COTAS DE LA MICRORED HUACHOS DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : 876,066.14
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 107,244.23 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 768,821.91 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO COTAS, 0664-2012/ ORA (19/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Arq. Vicente A. Cipriano Zacarias
- ❑ **Inicio de Obra**: 01/11/2012
- ❑ **Culminación**: 30/03/2012
- ❑ **Avances**: 12.24% Físico 12.24% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Construcción de tanque séptico y pozo percolador, construcción de tanque elevado de agua, construcción de cerco perimétrico, construcción de obras exteriores, fortalecimiento de programa de capacitación, equipamiento, mitigación ambiental, flete terrestre



OBRAS - CONTRATA

CASTROVIRREYNA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHUPAMARCA DE LA MICRORED TANTARA DE LA RED CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 922,642.44 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 147,721.01 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 774,921.43 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO MARCA, 0663-2012/ ORA (18/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Arq. Vicente A. Cipriano Zacarias (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 01/11/2012
- ❑ **Culminación**: 30/03/2013
- ❑ **Avances**: 16.01% Físico 16.01% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución
- ❑ **Metas**: Construcción de tanque séptico y pozo percolador, construcción de tanque elevado de agua, construcción de cerco perimétrico, construcción de obras exteriores, fortalecimiento de programa de capacitación , equipamiento, mitigación ambiental, flete terrestre.



OBRAS - CONTRATA

CASTROVIRREYNA

Trabajamos para todos

ORSYL

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPÁ - MAYOCC TRAMO II DV COLCABAMBA - DV COBRIZA

EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 11,189,029.59 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 6,546,919.51 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 4,642,110.08 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO LIBERTADORES
- ❑ **Supervisor**: Ing. William Paco Chipana (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 20/09/2012
- ❑ **Culminación**: 17/05/2013
- ❑ **Avances**: 48.14% Físico 58.51% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Rehabilitación y Mejoramiento de 65.28 km.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA - CHURCAMPÁ - MAYOCC TRAMO III DV COBRIZA - MAYOCC

EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 14,962,729.72
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 5,020,252.66 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 9,942,477.06 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSTRUCTORA M.P.M. S.A,
005-2012/GGR (22/AGO/2012)
- ❑ **Supervisor**: ACI PROYECTOS S.A. Ing. Alberto Vargas
Gil
- ❑ **Inicio de Obra**: 12/09/2012
- ❑ **Culminación**: 10/03/2013
- ❑ **Avances**: 16.94% Físico 33.55% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución, construcción
de pontones y alcantarillas TMC.
- ❑ **Metas**: Rehabilitación y Mejoramiento de 49.85 km.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

DV. COLCABAMBA

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PAMPAS DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO II: Dv. COLCABAMBA DV. COBRIZA

META : 65.28 KM
INVERSIÓN : S/. 11'189,029.59

DV. COBRIZA

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PAMPAS DV. COLCABAMBA - CHURCAMP - MAYOCC TRAMO III: Dv. COBRIZA MAYOCC

META : 49.85 KM
INVERSIÓN : S/. 14'962,729.72

CHURCAMP

MAYOCC



RECONSTRUCCION PUENTE COLONIAL SEÑOR DE ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HVCA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,519,279.52 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,220,411.15 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 298,868.37 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SAN GABRIEL, N° 0022-2012/ORA (16-01-2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Eduardo Canchari Carbajal (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 06/03/2012
- ❑ **Culminación**: 27/11/2012
- ❑ **Avances**: 53.89% Físico 80.33% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en Ejecución.
- ❑ **Metas**: Construcción de un puente



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION PUENTE CCOTA AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HVCA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 5'970,616.35 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 4,893,983.98 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 1,076,632.37 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SAN FELIPE, N° 0055-2012/ORA (16-02-2012)
- ❑ **Supervisor**: Consorcio San Felipe
- ❑ **Inicio de Obra**: 03/03/2012
- ❑ **Culminación**: 13/12/2012
- ❑ **Avances**: 80.70% Físico 92.27% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: 01 puente tipo Warren Biro 60 m Luz, trocha carrozable 1,302 metros.



OBRAS - CONTRATA

HUANCVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO LAIMINA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,356,687.00 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,102,735.65 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 253,951.35 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SANTA BARBARA, N° 0388 - 2012 /ORA-OL (11/JUN/2012)
- ❑ **Supervisor**: 2 Ing. Eduardo Canchari Carbajal (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 26/06/2012
- ❑ **Culminación**: 22/11/2012
- ❑ **Avances**: 91.47% Físico 94.44% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Const. Red colectora 4+754 km, 240 Conexiones domiciliarias.



OBRAS - CONTRATA

HUANCVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO ICHU ACORIA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCATELICA - HUANCATELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,003,711.21 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 672,082.11 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 331,629.10 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO ACORIA, N° N° 0120 - 2012 /ORA (02/ABR/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Pablo A. Valero Chicana
- ❑ **Inicio de Obra**: 19/10/2012
- ❑ **Culminación**: 16/04/2013
- ❑ **Avances**: 55.39% Físico 55.39% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Muro de defensa ribereña 1,485 ml



OBRAS - CONTRATA

HUANCATELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE SANTA ROSA LAMBRASHUACHINCCA DISTRITO DE MANTA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 3,116,693.51 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,229,901.44 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 1,886,792.07 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO GOLDEN FOX DEL PERU, N° 0661 - 2012 /ORA (19/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Rodriguez Huachua Yartuhim Paolo
- ❑ **Inicio de Obra**: 05/11/2012
- ❑ **Culminación**: 03/05/2013
- ❑ **Avances**: 22.82% Físico 39.46% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En ejecución
- ❑ **Metas**: Cont. Trocha carrozable 9+662 km y 31 obras de arte varios.



OBRAS - CONTRATA

HUANCVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE L=5.460 KM, MOTOYPATA AL C.P. LLAHUECC, DISTRITO DE ACORIA- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,005,617.29 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,431,640.38 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 573,976.91 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO NAZARENO, N° 0618-2012 /ORA (26/SET/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Genri Barrientos Quispe,
- ❑ **Inicio de Obra**: 12/10/2012
- ❑ **Culminación**: 08/02/2013
- ❑ **Avances**: 70.85% Físico 71.38% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Construcción De trocha de 5.46km, 01 badén 16 alcantarillas 01 pontón, muros de mampostería de piedra.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCIÓN CARRETERA AÑANCUSI - CCOTA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,379,745.92 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,080,114.79 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 1,299,631.13 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO PUCARUMI, N° 0658-2012 /ORA (11/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Eduardo Canchari Ca
- ❑ **Inicio de Obra**: 25/10/2012
- ❑ **Culminación**: 23/03/2013
- ❑ **Avances**: 45.19% Físico 45.39% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: 01 puente tipo Warren Biro 60 m Luz, trocha carrozable 1,302 metros.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

REHABILITACION CAMINO VECINAL, REPARTICION CCARAHUASA - VISTA ALEGRE - UCHCUS - CHACARAILIA Y ACCESO DE SACHAPITE, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,412,045.27 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 448,719.85 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 963,325.42 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SACHAPITE, N° 0632-2012 /ORA (09/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Angel Choque Contreras
- ❑ **Inicio de Obra**: 23/10/2012
- ❑ **Culminación**: 21/03/2013
- ❑ **Avances**: 30.56% Físico 31.78% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Perfilado, escarificado y compactado de sub rasante, afirmado de 18.981km, y obras de Arte.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO VIAL AV. PROGRESO TRAMO PNP MOYA - JR. SALAVERRY, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,744,900.22 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 892,256.14 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 852,644.08 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO OBRAS VIALES, N° 0633-2012 /ORA (01/OCT/2012)
- ❑ **Supervisor**: Consorcio Moya Ing. Jorge Maita Hinoztroza
- ❑ **Inicio de Obra**: 16/10/2012
- ❑ **Culminación**: 14/03/2013
- ❑ **Avances**: 51.14% Físico 51.14% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Pavimentación Rígida 329.66ml, saneamiento de agua y desagüe 1,00854ml, Const. Vereda 784.88 m2, Muro de Contención 196.20ml, cunetas y señalización.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,523,168.85 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 2,523,168.85 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO CASA BLANCA,
- ❑ **Supervisor**: Ing. Eduardo Canchari Carbajal (Inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 07/12/2012
- ❑ **Culminación**: 03/08/2013
- ❑ **Avances**: 0.00% Físico 0.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra iniciada, en ejecución
- ❑ **Metas**: Const. De 06 Aulas, 02 Losas deportivas, Cerco perimétrico y dotación de equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAVELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N° 36048 DEL, DISTRITO DE LARIA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,792,826.74 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 2,792,826.74 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO R&C.
- ❑ **Supervisor**: Consorcio Orión
- ❑ **Inicio de Obra**: 08/12/2012
- ❑ **Culminación**: 04/08/2013
- ❑ **Avances**: 0.00% Físico 0.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra iniciada en ejecución.
- ❑ **Metas**: Const. 06 Aulas pedagógicas, 04 ambientes administrativos, cerco perimétrico, losa deportiva, Tanque séptico y pozo percolador, equipamiento de sala de computo y mobiliario.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,229,348.75 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 1,229,348.75 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO EL INSTITUTO
- ❑ **Supervisor**: Arq. Vicente Angel Cipriano
- ❑ **Inicio de Obra**: 12/07/2011
- ❑ **Culminación**: 07/01/2012
- ❑ **Avances**: 0.00% Físico 0.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En ejecución.



OBRAS - CONTRATA

HUANCAMELICA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE APACA - HUACHOJAICO - LAS MERCEDES - TIMPOCCPUQUIO Y CALLANCA A NIVEL DE AFIRMADO Y OBRAS DE ARTE DEL DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 5,419,711.56 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 3,452,157.74 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 1,967,553.82 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO CORDOVA, N° 518-2012/ORAO-OL (10/ 08/2012)
- ❑ **Supervisor**: Consorcio Cordova, Ing. Santos Feliciano Ascencion Flores
- ❑ **Inicio de Obra**: 23/08/2012
- ❑ **Culminación**: 20/04/2013
- ❑ **Avances**: 63.70% Físico 63.70% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Const. 20+580 km de carretera, 18 alcantarillas, 28 badenes, 01 puente 14.60 ml luz.



OBRAS - CONTRATA

HUAYTARÁ

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA

EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 4,810,000.00 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 4,206,215.71 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 603,784.29 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO SAN ISIDRO
- ❑ **Supervisor**: Ing. Eduardo Donaires Castillo
- ❑ **Inicio de Obra**: 10/09/2011
- ❑ **Culminación**: 22/10/2012
- ❑ **Avances**: 97.53% Físico 97.53% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : En ejecución.
- ❑ **Metas**: Apertura de trocha carrozable de 33.08 Km.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

AMPLIACION, MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO COLCABAMBA - SAN CRISTOBAL PUTACCA - RUMISUNTO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -HUANCAVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 841,789.07 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 841,789.07 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO CORONA, N° 0707-2012/ORA (09/NOV/2012)
- ❑ **Supervisor**: Ing. Carlos Canto Quispe (inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 23/11/2012
- ❑ **Culminación**: 22/03/2013
- ❑ **Avances**: 0.00% Físico 0.00% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : obra iniciada en Ejecución
- ❑ **Metas**: Construcción de trocha carrozable de 15+580 Km., Alcantarilla 41 Unidades, Señalizaciones y varios.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO Y QUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MACISTE DIAS ABAD DEL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 1,937,226.74 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 1,823,253.54 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 113,973.19 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO OVERALL STRATEGY SAC., N° 532-2011/ORA (05-10-2012)
- ❑ **Supervisor**: Arq. Isela Victoria Requena Medina
- ❑ **Inicio de Obra**: 21/10/2011
- ❑ **Culminación**: 15/09/2012
- ❑ **Avances**: 70.48% Físico 92.12% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Paralizado, proceso de resolución de contrato por incumplimiento contractual.
- ❑ **Metas**: Const. 05 aulas, 06 ambientes administrativos, 1 sala de computo, cerco perimétrico, losa deportiva, 2 módulos de SSHH, Equipamiento.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LLAMACANCHA, SAN JUAN DE PALTARUMI, DOS DE MAYO Y RUNDOVILCA, DE LA MICRORED PAMPAS, RED TAYACAJA-HUANCAVELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 2,868,192.52 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 2,633,638.44 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 234,558.08 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: CONSORCIO PERU, N° 616-2011/ORA (21/NOV/2011)
- ❑ **Supervisor**: Consorcio dos de mayo, Ing. Francisco Cyl Godiño Poma
- ❑ **Inicio de Obra**: 16/06/2012
- ❑ **Culminación**: 12/11/2012
- ❑ **Avances**: 72.50% Físico 91.82% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución.
- ❑ **Metas**: Const. 04 modulo de salud, 04 módulos de viviendas medianas, 04 tanques elevado y cisterna, 04 tanque sépticos y poza de percolación, cerco perimétrico, equipamiento medico.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VIOLETAS DE ACCOYANCA - AYAIPAMPA C.P.M DE VIOLETAS DE ACCOYANCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA



EN EJECUCION

- ❑ **Monto de Contrato** : S/. 901,511.62 Nuevos Soles
- ❑ **Pago a la fecha** : S/. 0.00 Nuevos Soles
- ❑ **Saldo**: S/. 901,511.62 Nuevos Soles
- ❑ **Empresa ejecutora**: ORE INGENIEROS SRL
- ❑ **Supervisor**: Ing. Carlos Canto Quispe (inspector)
- ❑ **Inicio de Obra**: 05/12/2012
- ❑ **Culminación**: 03/04/2013
- ❑ **Avances**: **0.00%** Físico **0.00%** Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra en ejecución, recién iniciada.
- ❑ **Metas**: Construcción de 8+460, km Nivel afirmado, 23 Alcantarillas Muro sostenimiento, señalización y varios.



OBRAS - CONTRATA

TAYACAJA

Trabajamos para todos

ORSYL

OBRAS PARA INICIAR I SEMESTRE 2013

PROYECTOS PARA INICIAR EL I SEMESTRE 2013

Nº	NOMBRE DE PROYECTOS	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	CREACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36049 DE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MARISCAL CACERES	MARISCAL CACERES	1.478.997,42
2	INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO SAN PEDRO EN EL ANEXO DE SAN PEDRO - CHOPCCA DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	CHOPCCA	410.591,52
3	INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL RIO LIBERTADORES EN EL CP DE LIBERTADORES - CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	LIBERTADORES	420.547,01
4	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SEVICIO EDUCATIVO DE LA I.E JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE LA LOCALIDAD HUAYANAY, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	ANTA	HUAYANAY	2.603.258,31
5	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE CHANCAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROV.	CHUPAMARCA	CHANCAHUASI	2.090.015,44
6	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22621 DE TASTACANCHA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	TASTACANCHA	173.115,95
7	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22572 DE CAVITUNA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	CAVITUNA	173.594,89
8	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 22165 SAN MIGUEL DE CURIS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	CURIS	308.778,39
9	CONSTRUCCION DE LA I.E. Nº 259 SACSQUERO	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SACSQUERO	303.338,83
10	INSTALACION DEL PUENTE CUCHARAN, DISTRITO ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HVCA.	ACORIA	QUICHUAS	2.375.933,84
11	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. 22151 CAPILLAS SUR	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	CAPILLAS SUR	462.481,39
12	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA (KM 50.50 L.DPTAL ICA)-TAMBILLO-CHAULISMA AYAVI-SANTA ROSA DE TAMBO LONG=52+500KM Y TRAMO II: SANGAYAICO-SANTIAGO DE CHOCORVOS-OTUTO-ANDAYMARCA- TINGO (LIMITE DPTAL ICA LONG=74+18) (126.68KM)	HUAYTARA	VARIOS	MULTILOCAL	4.737.287,74
13	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (ACOSTAMBO)-PAMPACORRAL-ACRAQUIA-AHUAYCHA-EMP.PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM.LONG	TAYACAJA	PAMPAS	MULTILOCAL	1.709.822,42
14	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : EMP. PE-26B (Lircay)- ANCHONGA-HUAYANAY-EMP. HV-105 (DV. Huayanay)-EMP. HV-105 (45+785 KM.)	HVCA.	HUAYANAY - LIRCAY	MULTILOCAL	2.246.646,19
15	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA I.d. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) WARI-TRANCAPAMPA-YANANYA- SAN ISIDRO ACOBAMBA-MATIBAMBA-EMP. HV-101(NUEVA ESPERANZA)-SAN ANTONIO- CHIQUIAC (72.00 KM)	TAYACAJA	SALCAHUASI, SAN MARCOS DE ROCCHAC	MULTILOCAL	2.319.585,03
16	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP.PE 26B (REPARTICION HUAPA) - TUCSIPAMPA - SUCCAMARCA - CARHUAPATA - EMP.PE - 28A - (JATUNCORRAL) KM 69+080	ANGARAES	LIRCAY	MULTILOCAL	3.040.192,56
17	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)- RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASI-LD JUNIN (CHAUCALLE JU.-110 A TURPO) 133.27 KM LONG	HVCA	VARIOS	MULTILOCAL	4.737.452,62
18	MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINO DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 3SD (DV. JABONILLO - HUANCAYOJASA - COLCABAMBA - TOCAS - CALLQUI - EMP - 3SD (MILLPO) LONG. 57+590	TAYACAJA	COLCABAMBA	MULTILOCAL	1.991.945,62
19	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE-28(Dv. Sinto)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-CISICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (Dv. HUAYACUNDO ARMA) (58+090)	CASTROV.	CASTROVIRREYNA, CUSICANCHA, HUAYACUNDO ARMA Y HUAYTARA	MULTILOCAL	2.057.772,72
20	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE - 26B LIRCAY - HUAYLLAY GRANDE - CALLANMARCA - HUANCAMARCA - CONGALLA - SECCLLA (95 + 570 KM)	ANGARAES	LIRCAY	MULTILOCAL	3.747.350,72
21	MANTENIMIENTO PERIODICO DE 27.42 KM DEL CORREDOR VIAL EMPALME PE - 26 (HUANCAMELICA) - CALLQUI - DV. SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EP. HV - 110 (VIÑAS) (49 + 170 KM)	HVCA	HUANCAMELICA	MULTILOCAL	2.138.847,80
22	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA DV. PE - 26 YAULI AMBATO - PUCAPAMPA (EMP. HV - 113) (24 + 00 KM)	HVCA	HUANCAMELICA	MULTILOCAL	1.057.828,26
23	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA LA CALZADA - PUCA CRUZ - ACOBAMBA (LONG. =27 + 870)	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MULTILOCAL	918.251,04
24	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S MARISCAL CACERES (LA MEJORADA) - CARPAS - CARRHUARANGA - PALMIRA ALTA	HVCA	VARIOS	MULTILOCAL	1.713.646,36
25	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	ERAPATA	1.314.493,54

PROYECTOS -- AD Y CONTRATA

26	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	UNION AMBO	1.350.909,49
27	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	YAÑACC	954.658,39
28	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	VARIOS	MULTILOCAL	9.983.511,91
29	MEJORAMIENTO HIDRICO DE LA MICROCUENCA QUIROPALCA DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	QUIROPALCA	1.813.600,00
30	FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	1.253.831,00
31	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	ARMAHUAYCCO	1.000.000,00
32	INSTALACION DE LA REPRESA TAMBO REAL EN LA LOCALIDAD DE AYAVI, DISTRITO DE AYAVI - HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	AYAVI	AYAVI	3.547.945,00
33	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	4.490.684,00
34	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE MEJORADA-SAN JOSE DE LLACTACHA DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	SANTA ROSA DE MEJORADA	1.524.380,00
35	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHACLLACOCCHA DEL DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LARIA	LARIA	3.441.032,00
36	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE CACRILLO - ARMA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CACRILLO	ARMA	106.888,00
37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUINCHULLAY- ARMA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	ARMA	HUINCHULLAY	131.357,00
38	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAÑUILLA Y ANTAMARCA - ARMA - CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	ARMA	SAÑUILLA - ANTAMARCA	96.969,00
39	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE TUCSIPAMPA, CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY- ANGARAES	ANGARAES	LIRCAY	CARHUAPATA	1.145.836,00
40	CONSTRUCCION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36571 DE ÑAHUINCUCO - HUANDO-HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ÑAHUINCUCO	HUANDO	281.628,00
41	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 36322 LLALLAS ALTA - HUANDO - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	LLALLAS ALTA	HUANDO	813.295,00
42	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ	HUANCAMELICA		MULTILOCAL	3.625.953,00
43	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 306 DE CCORISOTOCC-MANTA-HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	MANTA	CCORISOTOCC	360.348,00
44	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENCION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ASCENCION	ASCENCION	8.664.924,00
45	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO DE CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUACHOCOLPA	CORRALPAMPA	964.398,00
46	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	HUAYTARA	827.882,00
47	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	IZCUCHACA	IZCUCHACA	1.719.822,00
48	CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL CCARAHUSA ALTA	HUANCAMELICA	ACORIA	CCARAHUSA ALTA	276.500,00
49	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	1.667.719,00
50	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO 533 -ANGELES DE CCARAHUSA BAJA	HUANCAMELICA	ACORIA	ANGELES DE CCARAHUSA	530.509,00
51	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA - ATALLA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	PUCARA	2.146.303,00
52	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, COLLAPACCASA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	COLLAPACCASA	1.459.618,00

53	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	VILLAPAMPA	1.722.260,00
54	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	CHACARILLA	2.909.400,00
55	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	CASTILLAPATA	2.476.134,00
56	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL N° 35001 DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL, DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA Y REGION HUANCAMELICA.	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	SANTA ANA	2.053.264,00
57	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 36340 DEL CENTRO POBLADO ALTO ANDINO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ACORIA	ALTO ANDINO	662.715,00
58	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	HUANCAMELICA	ACORIA	SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	588.851,00
59	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACLLA - YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	YAULI	PACHACLLA	745.959,00
60	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 269 - ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DIST. DE ASCENSION, PROV. Y DPTO. DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	ASCENSION	ASCENSION	340.538,00
61	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. PACOMARCA, DISTRITO DE PACOMARCA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	PACOMARCA	PACOMARCA	288.882,00
62	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAMELICA	HUAYTARA	TAMBO	TAMBO	1.349.119,00
63	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANDO	CUYAO	1.038.714,00
64	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36019 DE MUQUECC BAJO - DISTRITO DE ACORIA	HUANCAMELICA	ACORIA	MUQUECC BAJO	1.143.572,00
65	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	ACOBAMBA	SAN MARCOS DE ROCCHAC	SAN ISIDRO	4.172.769,00
66	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCovilca, MICRO RED DE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	MULTILOCAL	9.509.137,00
67	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	1.405.196,00
68	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	PAMPAS	PAMPAS	4.648.329,00
69	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	8.253.840,00
70	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	5.369.094,00
71	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORIA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	PAMPACHACRA	765.148,00
72	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCAS-CHIVINCURI, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS	CHIVINCURI	1.972.204,00
					150.127.401,40

RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA AÑO - 2012



OBRAS - AD Y CONTRATA

MODALIDAD	CANT.	ESTADO	PRESUPUESTO
ADMINISTRACION DIRECTA	23	CULMINADA	S/. 31.005.822,01
	24	EN EJECUCION	S/. 102.193.564,05
CONTRATA	19	CULMINADA	S/. 33.089.244,11
	25	EN EJECUCION	S/. 81.363.510,10
TOTAL	91	EJECUCION AÑO 2012	S/. 247.652.140,27
PROYECTOS AD Y CONTRATA	72	PARA INICIAR I SEMESTRE 2013	S/. 150.127.401,40
TOTAL GENERAL	163		S/. 397.779.541,67

19 PROYECTOS POR TRANSFERENCIA

OBRAS FORSUR - EDUCACION

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

HUAYTARA

Trabajamos para todos

ORSYL

OBRAS - CONTRATA

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	PROVINCIA	DISTRITO	ESTADO FISICO	ESTADO FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	RECONSTRUCCIÓN CEPTRON Nº 34023 DE CÓRDOVA	180,100.16	HUAYTARÁ	CÓRDOVA	100.00%	100.00%	CULMINADO
2	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22173 DE APACA - CORDOVA	199,997.24	HUAYTARÁ	CÓRDOVA	100.00%	100.00%	CULMINADO
3	SUSTITUCION DE LA INFRAESTR. EN LA I.E.P.M Nº 22194 - SAN ISIDRO DE TARACACHI	210,913.14	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
4	SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.I. Nº 268 PACOMARCA	347,915.80	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
5	SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M Nº 22195 DE VICHURI	206,597.89	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
6	SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M Nº 36555 SAN JUAN DE PACOMARCA	359,944.43	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
7	SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M Nº 22193 SANTA ROSA DE PACOMARCA	346,842.77	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
8	SUSTITUCION DE LA INFRAEST. EN LA I.E.P.M Nº 22653 SANTA CRUZ DE PACOMARCA	211,737.45	HUAYTARÁ	OCOYO	100.00%	100.00%	CULMINADO
9	RECONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS EN LA I. E. Nº 22159 - QUERCO	418,177.49	HUAYTARÁ	QUERCO	100.00%	100.00%	CULMINADO
10	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22647 - PAMPAHUILLCA - QUERCO	128,450.77	HUAYTARÁ	QUERCO	100.00%	100.00%	CULMINADO
11	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22025 DE QUINCHIHUA	117,043.82	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	100.00%	100.00%	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
12	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22609 SANTA ROSA	115,243.70	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	100.00%	100.00%	CULMINADO
13	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22624 CCOLLCCAPAMPA	122,712.66	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	100.00%	100.00%	CULMINADO
14	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ELEODORO BELLIDO BRAVO DE QUITO ARMA	495,395.04	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	100.00%	100.00%	CULMINADO
15	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 218 QUITO ARMA	117,043.33	HUAYTARÁ	QUITO ARMA	100.00%	100.00%	CULMINADO
16	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22087 DE SACSQUERO	566,397.51	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
17	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22085 PAMPAQUOIO	371,073.64	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
18	CONSTRUCCION DE LA INSITITUCION EDUCATIVA Nº 36540 HUAYLLAHUAQUI	185,112.09	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
19	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 220 CUSICANCHA	120,594.19	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
20	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 22061 PAMPACHACRA	116,676.76	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
21	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 36539 MINASCCASA	182,745.18	HUAYTARÁ	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	100.00%	100.00%	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
22	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22168 ACORA	332,657.58	HUAYTARÁ	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	100.00%	100.00%	CULMINADO
23	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22222 RURUPA	196,838.25	HUAYTARÁ	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	100.00%	100.00%	CULMINADO
24	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22204 LUCMAYOCC	194,692.37	HUAYTARÁ	SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
25	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22493 AYAVI	184,315.90	HUAYTARÁ	SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
26	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22167 TAMBO CRUZ	195,218.42	HUAYTARÁ	SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
27	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22220 YERBAUENAYOCC	196,410.05	HUAYTARÁ	SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	100.00%	100.00%	CULMINADO
28	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN AL I.E. ANDRÉS A. CÁCERES DE ANDAYMARCA	486,432.83	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
29	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22162 DE ANDAYMARCA	313,048.16	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
30	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 22203 DE SANTA ROSA DE MEJORADA	326,237.11	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
31	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E. Nº 22215 VILLA ALTA DE HUANAS	317,049.43	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
32	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 22207 PALMACANCHA	322,443.02	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
33	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 36547 OBRAJE - SANTIAGO DE CHOCORVOS	342,900.69	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
34	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 22206 MACHO CRUZ	198,493.19	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
35	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. Nº 22217 YANACOLPA	326,924.56	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
36	RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA I.E.INICIAL Nº 373 SAN MIGUEL DE CURIS	190,351.29	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
37	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22650 DE MOLLEPATA	112,578.56	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
38	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22201 DE CHALLACA	188,844.98	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE CHOCORVOS	100.00%	100.00%	CULMINADO
39	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22563 SAN BARTOLOMÉ	184,919.60	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
40	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 22589 CCANCCAIRO	209,373.50	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
41	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I. E. Nº 36649 VILLA SALVADOR - QUIRAHUARA	190,823.05	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
42	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 357 SANTIAGO DE QUIRAHUARA	128,014.56	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
43	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 36550 LAMARI - QUIRAHUARA	100,227.29	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
44	RECONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. Nº 22652 SANTA TERESA DE MOLINOS	105,775.38	HUAYTARÁ	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	100.00%	100.00%	CULMINADO
TOTALES		10,465,284.83					



LISTA DE OBRAS FORSUR

Trabajamos para todos



44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION HUAYTARA



I.E. SAN JUAN DE PACOMARCA



I.E. SAN BARTOLOMÉ



I.E. VILLA SALVADOR



I.E. SAN ISIDRO DE TARACACHI

OBRAS - CONTRATATA

HUAYTARA

Trabajamos para todos

ORSYL

44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION HUAYTARA



I.E. CENTRO CORDOVA



I.E. STA. TERESA MOLINOS



I.E. QUIRAHUARA



I.E. LAMARI

OBRAS - CONTRATATA

HUAYTARA

Trabajamos para todos

ORSYL

44 OBRAS DE FORSUR – SECTOR EDUCACION HUAYTARA



I.E. STA. ROSA DE PACOMARCA



I.E. STA. CRUZ DE PACOMARCA



I.E. VICHURI



I.E. APACA

OBRAS - CONTRATAS

HUAYTARA

Trabajamos para todos

ORSYL

44 OBRAS DE FORSUR - EDUCACION EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA



OBRAS - CONTRATATA



I.E. 22493 - AYAVI



I.E. 22222 - RURUPA



I.E. 22162 DE ANDAYMARCA



I.E. 22087 - SACSAQUERO



I.E. 36539 - MINASCCASA



I.E. 22159 - QUERCO

HUAYTARA

Trabajamos para todos

ORSYL

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

LOGROS Y AVANCES

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO PARA ELAB. DE EXP. TEC	SITUACION ACTUAL
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	SANTA ANA	252,168.00	CULMINADO EN EVALUACION
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCovilca, MICRO RED DE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	ACOBAMBA	MULTILOCAL	MULTILOCAL	250,000.00	CULMINADO EN EVALUACION
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LAS LOCALIDADES DE HUANCVELICA, ASCENSION Y PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTILOCAL	230,460.00	APROBADO
4	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUNYACC - PUCAPAMPA - CHECCOCRUZ. (YAULI Y PAUCARÁ)	ACOBAMBA	MULTILOCAL	MULTILOCAL	151,078.00	APROBADO
5	INSTALACION DE PUENTE CUCHARAN, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	ACORIA	92,042.00	APROBADO
6	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	58,425.00	CULMINADO EN EVALUACION
7	FORTELECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	58,000.00	APROBADO
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA CULTURA Y EL ARTE EN LA CIUDAD DE HUANCVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	HUANCVELICA	57,258.00	CULMINADO EN EVALUACION
9	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COCAS-CHIVINCURI, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	COCAS - TICRAPO	CHIVINCURI	45,835.00	APROBADO
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	MULTILOCAL	45,375.00	CULMINADO EN EVALUACION
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 36340 DEL CENTRO POBLADO ALTO ANDINO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	ALTO ANDINO	25,445.00	EN FORMULACION
12	CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL CCAHUASA ALTA,	HUANCVELICA	ACORIA	ANGELES DE CCAHUASA	23,500.00	CULMINADO EN EVALUACION
13	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. NO. 36322 LLALLAS ALTA - HUANDO - HVCA.	HUANCVELICA	HUANDO	LLALLAS	22,181.00	APROBADO
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE MOYOCANCHA DE LA COMUNIDAD DE MATIPACANA - DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	MOYOCANCHA	15,000.00	CULMINADO EN EVALUACION
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO SAN VIDAL, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA DE HUANCVELICA - HVCA	HUANCVELICA	CUENCA	SAN VIDAL	10,000.00	CULMINADO EN EVALUACION
16	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCVELICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	CCASAPATA	8,069.00	APROBADO
					1,344,836.00	

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA D.S. 142 Y 169 - 2012 EF




Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO PARA ELAB. DE EXP. TEC	SITUACION ACTUAL
1	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCACHA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	MULTI	MULTILOCAL	260,534.00	APROBADO
2	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 31298 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DE QUICLLO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA	CHURCAMP	ANCO	QUICLLO	35,000.00	APROBADO
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 718 DEL CENTRO POBLADO DE ERAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	YAULI	CENTRO POBLADO DE ERAPATA	15,748.00	APROBADO
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 736 DEL CENTRO POBLADO DE YANAOCO - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE YANAOCO	18,000.00	APROBADO
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 731 DEL CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE	14,850.00	APROBADO
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE UNION AMBO	15,000.00	APROBADO
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 825 DEL CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE TRES ESTRELLAS	15,251.00	APROBADO
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 734 DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE	13,308.00	APROBADO
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 828 DEL CENTRO POBLADO DE YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE YAÑACC	15,000.00	APROBADO
10	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 729 DEL CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ACORIA	CENTRO POBLADO DE CCOSNIPUQUIO	14,214.00	APROBADO
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 138 DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	HUANCVELICA	ASCENSION	ASCENSION	14,336.00	APROBADO
					431,241.00	

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES POR CONSULTORIA AÑO - 2012




Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO PARA ELAB. DE EXP. TEC	SITUACION ACTUAL
1	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	702,755.00	EN FORMULACION
2	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	666,450.00	EN FORMULACION
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	285,600.00	EN EVALUACIÓN
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DE PAMPAS	TAYACAJA	TAYACAJA	PAMPAS	235,227.00	EN EVALUACIÓN
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SAN CRISTOBAL	142,542.00	EN FORMULACION
6	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MULTI	97,645.00	APROBADO
7	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CHACARILLA	81,391.00	EN FORMULACION
8	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRES TRAMOS: CHUCLLACCASA - PUYHUAN, CHACMACCASA, DESVIO CCARHUACC LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CHUCLLACCASA, CCARHUACC, LIMAPAMPA, CHACMACCASA	70,665.00	EN FORMULACION
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	66,834.00	EN EVALUACIÓN
10	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, PUCARA - ATALLA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	PUCARA - ATALLA	61,806.00	APROBADO
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	SAN MARCOS DE ROCHACC	SAN ISIDRO DE ACOBAMBA	60,000.00	EN EVALUACIÓN
12	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ANGARAES -REGION HUANCAVELICA	ANGARAES	ANGARAES	MULTI	54,629.00	APROBADO
13	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36538, VILLAPAMPA, YAULI, HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	VILLAPAMPA	52,017.00	EN EVALUACIÓN
14	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA -REGION HUANCAVELICA	CHURCAMPAMPA	CHURCAMPAMPA	MULTI	48,965.00	APROBADO
15	INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNIDADES MOVILES CON SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA - REGION HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	MULTI	48,265.00	APROBADO
16	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36330, CCOLLAPACCASA, YAULI, HUANCAVELICA.	HUANCAVELICA	YAULI	CCOLLAPACCASA	42,715.00	EN FORMULACION
17	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORIA I I DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PAMPACHACRA	40,000.00	EN FORMULACION
18	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACHAPATA DE LA MICRORED ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	VILLA REAL PACHAPATA	31,082.00	EN FORMULACION
19	IMPLEMENTACION FISICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 37001, UBICADO EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HVCA	30,000.00	EN FORMULACION
20	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°36019 DE MUQUECC BAJO - ACORIA	HUANCAVELICA	ACORIA	MUQUECC BAJO	28,942.00	EN EVALUACIÓN
21	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	PANTACHI NORTE - VILLA HUASAPAMPA	26,435.00	APROBADO
22	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 36443 DEL CENTRO POBLADO DE PACHACCLLA - YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CENTRO POBLADO DE PACHACCLLA	22,460.00	EN EVALUACIÓN
23	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N° 36788 - CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	CUYAO	22,129.00	EN EVALUACIÓN
24	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36571 DE ÑAHUINCUCO - HUANDO-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	ÑAHUINCUCO	20,000.00	EN EVALUACIÓN
25	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CONDORHUACHANA	17,968.00	EN FORMULACION
26	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36655 DE SAN ISIDRO DE AMPURHUAY	HUANCAVELICA	ACORIA	AMPURHUAY	14,903.00	EN FORMULACION
27	MEJORAMIENTO DE MINI REPRESA EN LA LAGUNA YANACOCOA Y CANALES DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE TUCUCUCO - YANACOCOA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BARBARA-HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	SANTA BARBARA	14,771.00	EN EVALUACIÓN
					2,986,196.00	

EXP. TEC. FORMULADOS POR SECTORES AÑO - 2012

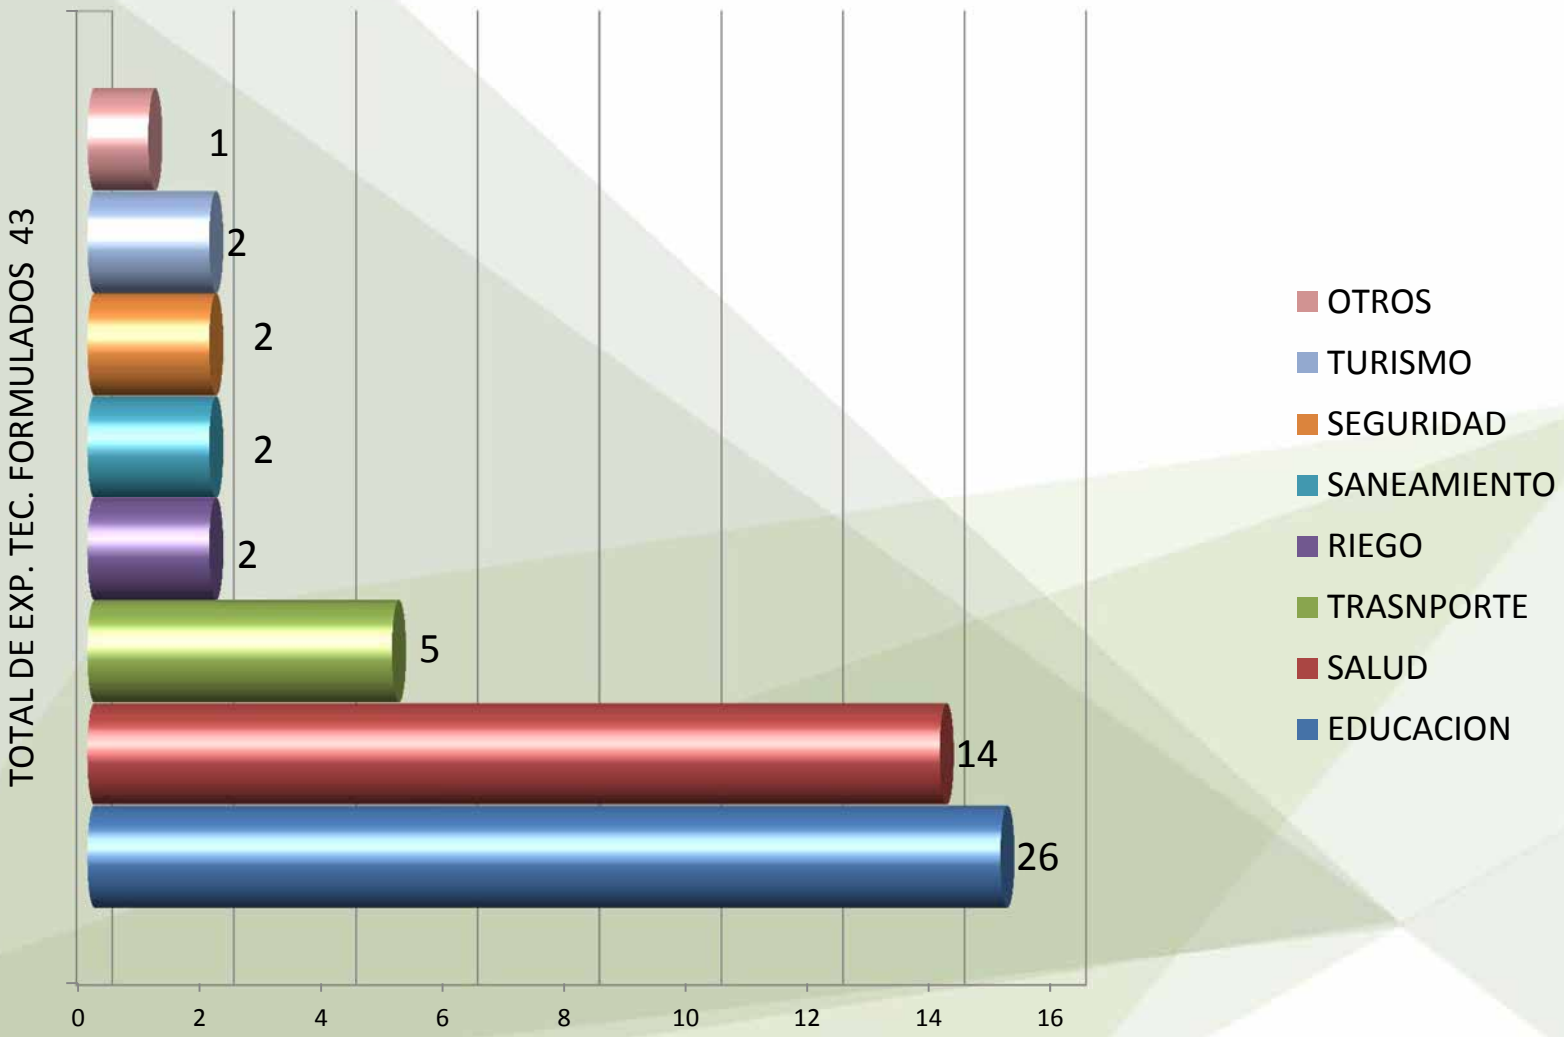


INVERSION EN FORMULACION DE EXP. TEC. POR SECTORES AÑO 2012

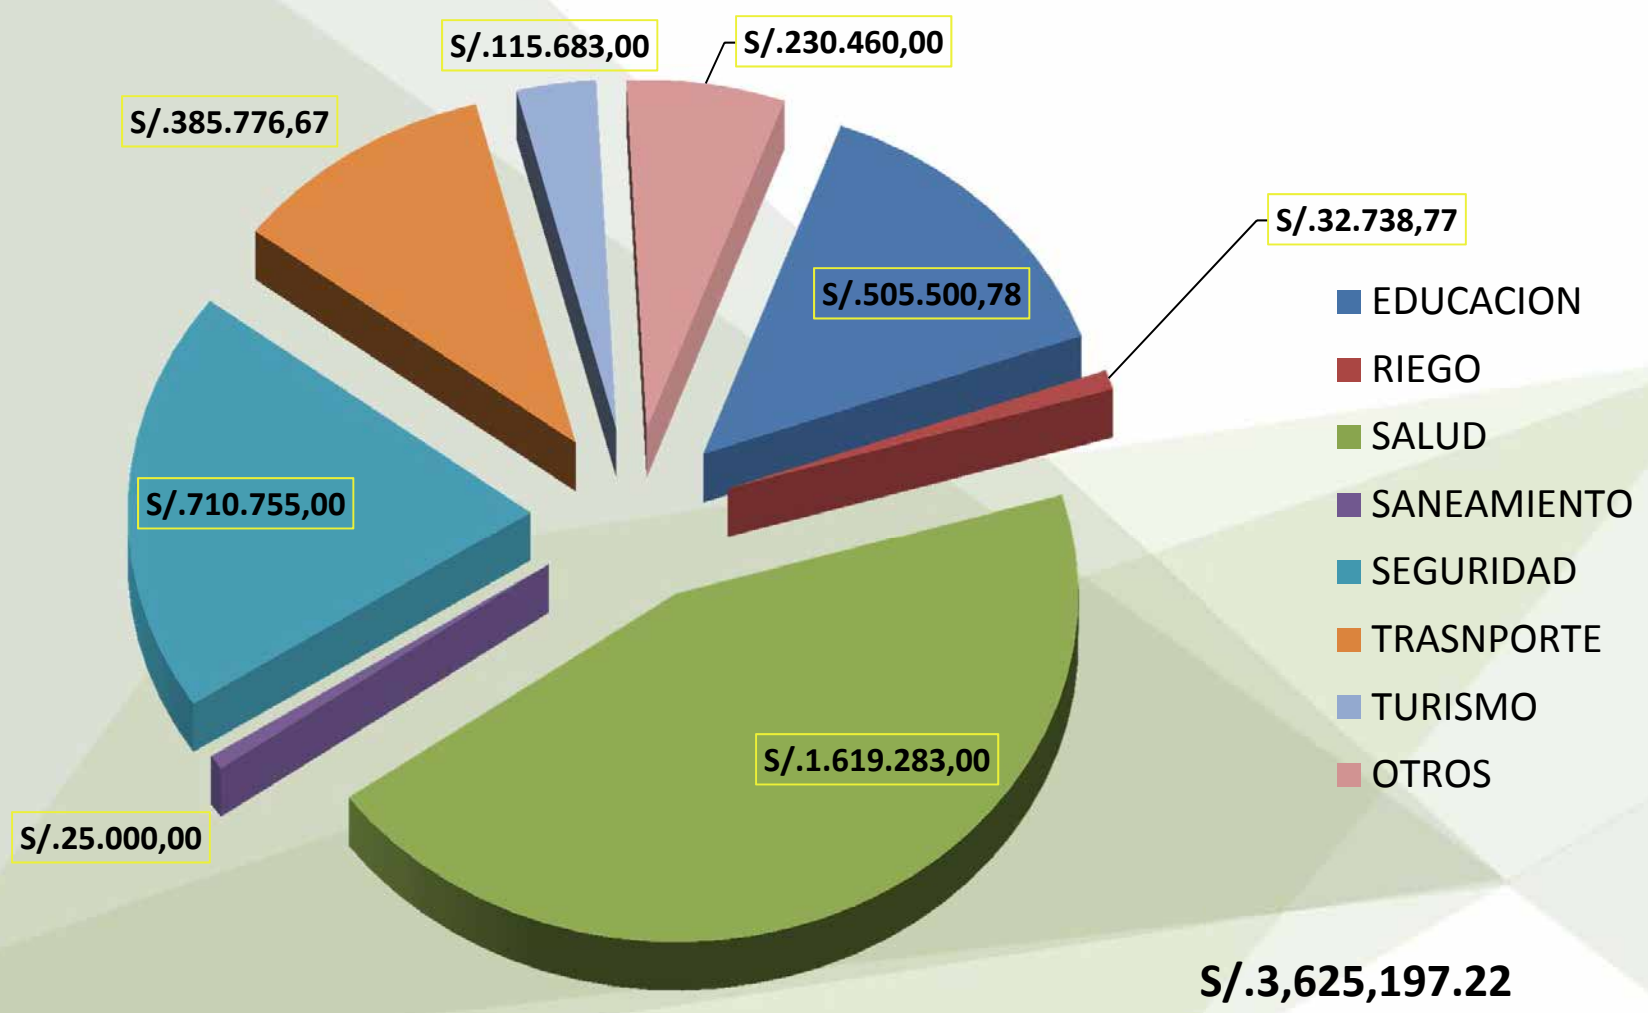

RESUMEN DE ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS AÑO - 2012



	APROBADOS	EN EVALUACIÓN	EN FORMULACIÓN	CANT.	PRESUPUESTO ELAB. EXP.TEC.
EXP. TÉC. ADMINISTRACION DIRECTA	18	08	1	27	1,359,836.00
EXP. TÉC. CONSULTORIA	06	10	11	27	2,265,361.22
TOTAL	24	18	12	54	3,625,197.22

PANEL FOTOGRAFICO DE EXP. TEC.



«MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA»



«MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA»



ESTUDIO DEFINITIVO DEL ASFALTADO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA - PAUCARÁ



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRO RED SANTA ANA, RED HUANCAMELICA



S
U
B

G
E
R
E
N
C
I
A

D
E

E
S
T
U
D
I
O
S

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - HUANCAVELICA



Trabajamos para todos

GRI

S
U
B

G
E
R
E
N
C
I
A

D
E

E
S
T
U
D
I
O
S

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA



Trabajamos para todos



S
U
B
G
E
R
E
N
C
I
A
D
E
E
S
T
U
D
I
O
S

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE LAS LOCALIDADES DE HUANCVELICA, ASCENSION, PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA



Trabajamos para todos




S
U
B

G
E
R
E
N
C
I
A

D
E

E
S
T
U
D
I
O
S


PROPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA (Centro Cívico)

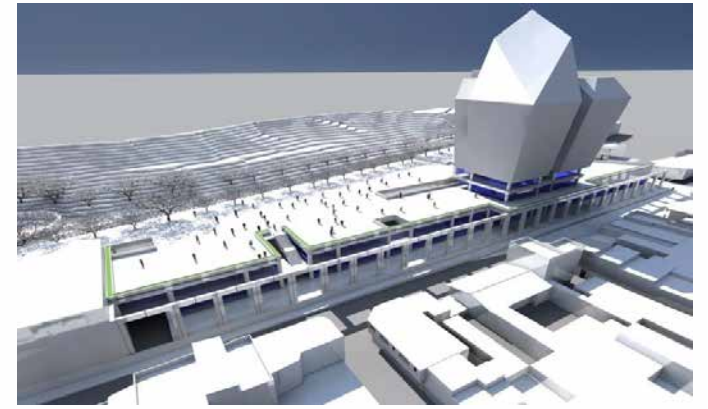

Trabajamos para todos

GRI


CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE HUANCAMELICA

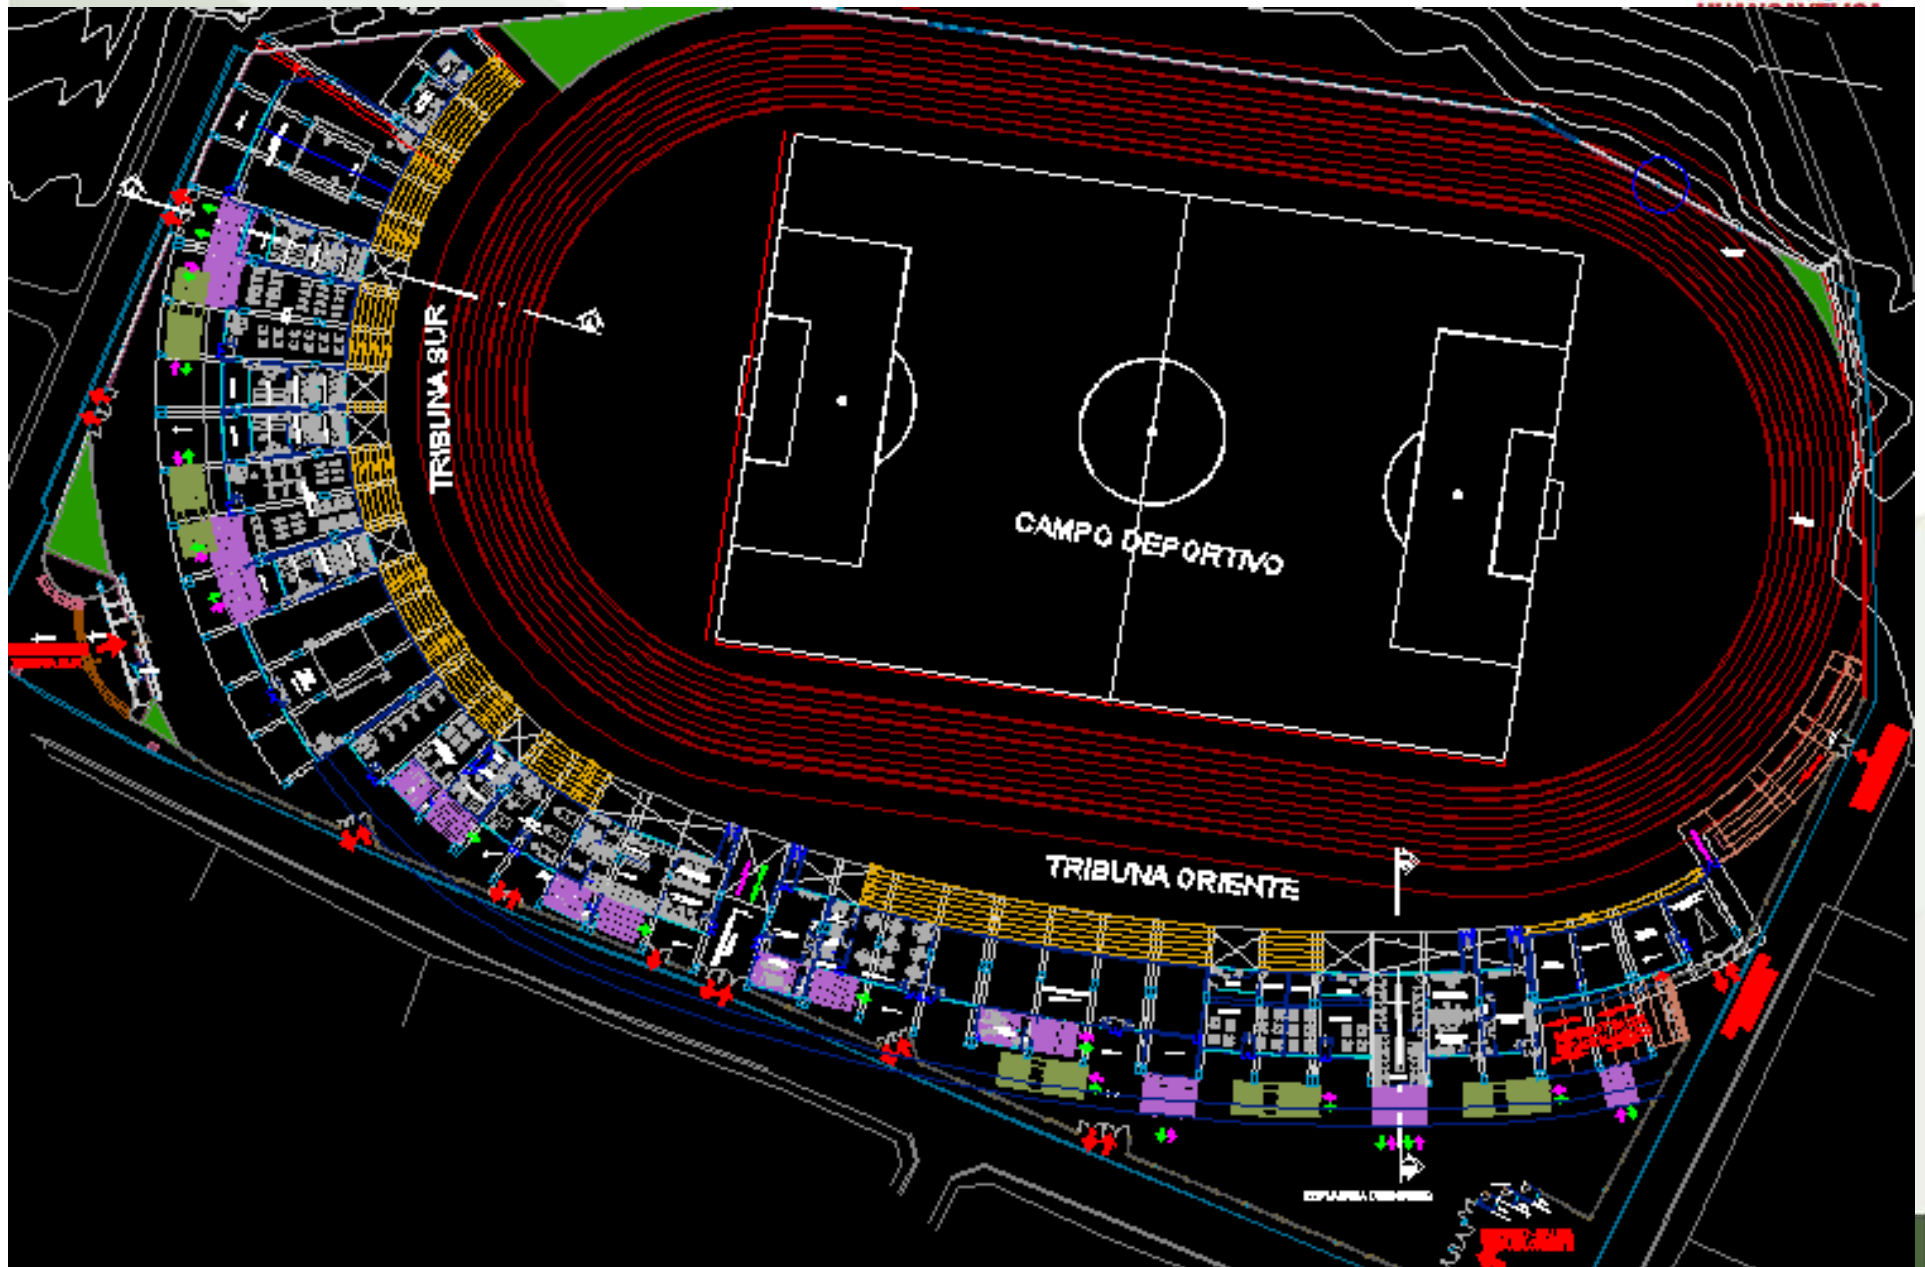

COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS


CREET

SITUACION DE EXP. TECNICOS PERIODO ENE- DIC DEL 2012
(TOTAL DE EXPEDIENTES EVALUADOS 480)

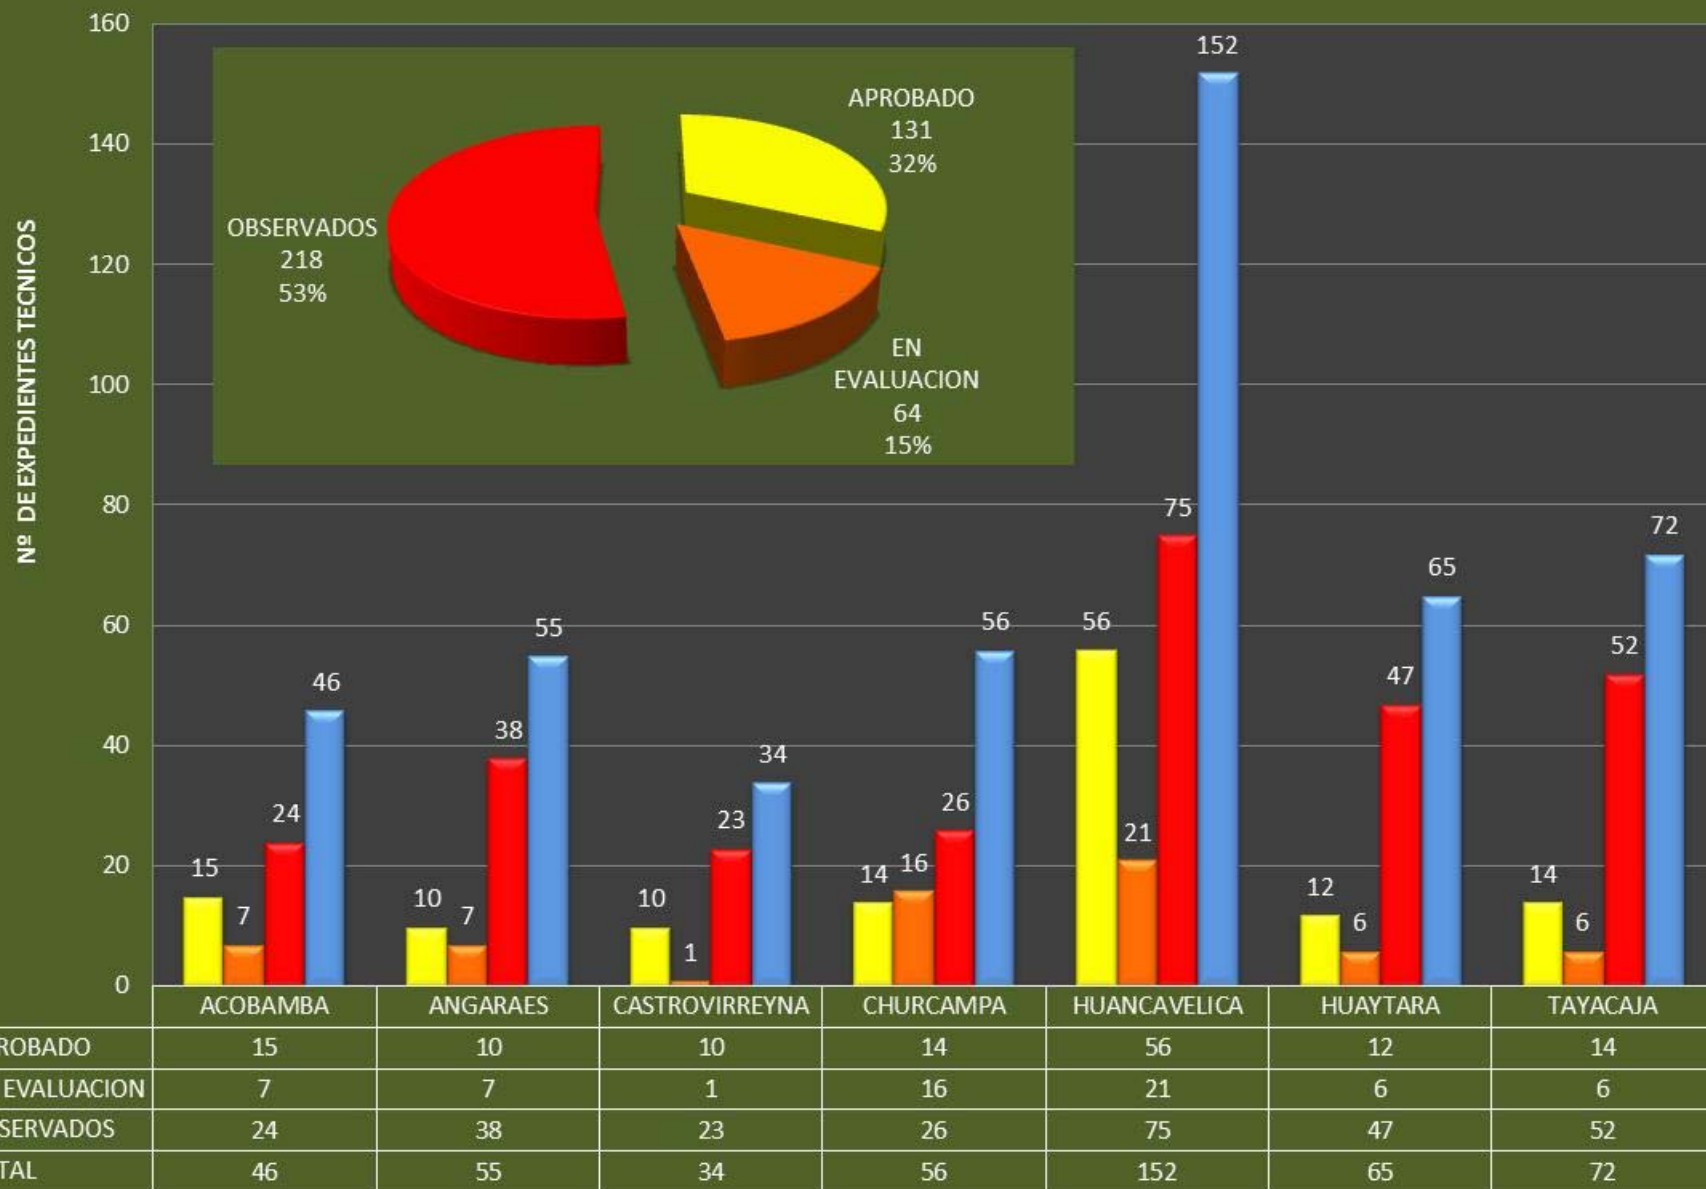

Trabajamos para todos


SITUACION DE EXP. TECNICOS SEGUN TIPO DE INFRAESTRUCTURA PERIODO ENE- DIC DEL 2012
(TOTAL DE EXPEDIENTES 480)

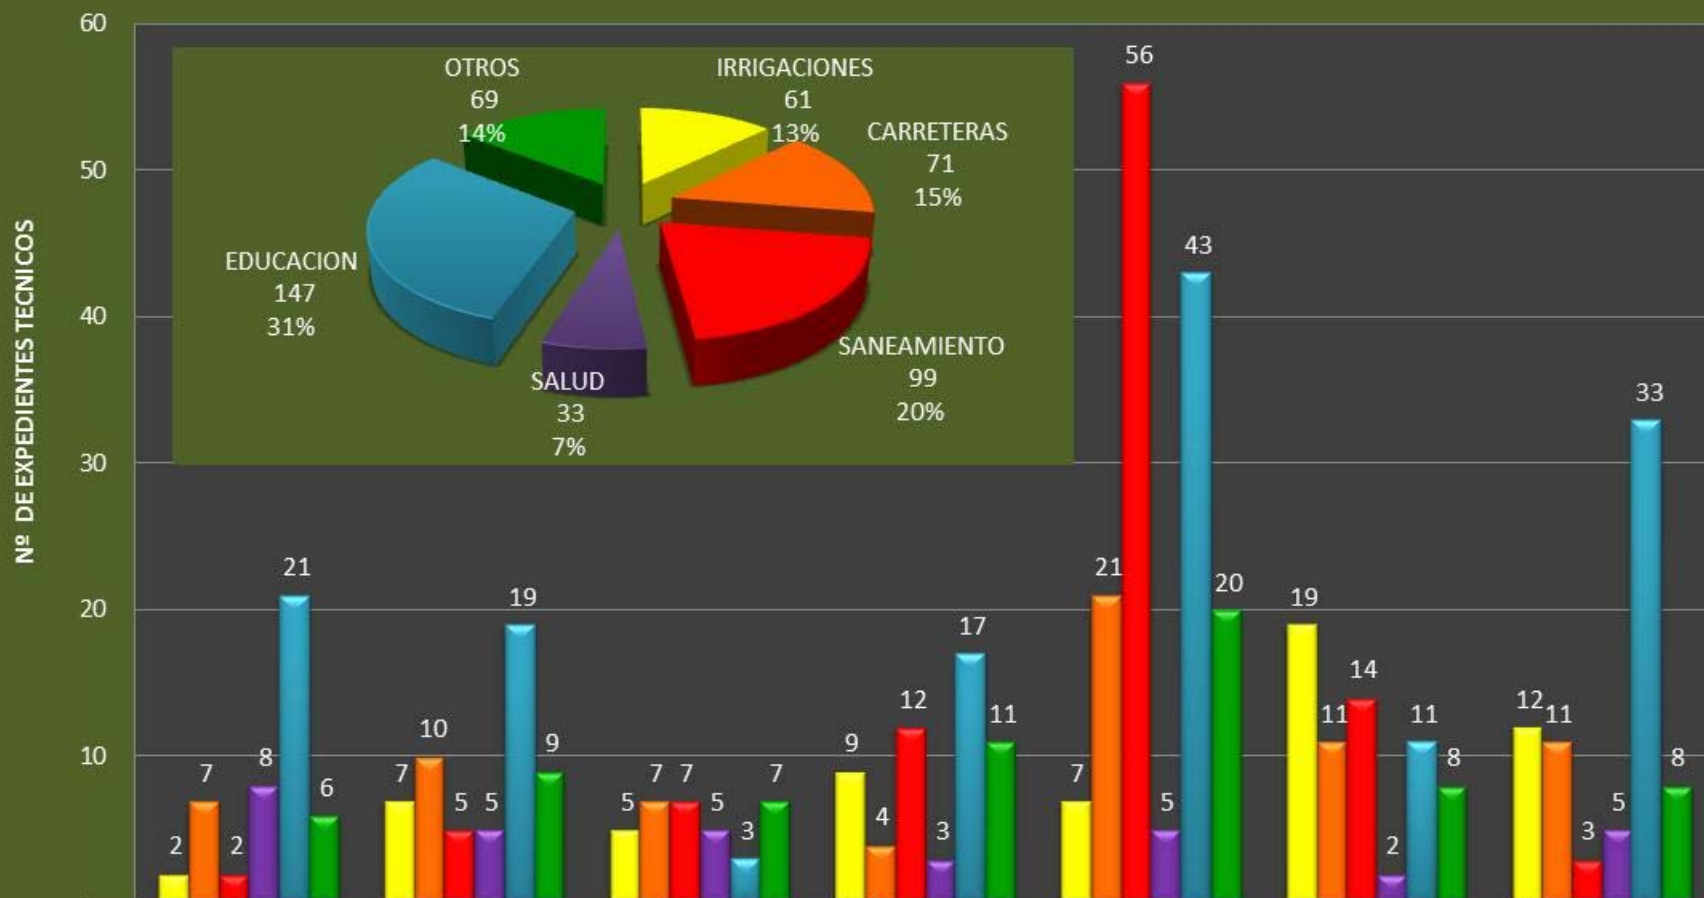

	ACOBAMBA	ANGARAES	CASTROVIRREYNA	CHURCAMP	HUANCAMELICA	HUAYTARA	TAYACAJA
■ IRRIGACIONES	2	7	5	9	7	19	12
■ CARRETERAS	7	10	7	4	21	11	11
■ SANEAMIENTO	2	5	7	12	56	14	3
■ SALUD	8	5	5	3	5	2	5
■ EDUCACION	21	19	3	17	43	11	33
■ OTROS	6	9	7	11	20	8	8

Trabajamos para todos

SITUACION PRESUPUESTAL DE EXP. TECNICOS PERIODO ENE- DIC DEL 2012
(MONTO TOTAL DE EXPEDIENTES EVALUADOS 941'232,500.93)

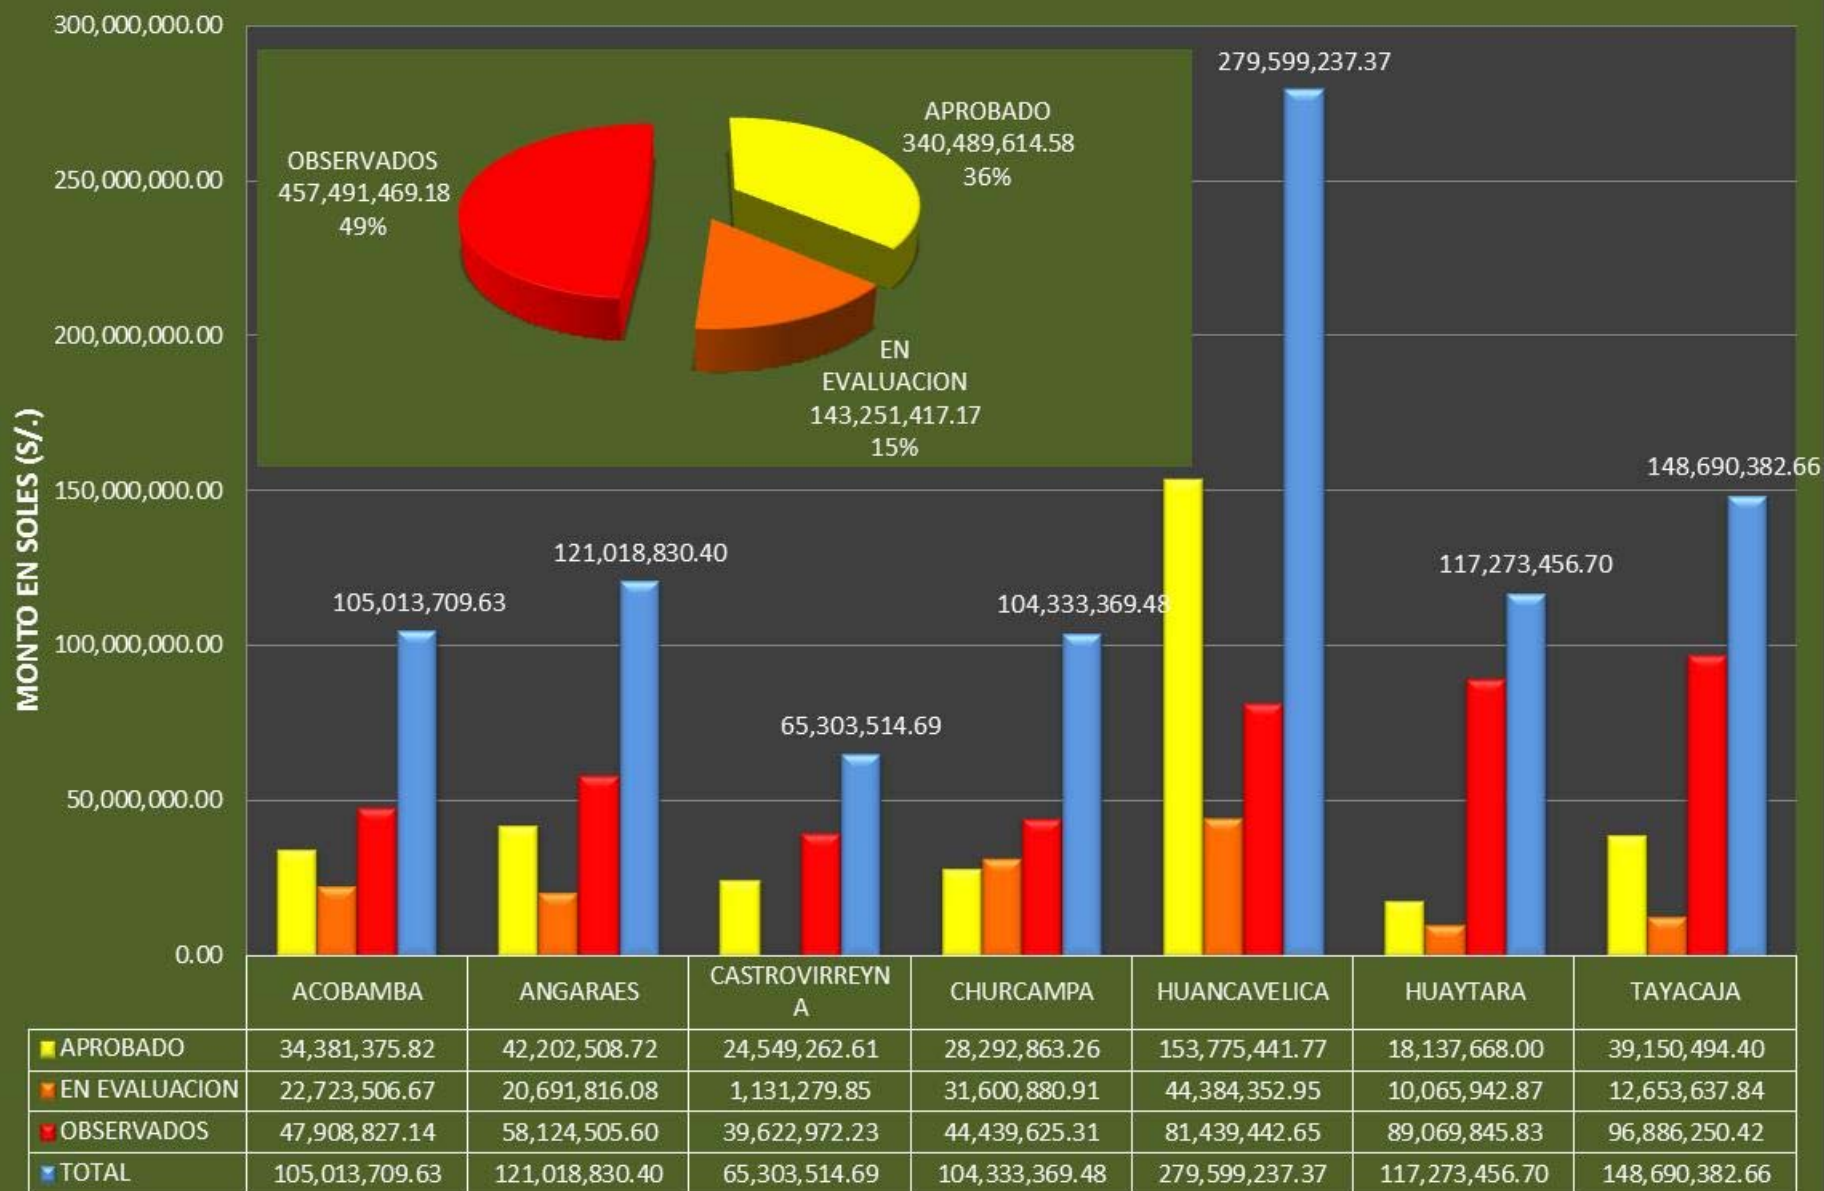

Trabajamos para todos

MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

P
R
O
Y
E
C
T
O

A
P
R
O
B
A
D
O

2
0
1
2



PRESUPUESTO
S/. 6,568,474.31





P
R
O
Y
E
C
T
O

A
P
R
O
B
A
D
O


-

2
0
1
2

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36001 - HUANCAVELICA

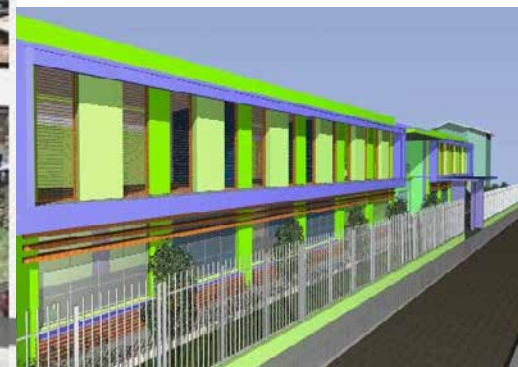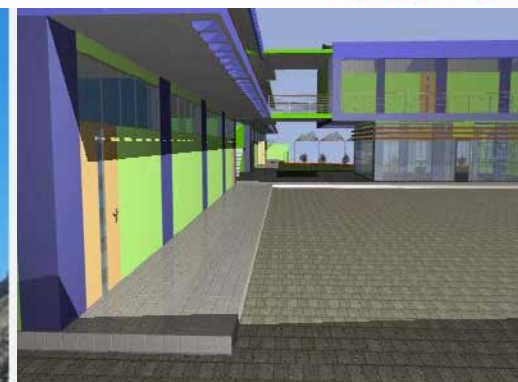

PRESUPUESTO
S/. 3, 040,948.79

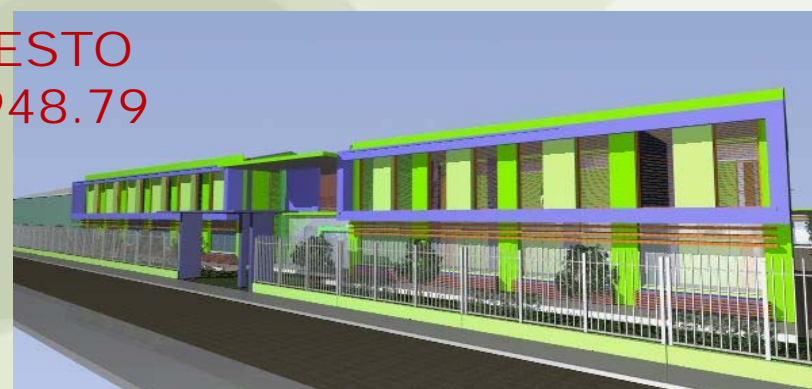

P
R
O
Y
E
C
T
O

E
N

E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

2
0
1
2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA



PRESUPUESTO
S/. 3,813,106.82



Trabajamos para todos

GRI

P
R
O
Y
E
C
T
O

A
P
R
O
B
A
D
O

-

2
0
1
2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NIÑO JESÚS" DEL CENTRO POBLADO DE CIUTAY, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA



Trabajamos para todos



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD



N°	NOMBRE DE TRAMOS	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSION	LONGITUD (KM)
1	Seclla - Julcamarca.	Angaraes	S/. 34,020.00	12.50
2	Huanchos - Palca	Castrovirreyna	S/. 36,666.00	11.75
3	Lachocasa - Pazos	Tayacaja	S/. 72,481.50	26.87
4	San Juan - Huachos	Castrovirreyna	S/. 69,300.00	22.63
5	Chonta-Huachocolpa-Uchcupampa	Huancavelica	S/. 192,780.00	68.00
6	Lircay-DV. Quispicancha.	Angaraes	S/. 79,380.00	28.30
7	Santa Rosa de Tambo-Santo Domingo de Capillas-Sn Francisco de Sangayayco-Santiago de Chocorvos .. (Ica)	Huaytara	S/. 272,160.00	95.18
8	Lircay-Carhuapata-Licapa	Angaraes	S/. 191,780.00	68.00
9	Quispicancha Seclla	Angaraes	S/. 82,120.50	29.20
10	Sinto-Patacancha-Iscuatina-Altarpampa-Cusicancha-Huayacundo-Arma	Huaytara	S/. 160,000.00	58.09
11	Cordova - Ocoyo - Pte Lamary - Santiago de Quirahuara.	Huaytara	S/. 198,450.00	85.40
12	(Lircay) Huayllay Grande - Callanmarca - Huanca Huanca - Congalla Emp. Pe - 26b (Seclla)	Angaraes	S/. 221,760.00	95.57
13	Rumichaca - Moya - Vilca - Vinas - Acobambilla - Ld, Junin (Chaucalle Ju - 110 A Turpo)	Huancavelica	S/. 230,427.44	99.27
14	(Huancavelica)- Callqui-Dv. Satco - Abra Mamacancha - Tansiri (Vinas)	Huancavelica	S/. 115,500.00	49.17
15	Acobamba - Chilcapite - Caja Espiritu (Palomo)	Acobamba	S/. 87,400.00	35.00
16	Lircay - Anchonga - Huayanay - Emp. Hv - 105 (Dv. Huayanay)	Angaraes	S/. 127,000.00	53.87
17	Ichupampa - La Calzada - Pucacruz - Acobamba.	Acobamba	S/. 55,440.00	24.74
18	San Isidro De Acobamba - Matibamba - Emp. Hv 101 (Nueva Esperanza) - San Antonio - Chiquiac.	Acobamba	S/. 87,465.00	34.62
19	(Dv.Jabonillo)- Jabonillo-Huancayojasa-Colcambamba-Tocas-Callqui-(Millpo)	Huancavelica	S/. 151,950.00	57.59
20	Emp. Pe-26 (Dv. Yauli) Yauli Jellocchaca) Emp. Hv. 113 (Dv. Jellocchaca)	Huancavelica	S/. 59,850.00	24.00
TOTAL:			S/. 2,525,930.44	979.75

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES D.U. 058 – 2011-EJECUTADOS 2012



Nº	NOMBRE DE TRAMOS	UBICACION	MONTO DE INVERSION	LONGITUD KM.
1	La Esmeralda, Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucoccosa-Paucarbamba-Andabambilla-Chinchihuasi-Pachamarca	Churcampa	S/. 173,611.35	43.30
2	la Mejorada-Carpas-Ccarhuanra-Patoccocha-Palmira Alta-Checcocruz-Emp.HV-106-Dv.Paucara-Ichupampa	Acobamba	S/. 258,752.64	65.26
3	Anco-La Esmeralda-Andabamba-Emp. HV-105(Dv. Andabamba)	Acobamba	S/. 115,834.86	28.89
4	Ld.Junin (Abra Acopalca JU-109 de Acopalca)Llucclhaccasa-Wari-Trancapampa-Yananya-Dv.San Marcos de Rochacc-San Isidro de Accobamba	Tayacaja	S/. 159,866.78	37.38
5	Emp. PE-26B Cunyacc-Pucapampa-Checcocruz-Emp.HV-105	Huancavelica	S/. 189,860.52	47.89
6	Emp.PE-IS C-Chaulisma-Ayavi-Reyes-Tambo	Huaytara	S/. 134,719.20	31.50
TOTAL:			S/. 1,032,645.35	254.22

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES POR FUNCIONAMIENTO

Nº	CARRETERA	UBICACIÓN	TOTAL	LONGITUD (KM)
1	PAN DE AZUCAR - VILLA DE ARMA	CASTROVIRREYNA	S/. 320,595.68	56.00
2	HUANCAVELICA - ANTACANCHA	HUANCAVELICA	S/. 617,082.20	38.00
3	LACHOCC - CUSIBAMBA - PAN DE AZUCAR	HUANCAVELICA - CASTROVIRREYNA	S/. 600,377.88	56.00
4	ANTACANCHA - LIRCAY	ANGARAES	S/. 486,473.24	37.50
TOTAL:			S/. 2,024,529.00	187.50

RESUMEN DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

Nº	NOMBRE DE PROYECTOS	Nº DE TRAMOS	MONTO DE INVERSION	LONGITUD KM
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES DEL PCD	20	S/. 2,525,930.44	979.75
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES DEL D.U.058-2011	6	S/. 1,032,645.35	31.50
3	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES POR FUNCIONAMIENTO	4	S/. 2,024,529.00	187.50
TOTAL		30	S/. 5,583,104.79	1,198

RESUMEN DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2012- DU 058 2011



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO.	LONGITUD (KM)	MONTO PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
1	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : EMP. PE-26B (Lircay)- ANCHONGA-HUAYANAY-EMP. HV-105 (DV. Huayanay)-EMP. HV-105 (45+785 KM.)	45+785	2,246,646.19
2	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (ACOSTAMBO)-PAMPACORRAL-ACRAQUIA-AHUAYCHA-EMP. PE-3SD (PAMPAS) 38.34 KM.LONG	38+34	1,709,822.42
3	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA TRAMO I: HUARANGO PATA (KM 50.50 L.DPTAL ICA)-TAMBILLO-CHAULISMA AYAVI-SANTA ROSA DE TAMBO LONG=52+500KM Y TRAMO II: SANGAYAICO-SANTIAGO DE CHOCORVOS-OTUTO-ANDAYMARCA- TINGO (LIMITE DPTAL ICA LONG=74+18) (126.68KM)	126+68	4,737,287.74
4	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA I.d. CON JUNIN (ABRA ACOPALCA-JU-109 DE ACOPALCA) WARI-TRANCAPAMPA-YANANYA- SAN ISIDRO ACOBAMBA-MATIBAMBA-EMP. HV-101(NUEVA ESPERANZA)-SAN ANTONIO-CHIQUIAC (72.00 KM)	72+00	2,319,585.03
5	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-3S (IMPERIAL)- RUMICHACA-MOYA-VILCA-VIÑAS-ACOBAMBILLA-MARTINHUASI-LD JUNIN (CHAUCALLE JU.-110 A TURPO) 133.27 KM LONG	133+27	4,737,452.62
6	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO CAMINO DEPARTAMENTAL; EMP. PE. - 3SD (DV .JABONILLO) JABONILLO - HUANCAYOJASA - COLCABAMBA - TOCAS – CALLQUI - EMP. PE - 3SD (MILLPO)"	57+590	1,991,945.62
7	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP. PE-28(Dv. Sinto)-SINTO-PATACANCHA-ISCUATINA-ALTAR PAMPA-CUSICANCHA-HUAYACUNDO ARMA-EMP. PE-28A (Dv. HUAYACUNDO ARMA) (58+090)	55+816	2,303,675.00
8	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PE-26(HUANCAVELICA)-CALLQUI-DV. SATCO-ABRA MAMACANCHA - TANSIRI-EMP. HV-110(VIÑAS) (49+170km)	49+170	2,138,847.80
9	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA EMP. PE-26B (LIRCAY)-HUAYLLAY GRANDE-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA-CONGALLA-EMP. PE-26B (SECCLLA) (95+570 Km)	95+570	3,704,122.31
10	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA DV. PE-26-YAULI-AMBATO-PUCAPAMPA (EMP. HV-113) (24+000 KM)	24+000	1,057,828.26
11	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA EMP. PE-3S (LA CALZADA-PUCACRUZ-ACOBAMBA. KM 20+870)	20+870	976,043.25
12	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS EMP. PE-3S MARISCAL CACERES (LA MEJORADA)-CARPAS-CCARHUARANRA-PALMIRA ALTA, KM 52+000	52+000	1,713,646.36
TOTAL			29,636,902.60

RESUMEN DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PRESUPUESTO POR RESULTADOS - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO.	LONGITUD (KM)	MONTO PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
1	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHONTA-CAUDALOSA CHICA (LONG. 20.00 KM)	20+00	749,767.21
2	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA TRAMO: SALCAHUASI-LOMA BAJA, CODIGO DE RUTA Nº HV-101, (LONGITUD=11+150KM)	11+150	420,524.82
3	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA TRAMO: PUENTE CHIQUIACC-SURCUBAMBA, CODIGO DE RUTA Nº HV-109, (LONGITUD=23+650 KM)	23+650	733,989.27
4	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL TRAMO: SURCUBAMBA-UCHUYSIHUIS-LLIHUAPAMPA	25+00	714,538.34
5	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA TRAMO: (KM. 126+850)- ISLAPAMPA-LLIHUAPAMPA-TINTAY PUNCU-SAN JUAN- COCHABAMBA GRANDE, CODIGO DE RUTA Nº HV-101, (LONGITUD=24+810 KM)	24+810	799,501.15
TOTAL			3,418,320.79

PANEL FOTOGRAFICO



DIRECCIÓN DE CAMINOS



LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL HUANCAVELICA



PRESUPUESTO TOTAL: S/. 2'300,000.00 N.S

DIRECCIÓN DE CAMINOS

EJECUTADO: S/. 1'400,000.00 N.S (60%)

INTERVENCIÓN:

La Actividad se localiza en las 07 provincias de la región y sus respectivos distritos en la que se encuentra involucradas las localidades beneficiarias, las cuales serán atendidas simultáneamente en la vías departamentales, a causa de las precipitaciones pluviales que azotan la Región, atendiendo de esta manera a las emergencias viales. También se intervendrán vías que involucran el flujo vehicular con las vías departamentales.





Dirección Comunicaciones



Trabajamos para todos

GRI

ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA



CULMINADA

- ❑ **Generales:**
 - ⦿ **Localidad** : Multilocal
 - ⦿ **Distrito** : Multidistrital
 - ⦿ **Provincia** : Tayacaja
- ❑ **Monto de inversión** : S/. 2,246,366.09
- ❑ **Beneficiarios** : 5,684 pobladores
- ❑ **Objetivo**: la cobertura del servicios de internet a los sectores de educación y salud de los distritos mencionados.
- ❑ **Avances**: 100.00% Físico 49.12% Presupuestal
- ❑ **Situación Actual** : Obra culminada e inaugurada.
- ❑ **Logros y Beneficios**: Instituciones Educativas 86, postas de salud 9), Computadoras en Instituciones Educativas 204, Computadoras en Posta de Salud 9
- ❑ **Sistema Satelital** (Receptor satelital, antena parabólica 1.2Mts)
- ❑ **Estaciones Repetidoras** (Cimentación para el izado de torres ventadas de 21Mts, Instalación de antenas en cada Institución educativa y posta de salud)
- ❑ **Estación Central** (Cimentación para el izado de torre ventada de 30 Mts, Instalación de pozo a tierra, enlaces de radio para 02 Repetidoras e Instituciones educativas y postas de salud. Instalación de Fibra Óptica.



OBRAS - AD

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO UN MEDIO DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN DE HUANCVELICA



I.E. ANTACOTO - ACRAQUIA



I.E. CHINCHIPAMPA- DANIEL HERNANDEZ



I.E. CAPILLAPATA - PAMPAS



P.S MASHUAYLLO – DANIEL HERNANDEZ



P.S. TUCUMA - PAMPAS




COLEGIO AHUAYCHA CASAY- PAMPAS

OBRAS - AD

SUB DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES (COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL)



N°	NOMBRE DEL PIP	MONTO S/.	FORMULADOR	SITUACIÓN ACTUAL
1	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de comunicación en los distritos de Acoria, Laria y Palca la Provincia y Departamento de Huancavelica	4 378,519.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
2	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en los distrito de Pilpichaca Provincia Huaytara departamento Huancavelica.	3 287,838.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
3	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en 06 Distritos de la Provincia de Tayacaja Departamento de Huancavelica.	6 593,871.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
4	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en los distritos de Anchonga y Congalla de la Provincia de Angaraes departamento de Huancavelica.	1 795,434.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
5	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en los distritos de Anta y Paucara Provincia de Acobamba Departamento de Huancavelica.	2 722,323.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
6	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en 05 Distritos de la Provincia de Castrovirreyna Departamento de Huancavelica	4 560,024.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
7	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Comunicación en los Distritos de Locroja y Anco Provincia de Churcampa Departamento de Huancavelica	2 090,870.00	Dirección de Comunicaciones	En Evaluación en OPI
TOTAL		25,428,879.00		



GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA LOGROS Y AVANCES

OBRAS CULMINADAS AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA	POMACOCHA	CHOCLOCOCHA	S/. 1,805,096.37
2	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36172 POMACOCHA	POMACOCHA	POMACOCHA	S/. 1,378,925.53
3	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº. 36201 - PALOMA - MARCAS	MARCAS	PALOMA	S/. 402,358.43
4	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE REPARTICION CANGAR-LENLECC	CAJA ESPIRITU	MULTILOCAL	S/. 1,163,618.05
5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA	PAUCARA	TINQUERCCASA	S/. 701,488.39
6	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA - MAYUNMARCA	ANDABAMBA	MULTILOCAL	S/. 1,591,581.24
7	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE Nº 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA	POMACOCHA	CHILCAPITE	S/. 955,270.00
8	SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 36169 SAN ISIDRO - MARCAS	MARCAS	SAN ISIDRO	S/. 464,810.31
9	CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. Nº 608 DE TORORUMI	ROSARIO	TORORUMI	S/. 301,000.00
10	CONSTRUCCION Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO	ROSARIO	PUCACRUZ	S/. 1,152,998.00
11	ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE DESASTRES EN HUANCAVELICA-AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUAYANAY	ANDABAMBA	HUAYANAY	S/. 61,556.00
12	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PATACANCHA	ROSARIO	PATACANCHA	S/. 707,486.00
13	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHANQUIL	ROSARIO	CHANQUIL	S/. 695,143.08
14	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PAMPAPUQUIO	PAUCARA	PAMPAPUQUIO	S/. 678,371.39
15	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LECCLESPAMPA	ROSARIO	LECCLESPAMPA	S/. 645,179.11
16	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MANYACC	ANTA	MANYACC	S/. 588,354.93
17	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. Nº 177 DE NIVEL INICIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA- ACOBAMBA - HUANCAVELICA	POMACOCHA	CHOCLOCOCHA	S/. 716,924.97
18	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. E. Nº 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY	ACOBAMBA	CURIMARAY	S/. 918,689.74
19	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	ACOBAMBA	ACOBAMBA	S/. 1,489,656.14
20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA Nº 36374 CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA	PAUCARA	CHECCOCRUZ	S/. 1,627,135.89
21	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36150 DE ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	S/. 787,073.93
				S/. 18,832,717.50

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PAMPAPUQUIO**



**MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MANYACC**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



**CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO
MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE
ACOBAMBA**



**CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 36374 DE CHECCO
CRUZ- PAUCARÁ- ACOBAMBA**

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA DE CUÑI DEL DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.	MARCAS	CUÑI	S/. 1,659,745.80
2	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA - LLAHUECC- RIO MANTARO	MARCAS	LLAHUECC	S/. 1,812,839.78
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACOBAMBA	TRES DE OCTUBRE	S/. 2,023,787.42
4	SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA	PAUCARA	TINQUERCCASA	S/. 2,261,093.58
				S/. 7,757,466.58

OBRAS - AD

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA CUÑI-DEL
DISTRITO DE MARCAS**



**CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE
RURUNMARCA LLAHUECC – RIÓ MANTARO**

GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES LOGROS Y AVANCES

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2012



Nº	PROYECTO	PRESUPUESTO	DISTRITO	LOCALIDAD
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHQUI-HUAYCHAOPALLCCA-BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAVELICA	S. 1,477,058.25	LIRCAY	MULTILOCAL
2	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	S. 4,073,179.37	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL
3	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE OCOPA - SANTA ROSA	S. 620,051.69	MULTIDISTRITAL	OCOPA-SANTA ROSA
4	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE BUENAVISTA-CHAHUARMA	S. 725,523.32	MULTIDISTRITAL	BUENAVISTA - CHAHUARMA
5	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE HUAYLLAY CHICO-CALLANMARCA-HUANCA HUANCA-HUAYLLAY GRANDE	S. 674,783.67	MULTIDISTRITAL	CALLANMARCA
6	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE PIRCAPAHUANA-ANTACCACCACUCHO	S. 427,074.85	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL
7	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE ALLATU-UCHCUPAMPA-YANACCOCHA	S. 697,933.79	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL
8	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE"- COMPONENTE RUMICHACA-TUCSIPAMPA-TANCARPAMPA	S. 879,772.05	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL
TOTAL:		S. 9,575,376.99		

PANEL FOTOGRAFICOS

CULMINADA



**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO-
ANCHONGA - ANGARAES**



**MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO-
ANCHONGA - ANGARAES**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADA



**MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO
POMACOA-HUANCAS –TOTORA**



**MEJOR.DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVIC.DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION
DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRO RED
CCOCHACASA DE LA RED ANGARAES**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADA



**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.NRO
36286 CUTICSA-PROV.ANGARAES**



**AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
LIRCAY**

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA
PASTOS QUICHQUIHUAYCHAUPALLCCA-
BUENAVISTA-PROVINCIA DE ANGARAES-
HUANCAVELICA**



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES
NORTE - COMPONENTE OCOPA - SANTA ROSA**

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES
NORTE"- COMPONENTE BUENAVISTA-
CHAHUARMA**



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES
NORTE**

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES
NORTE'- COMPONENTE RUMICHACA-
TUCSIPAMPA-TANARPAMPA**



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES
NORTE - COMPONENTE RUMICHACA-
TUCSIPAMPA-TANARPAMPA**

GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ

LOGROS Y AVANCES

OBRAS CULMINADOS AÑO 2012



Nº	PROYECTO	PRESUPUESTO	DISTRITO	LOCALIDAD
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	S/. 2,122,250.01	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
2	CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE QUIRAHUARA-CCANCAIRO-SAN BARTOLOME (QUIRAHUARA-HUAYTARÁ)	S/. 1,519,231.00	QUIRAHUARA	MULTILOCAL
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NÚCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA (SANTIAGO DE CHOCORVOS-HUAYTARÁ)	S/. 3,272,898.43	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL
TOTAL		S/. 6,914,379.44		

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2012

Nº	PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22023 DEL DISTRITO DE HUAYTARÁ, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - HUANCAVELICA.	HUAYTARA	HUAYTARA	S/. 687,603,65
2	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA-HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO (QUITO ARMA-HUAYTARÁ)	HUAYTARA	QUITO ARMA	S/. 2,632,958.78
3	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUACHAJE -SAN ISIDRO DE POTACA- SAN JUAN DE VISTA ALEGRE- EMPALME A VÍA DE SAN JUAN DE CORERAC DE SANTIAGO DE CHOCORVOS	SAN JUAN DE CORERAC	MULTILOCAL	S/. 1,356,093.98
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MULTILOCAL	S/. 1,823,695.54
5	CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHA	HUIRPACANCHA	ILLAHUASI	S/. 2,361,159.06
6	CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE OOCOROPAMPA-PUEBLO NUEVO-PALLQAPAMPA SANTA ROSA DE LLILLINTA (PILPICHACA-HUAYTARÁ)	PILPICHACA	LLILLINTA	S/. 3,821,874.84
TOTAL:				S/. 11,995,782.20

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NÚCLEO SANTIAGO DE
CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA **CULMINADA**



PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA I.E. N° 22023 HUAYTARÁ-HUANCAVELICA



CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE CHOCORVO ARMA- HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO



CONST. DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN ISIDRO DE POTACA- SAN JUAN DE VISTA ALEGRE- EMPALME A VÍA DE SAN JUAN DE CORERAC DE SANTIAGO DE CHOCORVOS.



CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHA

PANEL FOTOGRAFICOS

EJECUCIÓN



CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE
OOCOROPAMPA-PUEBLO NUEVO-PALLQAPAMPA SANTA
ROSA DE LULLINTA

GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA LOGROS Y AVANCES

OBRAS CULMINADAS AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES	TICRAPO	TICRAPO	S/. 820,181.04
2	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA	AURAHUA	MULTILOCAL	S/. 2,299,113.06
3	SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA	CASTROVIRREYNA	COCHA	S/. 1,684,316.59
4	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	MOLLEPAMPA	CHIRIS	S/. 1,321,982.04
5	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO	CHUPAMARCA	MULTILOCAL	S/. 822,013.30
6	CONSTRUCCION DE VASO DE REPRESENTAMIENTO DE HUARAJÓ	AURAHUA	COCHAMARCA	S/. 918,610.59
7	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AURAHUA	AURAHUA	AHURAHUA	S/. 1,191,524.82
8	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	CASTROVIRREYNA	ESMERALDA	S/. 694,630.22
				S/. 9,752,371.66

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MIXTO LOS LIBERTADORES**



**CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
HUAYACCA - ANTACANCHA -
COCHAMARCA**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



**SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV -
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 10 LOCALIDADES
DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS
ÁNGELES DE SUYTUPAMPA**



**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
CARRETERA CHIRIS - VILLOCO**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



**CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE
MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO**



**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO AURAHUA**

PANEL FOTOGRÁFICOS

CULMINADO



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE
TAMBO ESMERALDA

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	TICRAPO	TICRAPO	S/. 1,485,872.87
2	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA	ARMA	TOTORA	S/. 603,309.96
3	INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA	CHUPAMARCA	MULTILOCAL	S/. 634,413.82
4	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA	TANTARA	CASACANCHA	S/. 2,446,241.97
5	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -CHICHO - MOLLEPAMPA	MOLLEPAMPA	CHICHO	S/. 574,407.47
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA	CASTROVIRREYNA	PACOCHA	S/. 916,815.61
7	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA	CAPILLAS	MULTILOCAL	S/. 1,021,351.01
8	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-TANTARÁ-CHUPAMARCA- AURAHUA-COLCABAMBA	MULTILOCAL	MULTILOCAL	S/. 4,522,358.26
9	CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE ASTOMARCA ANAY	MOLLEPAMPA	ASTOMARCA - ANAY	S/. 2,117,509.97
10	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI	TANTARA	CASCANI	S/. 655,164.34
				S/. 14,977,445.28

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO
DE HUARAJO**



**MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACIÓN
RUNTUPAMPA- PAMPACANCHA- CAJAMARCA**

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -
CHICHO - MOLLEPAMPA**



**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA**

PANEL FOTOGRÁFICOS

EJECUCIÓN



**INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE
RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES
DE CHUPAMARCA**



**CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA**

PANEL FOTOGRÁFICOS



EJECUCIÓN



**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE TICRAPO**

GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP LOGROS Y AVANCES

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO - 2012

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCCASA	ANCO	ANCO	S/. 2,597,912.73
2	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUCUCCASA – PAUCARBAMBA – CHINCHIHUASI-PACHAMARCA – CAMPO FERIAL TUCUCCASA	PAUCARBAMBA- CHINCHIHUASI PACHAMARCA	TUCUCCASA	S/. 3,183,875.20
3	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA	PACHAMARCA	MULTILOCAL	S/. 2,097,000.00
4	INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y LETRINAS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA	PACHAMARCA	MULTILOCAL	S/. 1,396,510.82
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.S.Mx."SEÑOR DE ATOCCASA, DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA CHURCAMP-HUANCVELICA	CHURCAMP	CHURCAMP	S/. 1,512,361.62
6	MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA	CHURCAMP	TULLPACANCHA	S/. 470,948.23
7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMP HUANCVELICA	CHINCHIHUASI	ARMA PATACANCHA	S/. 962,359.21
				S/. 12,220,967.81



CONSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - TUCUCCASA



MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUCUCCASA – PAURCARBAMBA – CHINCHIHUASI-PACHAMARCA – CAMPO FERIAL TUCUCCASA”



CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA.



INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y LETRINAS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, ILLPE Y PATIBAMBA



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.S. Mx."SEÑOR DE ATOCCASA, DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA CHURCAMP-HUANCVELICA



MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA ISLACCOCHA

OBRAS CULMINADAS AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA –EL CHORRO –PAMPAPUQUIO – HUAYRAPATA-PACCHA	CHURCAMP	CHURCAMP	S/. 1,863,208.97
2	CONSTRUCCION CARRETERA URPAY-PATAHUASI-HUAYLLABAMBA-CHACHAS	CHINCHIHUASI	MULTILOCAL	S/. 1,369,653.21
3	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES	ANCO	MULTILOCAL	S/. 1,494,832.00
4	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN - MICRORED CHURCAMP - DIRESA HUANCVELICA	LOCROJA	LLAURECCAN	S/. 962,359.21
				S/. 5,690,053.39



**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUACCRACCASA –EL CHORRO –
PAMPAPUQUIO – HUAYRAPATA- PACCHA**



**CONSTRUCCION CARRETERA URPAY-PATAHUASI-HUAYLLABAMBA-
CHACHAS**

MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TUCUCCASA - ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES



Trabajamos para todos

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN - MICRORED CHURCAMPÁ - DIRESA HUANCÁVELICA



Trabajamos para todos



GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

LOGROS Y AVANCES

OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO, DE LA MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA	CHACHAS - QUINTAO	CHACHAS Y QUINTAO	S/. 1,657,585.00
2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCATELICA	DANIEL HERNANDEZ	PALTARUMI	S/. 1,847,207.31
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCATELICA	COLCABAMBA	ANDAYMARCA	S/. 1,221,578.98
4	SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCATELICA	SURCUBAMBA	SURCUBAMBA	S/. 2,265,931.79
5	AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCATELICA	COLCABAMBA	SAN ANTONIO DE PICHU	S/. 558,754.82
6	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA-PUERTO SAN ANTONIO	MULTIDISTRITAL	MULTILOCAL	S/. 9,995,204.67
7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA-HUANCATELICA	TINTAYPUNCU	COCHABAMBA	S/. 803,616.24
8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCATELICA	HUARIBAMBA	MULTILOCAL	S/. 1,672,971.00
				S/. 20,022,849.81

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE
LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS Y QUINTAO, DE LA
MICRORED COLCABAMBA, RED TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA



CHACHAS



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 1,657,585.00

QUINTAO



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31302 DE LA LOCALIDAD
DE PALTARUMI DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ,
PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA



MONTO DE INVERSIÓN : 1,847,207.31



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA,
DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 1,221,578.98



SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 2,265,931.79



AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE
PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIÓN : S/. 558,754.82



CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA-PUERTO SAN ANTONIO



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 9'995,204.67



CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE LA
LOCALIDAD DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE
TINTAY PUNCU-TAYACAJA-HUANCVELICA

MONTO DE INVERSIÓN : S/. 803,616.24



CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLPA
HUAYARQUI A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE
LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA
DE TAYACAJA-HUANCVELICA

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1'672,971.00



OBRAS CULMINADAS 2012

OBRAS CULMINADAS AÑO - 2012



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	LOCALIDAD	PRESUPUESTO
1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. 30936 DE CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA	PAMPAS	CHALAMPAMPA	S/. 1,717,373.94
2	AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA	COLCABAMBA	COLCABAMBA	1,130,367.86
3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACOSTAMBO	VIOLETAS ACCOYANCA	S/. 2,594,490.96
				S/. 5,442,232.76

*FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. 30936 DE
CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
TAYACAJA-HUANCAVELICA*



MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1,717,373.94



AMPLIACION, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO I.E. N° 30944 COLCABAMBA,
DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 1,130,367.86



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE
LOS PUESTOS DE SALUD: NUEVA ESPERANZA, VIOLETA
ACCOYANCA, CHUCUNA Y HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED
ACOSTAMBO, RED TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSIÓN : S/. 2,594,490.96



GRACIAS...!
