

**REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	75	3	1	2	6	4	50	2	0	0	0	13
ANGARAES	47	0	1	0	1	4	22	0	0	0	0	20
CASTROVIRREYNA	52	3	0	0	3	4	26	2	0	0	0	17
CHURCAMP	41	2	0	0	2	12	18	5	0	0	0	4
HUANCAMELICA	90	4	0	1	5	1	62	0	0	0	0	22
HUAYTARA	37	4	0	0	4	4	20	0	0	0	0	9
TAYACAJA	78	2	0	0	2	8	66	0	0	0	0	2
<b>TOTAL =</b>	<b>420</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>264</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

TOTAL DE OBRAS ==>

**REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO**

SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	15	0	0	0	0	1	7	0	0	1	0	6
ANGARAES	9	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4
CASTROVIRREYNA	21	0	0	0	0	2	13	0	0	1	0	5
CHURCAMP	30	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	13
HUANCAMELICA	42	0	0	0	0	1	31	0	1	0	0	9
HUAYTARA	18	1	0	0	1	1	9	0	0	0	0	7
TAYACAJA	34	1	0	0	1	2	20	0	0	0	0	11
<b>TOTAL =</b>	<b>169</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

TOTAL DE OBRAS ==>

**REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA**


SEDES O GERENCIAS SUB REGIONALES	TOTAL DE OBRAS POR SUB GERENCIAS	EN EJECUCIÓN				PARALIZADO	TERMINADO	NO INICIADO	SIN INFORMACIÓN	RESUELTO	RECEPCIONADO Y TRANSFERIDO	LIQUIDADO
		ATRASADO	ADELANTADO	NORMAL	TOTAL							
ACOBAMBA	7	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	1
ANGARAES	11	1	0	0	1	1	5	0	0	0	0	4
CASTROVIRREYNA	13	0	0	1	1	3	6	1	0	1	0	1
CHURCAMP	5	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	1
HUANCAMELICA	29	6	1	2	9	5	5	0	0	2	0	8
HUAYTARA	53	3	1	0	4	7	10	0	0	0	0	32
TAYACAJA	14	2	0	0	2	3	5	0	0	0	0	4
<b>TOTAL =</b>	<b>132</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>51</b>

TOTAL DE OBRAS ==> 721


REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	
OBRAS POR INICIAR	10
OBRAS EN EJECUCION	44
OBRAS TERMINADAS	402
OBRAS PARALIZADAS	66
OBRAS SIN INFORMACION	1
OBRAS LIQUIDADAS	193
OBRAS RESUELTO	5
<b>TOTAL DE OBRAS</b>	<b>721</b>

PROVINCIAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						CONVENIO						CONTRATA						TOTAL DE OBRAS	TOTAL SEGÚN LAS 3 MODALIDADES				
	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO	Nº OBRAS	TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	POR INICIAR	LIQUIDADO		TERMINADAS	EJECUCIÓN	PARALIZADAS	LIQUIDADOS	POR INICIAR
ACOBAMBA	75	50	6	4	2	13	15	7	0	1	0	6	7	4	1	1	0	1	97	61	7	6	20	2
ANGARAES	47	22	1	4	0	20	9	4	0	1	0	4	11	5	1	1	0	4	67	31	2	6	28	0
CASTROVIRREYNA	52	26	3	4	2	17	21	13	0	2	0	5	13	6	1	3	1	1	86	45	4	9	23	3
CHURCAMP	41	18	2	12	5	4	30	17	0	0	0	13	5	2	1	1	0	1	76	37	3	13	18	5
HUANCAVELICA	90	62	5	1	0	22	42	31	0	1	0	9	29	5	9	5	0	8	161	98	14	7	39	0
HUAYTARA	37	20	4	4	0	9	18	9	1	1	0	7	53	10	4	7	0	32	108	39	9	12	48	0
TAYACAJA	78	66	2	8	0	2	34	20	1	2	0	11	14	5	2	3	0	4	126	91	5	13	17	0
TOTAL	420	264	23	37	9	87	169	101	2	8	0	55	132	37	19	21	1	51	721	402	44	66	193	10


# CUADRO DE RESUMEN ESTADISTICO DE OBRAS

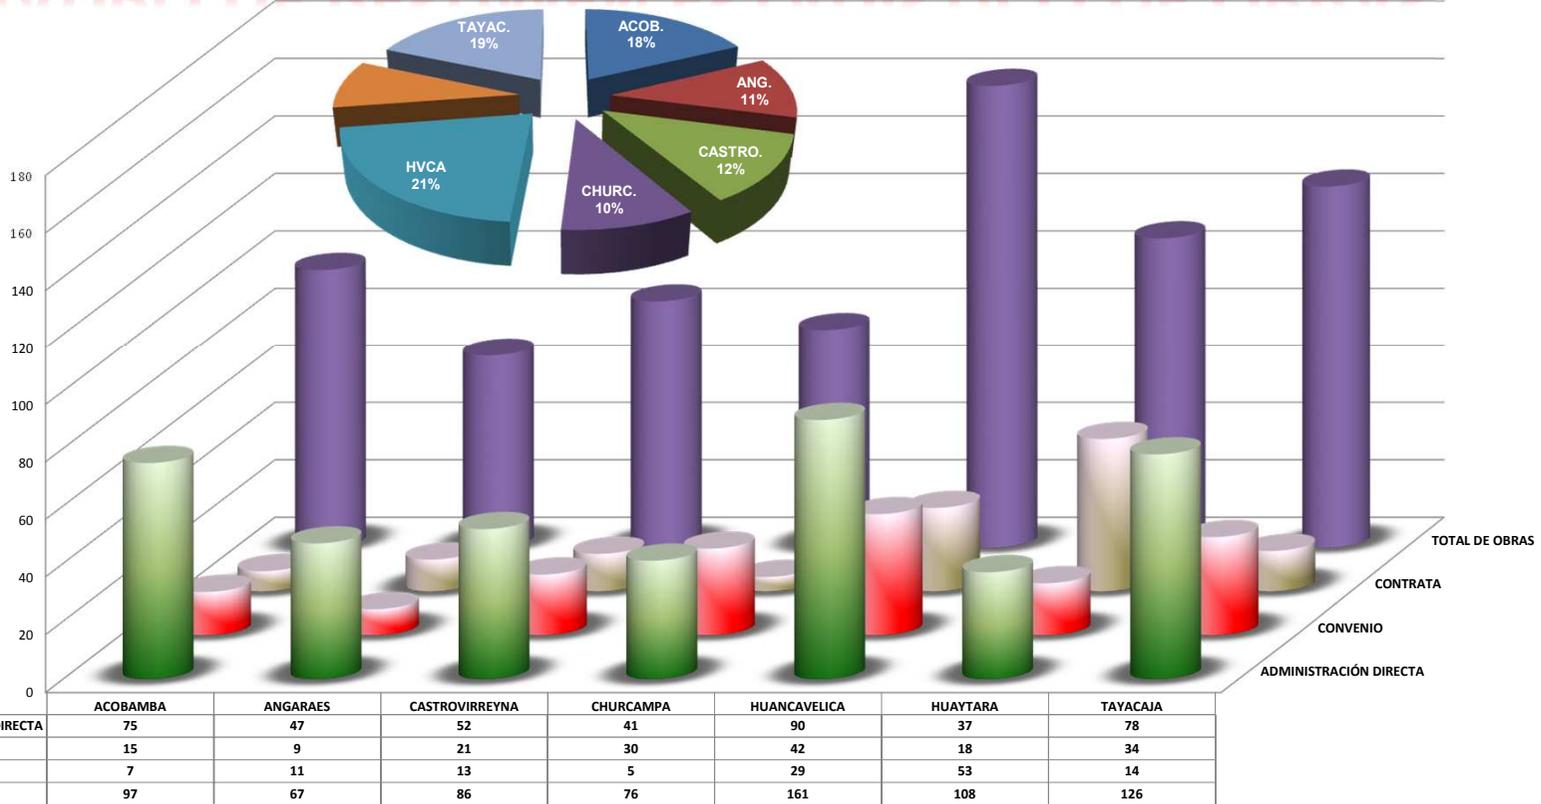


### **REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS**

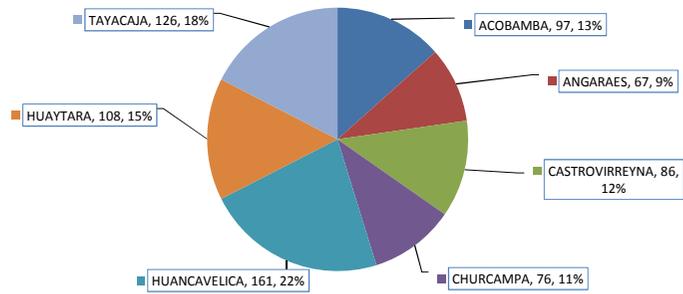

### **REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL**

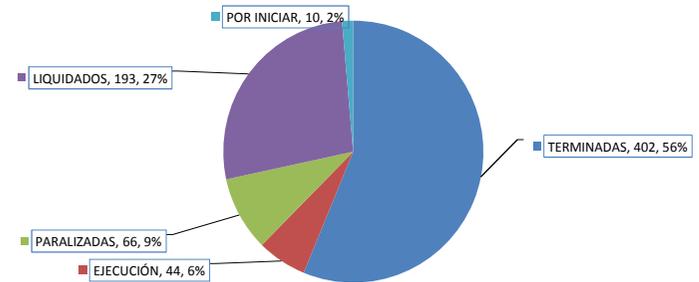

### **EJECUCIONES DE OBRAS POR MODALIDAD**

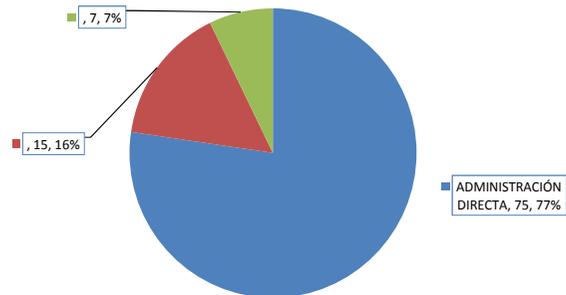

### **REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

