



I Audiencia Pública Regional HUANCAVELICA 2011

Trabajamos para todos...!

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27860 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27862 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.



GERENCIA SUB REGIONAL
CASTROVIRREYNA

SIMEÓN CONTRERAS CASTILLO
GERENTE

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el Artículo 191° de la Ley N° 27860 Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Art. 11 de la Ley 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Art. 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y conforme dispone el Art. 24 de la Ley N° 27862 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) vs EJECUCIÓN DEL GASTO

	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE
REMUNERACIONES	15,365,513.00	14,125,306.70	1,240,206.30	91.93%
PENSIONES	907,676.00	722,490.02	185,185.98	79.60%
BIENES Y SERVICIOS	4,456,046.00	3,629,826.57	826,219.43	81.46%
OBRAS	8,945,271.00	6,239,628.24	2,705,642.76	69.75%
TOTAL GENERAL	29,674,506.00	24,717,251.53	4,957,254.47	83.29%

Ejecución Presupuestal Desagregada por Fuente de Financiamiento OBRAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE
DONACIONES Y TRANSFERENCIA	28,459.00	8,160.00	20,299.00	28.67%
CANON	1,217,824.00	506,305.02	711,518.98	41.57%
RECUSOS ORDINARIOS	6,134,813.00	4,280,867.99	1,853,945.01	69.78%
FIDEICOMISO	1,564,175.00	1,444,295.23	119,879.77	92.34%
TOTAL GENERAL	S/8,945,271.00	S/6,239,628.24	S/2,705,642.80	69.75%

Ejecución Presupuestal Desagregada Bienes, Servicios y Programas Estratégicos

UNIDADES	PROGRAMAS	FTE. FTO.	PIM	EJECUTADO	SALDO	PORCENTAJE %
SEDE	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	783,654.00	656,583.26	127,070.74	83.78
AGRARIA	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	54,000.00	50,748.30	3,251.70	93.98
SALUD	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	420,153.00	268,240.16	151912.84	63.84
	PAN-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	900,699.00	773,712.00	126,987.00	85.90
	SMN-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	343,473.00	276,089.75	67,383.25	80.38
	EUROPAN	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	608,348.00	451,574.75	156,773.25	74.23
EDUCACION	PROGRAMATICO	RECURSOS ORDINARIOS	306,411.00	186,313.38	120,097.62	60.81
	PELA-ESTRATEGICO	RECURSOS ORDINARIOS	1,039,308.00	966,564.67	72,743.33	93.00
TOTAL GENERAL			4,456,046.00	3,629,826.27	826,219.73	81.46



METAS, LOGROS - OBRAS 2011

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL (S/.)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO ALCANZADO	ESTADO	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO LOS LIBERTADORES DE TICRAPO	779,039.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	92.54%	PARALIZADA	EN GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA NECESARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO	1,313,909.24	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	82.00%	PARALIZADA	EN GESTIÓN PARA A AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA NECESARIA PARA LA CULMINACIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	2,299,113.06	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00%	CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	603,309.96	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	90.00%	EN EJECUCIÓN	
INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	634,413.82	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	42.38%	EN EJECUCIÓN	PROYECTO EN EJECUCIÓN HASTA MAYO 2012
SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - II ETAPA	1,684,316.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	91.00%	EN EJECUCIÓN	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO	1,321,982.04	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100.00%	CONCLUIDA	INAUGURADA

METAS, LOGROS - OBRAS 2011

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA	2,446,241.97	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Mejoramiento y Construcción de Carretera en una long. de 29.70 Km afirmado con sus respectivas obras de arte, un puente, muros y cunetas	75.00%	EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE - CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA . HUANCAVELICA	574,407.47	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Revestimiento de 4.7 Km. de canal rectangular de 0.40 x 0.60 de concreto armado; construcción de una bocatoma; construcción de tres desarenadores, construcción de 2 puentes colgantes, construcción de 12 tomas laterales	13.90%	EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESENTACION DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	918,610.59	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Construcción de una trocha de acceso a la zona del proyecto de 6.30 Km., construcción de 295.26 ml de canal de Riego de 1.4 x 1.0 m. Construcción de una presa de tierra de 40 m de long y 10 m. de alto y obras de arte, y sistema de compuerta	47.57%	EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA	822,013.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Construcción de 6.54 Km. de carretera; y obras de arte	0.00%	FIRMA DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA	694,630.22	CONTRATO	Construcción de puente carrozable de 25 m de luz; construcción de 125 m de acceso trocha carrozable; rehabilitación de 84 m de canal de conducción 0.60 x 0.50 m, instalación de 36 m de gaviones para protección de estribos de puente	62.54%	EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA TANTARA - II ETAPA	153,799.00	CONTRATO	Construcción de 0.80 km. de canal principal de concreto, construcción de 19 tomas laterales, construcción de 3 canoas, construcción de un puente peatonal	80.00%	EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA "LOS LIBERTADORES" DE TICRAPO

Datos Generales: DISTRITO DE TICRAPO

Monto de inversión: 779,039.04


Avance físico: 92.54%

Objetivo: Construcción de 01 pabellón de ambientes administrativos (sala de profesores, auditorio, biblioteca, sala de cómputo).

Situación actual: Se construyó el pabellón; faltando realizar trabajos de acabados (enchapes en Servicios Higiénicos, colocado de puertas, pintura).

Logros y beneficios:

- Adecuada infraestructura y mobiliario.
- Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- Áreas Administrativa y complementarias en condiciones adecuadas.

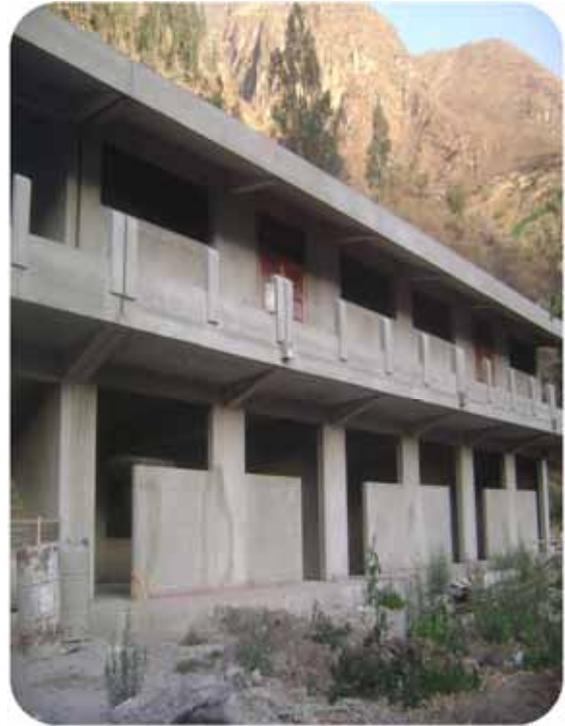

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE TICRAPO

Datos Generales: DISTRITO DE TICRAPO

Monto de inversión: 1,313,909.24

Avance físico: 82.00%

Objetivo: Construcción de 01 pabellón de 06 aulas, construcción de un pabellón destinado a ambientes administrativos, 02 servicios higiénicos, 01 escalera, 01 biblioteca, 01 patio de honor, construcción de cerco perimétrico, y equipamiento

Situación actual: Se construyeron los 02 pabellones ; el Cerco perimétrico, el patio de honor la biblioteca, falta realizar los trabajos de acabados (en lúcidos, pisos, veredas, enchapes y pintura en todo la Infraestructura)

Logros y beneficios:

- Adecuada infraestructura y mobiliario.
- Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- Infraestructura administrativa y complementarias en condiciones adecuadas



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA

Datos Generales: DISTRITO DE AURAHUA

Monto de inversión: 2,299,113.06


Avance físico: 100.00%

Objetivo: 8.33 km de trocha, 02 puentes, sus respectivas obras de arte y cunetas

Situación actual: Se construyó 8.33 Km de trocha, y construcción de 02 puentes de 25 ml y 15 ml respectivamente, obras de arte y cunetas.

Logros y beneficios:

- Se ha logrado interconectar los pueblos huayacca, antacancha, cochamarca con la capital del distrito de Aurahua.
- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo.
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona.

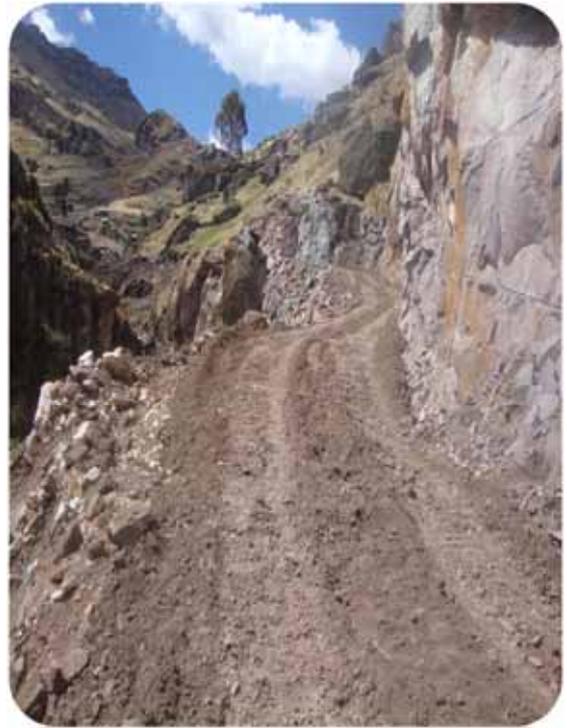

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 22120 ANEXO TOTORA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA

Datos Generales: DISTRITO DE ARMA

Monto de inversión: 603,309.96

Avance físico: 90.00%

Objetivo: Construcción de 02 aulas, dirección, secretaria, 02 servicios higiénicos. Losa deportiva, cerco perimétrico, tanque séptico y pozo de percolación, equipamiento y flete terrestre.

Situación actual: Se construyó las 02 aulas, dirección, secretaria, cerco perimétrico, tanque séptico y pozo de percolación; se viene realizando trabajos de acabados

Logros y beneficios:

- Adecuada infraestructura y mobiliario.
- Infraestructura pedagógica adecuada de habitabilidad y confort.
- Infraestructura administrativa y complementarias en condiciones adecuadas.



INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE CHUPAMARCA

Monto de inversión: 634,413.82

Avance físico: 42.38%

Objetivo: Habilitación de 07 viveros forestales comunales y la producción de 176,000.00 plántones para la instalación en 158.42 ha, acompañado de 24 meses de asistencia técnica operativa.

Situación actual: Se instalaron los 07 viveros forestales comunales; se viene sensibilizando a la población beneficiaria

Logros y beneficios:

- Incrementar los conocimientos de los beneficiarios en los ámbitos de intervención de proyecto.
- Habilitación de siete viveros comunales para la producción de 176.000.00 de plántones.
- Formación de 07 Comité de Gestión Forestal.



SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHAY LOS ANGELES DE SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - II ETAPA

Datos Generales: DISTRITO DE CASTROVIRREYNA , HUACHOS Y ARMA

Monto de inversión: 1,684,316.59

Avance físico: 91.00%

Objetivo: Electrificación de 10 localidades (Cabracancha, Cocha, Chaupicancha), pucacancha, Vista alegre, San isidro de Cocha (Cocha baja, Huiscancha), Cruzpata (Cruzpata y Ccellocaya), Patacorral, Totorá, Ocoro, Suytupampa (Suytupampa, Tranca), Cebadapata (Cebadapata y Huancapata)

Situación actual: Se instaló toda la Red secundaria (incluidos postes, cableado, acometidas de instalaciones domiciliarias) a excepción de la comunidad de Totorá. La red primaria está colocada en un 80% .

Logros y beneficios:

- Implementación de líneas y redes de distribución primaria.
- Instalación de Subsistemas de distribución secundaria y acometidas domiciliarias



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CHIRIS - VILLOCO

Datos Generales: DISTRITO HUACHOS Y
MOLLEPAMPA

Monto de inversión: 1,321,982.04

Avance físico: 100.00%

Objetivo: Mejoramiento y construcción de carretera en una Long. de 8.54 Km sin afirmar, con sus respectivas obras de arte y cunetas

Situación actual: Se culminó con todas las metas estipuladas en el Expediente Técnico

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo.
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTARÁ CASACANCHA

Datos Generales: DISTRITO TANTARA Y
ARMA

Monto de inversión: 2,446,241.97

Avance físico: 75.00%

Objetivo: Mejoramiento y construcción de carretera en una long. De 29.70 Km afirmado y un puente de 11 ml de luz, obras de arte y cunetas

Situación actual: Se logró la construcción de 18.20 Km., 11.50 km de mejoramiento de carretera y 14 km de carretera afirmada

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona



MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICHO, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA . HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE MOLLEPAMPA

Monto de inversión: 574,407.47

Avance físico: 13.90%

Objetivo: Revestimiento de 4.7 Km. de canal rectangular de 0.40 x 0.60 de concreto armado; construcción de una bocatoma; construcción de tres desarenadores, construcción de 2 puentes colgantes, construcción de 12 tomas laterales

Situación actual: Movimiento de tierras y se encuentra en vaciado de concreto de caja de canal.

Logros y beneficios: Se va ampliar la frontera agrícola así como mejorar áreas de cultivo, manejo eficiente del Recurso Hídrico.



CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

Datos Generales: DISTRITO DE AURAHUA

Monto de inversión: 918,610.59

Avance físico: 47.57%

Objetivo: Construcción de una trocha de acceso a la zona del proyecto de 6.30 Km., construcción de 295.26 ml de canal de riego de 1.4 x 1.0 m. Construcción de una presa de tierra de 40m de long. y 10 de alto y obra de arte.

Situación actual: construcción del acceso carrozable de 6.30km y construcción de presa de tierra con un avance de 20%.

Logros y beneficios:

- incremento de áreas de cultivo
- Mejoramiento de áreas de cultivo.
- Mejoramiento de la flora y fauna alrededor del vaso de agua.



CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE TAMBO ESMERALDA

Datos Generales: DISTRITO DE
CASTROVIRREYNA

Monto de inversión: 694,630.22

Avance físico: 62.54%

Objetivo: Construcción de puente carrozable de 25 m de luz; construcción de 195 m de acceso trocha carrozable; rehabilitación de 84 m de canal, instalación de 36 m de gaviones.

Situación actual: construcción de ambos estribos, y encofrado de loza de puente.

Logros y beneficios:

- facilita el transporte de un mayor volumen de carga con disminución y costo así como mejora el nivel socio económico de la población.



MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA TANTARA - II ETAPA

Datos Generales: DISTRITO DE TANTARA

Monto de inversión: 153,799.00


Avance físico: 80.00%

Objetivo: Construcción de 0.80 km. de canal principal de concreto, construcción de 19 tomas laterales, construcción de 3 canoas, construcción de un puente peatonal

- **Situación actual:** Movimiento de tierras de 0.80 Km. Y caja de canal de concreto 0.65Km.

Logros y beneficios:

Se va a lograr la recuperación de 50 hectáreas de cultivo.

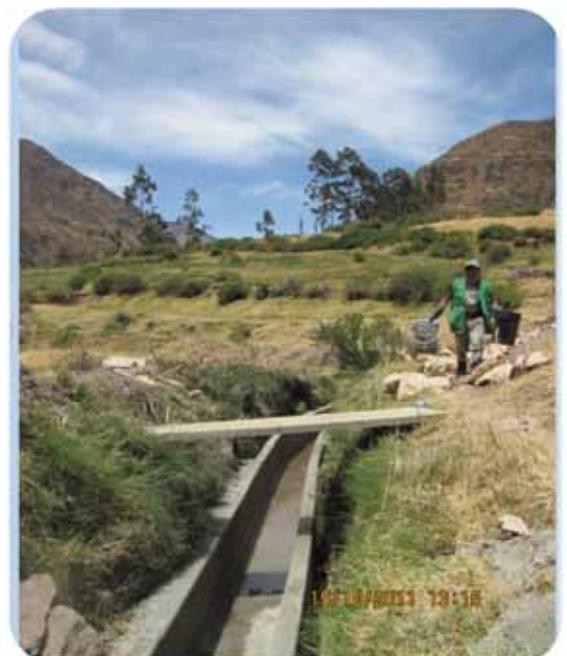

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MAYUCANCHA - PAMPA JUNÍN - SANTO DOMINGO, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

Datos Generales: DISTRITO DE CHUPAMARCA

Monto de inversión: 822,013.30


Avance físico: 0.00%

Objetivo: Construcción de 6.54 Km. de carretera; incluidos obras de arte

Situación actual: se encuentra en proceso de firma de contrato.

Logros y beneficios:

- Disminución del costo de transporte, existencia de flujo vehicular, incremento de la comercialización.
- Eficiente articulación vial con los mercados de consumo
- Incremento de la Comercialización de productos de la zona

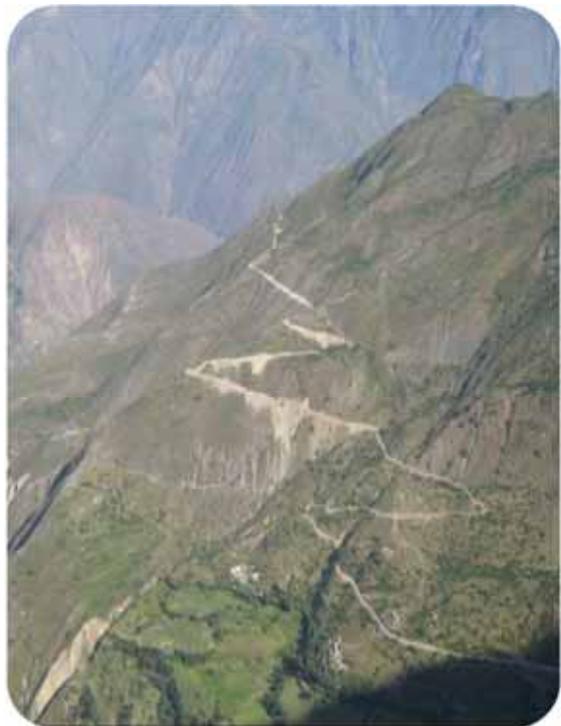

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2011

N°	NOMBRE DEL PIP	UBICACIÓN	MONTO	ESTADO SITUACIONAL	CODIGO SNIP
1	INSTALACION DE CANAL DE RIEGO AMPARANA - CHIRIS - VILLOCO - SUNAMA EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPAMPA Y HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Distrito de Mollepampa y Huachos	43,850.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	186134
2	MEJORAMIENTO DE LA L.E SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA	Provincia de Castrovirreyna - HUCA	20,300.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	189308
3	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA L.E. N° 372, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Distrito de Cocas	15,200.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	191141
4	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE SINTO DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	20,800.00	En Evaluacion por la OPI	194708
5	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 351, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCAVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	16,300.00	En levantamiento de observaciones formulados por la OPI.	194274
6	CREACION DE LA CARRETERA SINTO - TORRESMARCA, EN LOS DISTRITOS DE COCAS Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Distrito - Provincia de Castrovirreyna	19,500.00	En Formulacion	
7	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA - PAMPACANCHA - CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA - DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	Distrito de Capillas	5,153.00	En reformulacion de perfil por haberse vencido (ha sobrepasado los 03 años permitidos).	53601
8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA Y PUENTE CARROZABLE LLACTAS HUAYRANCA	Ticrapo	5,000.00	En reformulacion de perfil por haberse vencido (ha sobrepasado los 03 años permitidos).	38519
PRESUPUESTO TOTAL			146,103.00		

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA - 2011

N°	NOMBRE DEL PIP	UBICACIÓN	MONTO	ESTADO SITUACIONAL	CODIGO SNIP
1	CONSTRUCCION IRRIGACION CHACAPERDIDA TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Ditrto de Huachos	45,000.00	En Evaluacion por la CPI	135883
2	SISTEMA DE IRRIGACION YUPANA, INCLUE 03 REPRESAS QUISHUAR, ACOMACHAY Y TINCO	Ditrto de Arma	27,000.00	Perfil Viable	91794
3	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA VICUÑA EN EL ANEXO DE ESMERALDA, DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Ditrto de Castrovirreyna	5,409.00	Perfil Aprobado	167307
4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAYAO - COTAS - HUINCHULLAY - ZANULLA Y DOS PUENTES DEL DISTRITO DE ARMA	Ditrto de Arma	13,000.00	Perfil Viable	189069
5	SUSTITUCION INTEGRAL DE AULAS DE LA I.E. N° 22583 DE OCORO, DISTRITO DE HUACHOS PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	Ditrto de Huachos	13,000.00	En levantamiento de observaciones formulados por la CPI.	186255
PRESUPUESTO TOTAL			103,409.00		

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

RELACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REQUERIDOS A SER ELABORADOS POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA 2011

N°	DESCRIPCION	UBICACIÓN	PRE INVERSION PIP			ELABORACION DE EXPEDIENTE		
			CODIGO SNIP	MONTO	FECHA DE VIABILIDA	UNIDAD EJECUTORA	MONTO	ENTIDAD
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA								
1	CONSTRUCCION IRRIGACION PACAYCOCHA - VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	HUACHOS - VILLOCO	135910	S/. 2,204,056.00	22/04/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 120,000.00	CONFORME
2	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	TANTARA	133818	S/. 487,919.95	26/05/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 25,000.00	CONFORME
3	MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE PRESA Y CANAL), EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA	149030	S/. 406,376.50	20/05/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 35,000.00	CONFORME
4	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	154605	S/. 471,961.17	20/12/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 10,000.00	CONFORME
SISTEMA VIAL								
5	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA - VACANUASI DE LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CASTROVIRREYNA - SANTAANA	110553	S/. 2,271,476.00	20/05/2011	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 35,000.00	CONFORME
6	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA - MOLLEPAMPA - CHICHO - HUANCAPARA, DISTRITO MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	MOLLEPAMPA	109455	S/. 647,836.00	13/02/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 20,000.00	CONFORME
7	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CERRO - QUICHQUI CHALMA	TICRAPO	130301	S/. 1,027,570.95	21/06/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	CONFORME
8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CORREGIDOR, SANTUARIO HUACA HUACA - JUAN DE LOZA, DISTRITO TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	TICRAPO	131375	S/. 751,359.74	04/02/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 20,000.00	CONFORME
9	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUENTE CHUPAMARCA - VILLAFOR - CHUCAPAMPA DE 6.42KM, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA	CHUPAMARCA	136933	S/. 1,199,875.03	13/11/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	CONFORME

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

MEDIO AMBIENTE

10	RECONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE MOLLEPAMPA, DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAYELICA	MOLLEPAMPA	93938	S/. 865,955.00	18/09/2009	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 30,000.00	CONFORME
----	---	------------	-------	----------------	------------	---	---------------	----------

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	128628	S/. 1,253,831.00	31/03/2010	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	S/. 37,000.00	CONFORME
----	---	----------------	--------	------------------	------------	---	---------------	----------

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 11,788,217.32

S/. 400,000.00



EQUIPO TÉCNICO G.S.R. CASTROVIRREYNA



GRACIAS
