



## **GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



# **MEMORIA ANUAL 2010**



**Huancavelica, Marzo del 2011**

## INDICE

### PRESENTACION

<b>I. DEL GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>Pág.</b>
1.1. Naturaleza y Finalidad	4
1.2. Base Legal	4
1.3. Misión, Visión	4
1.4. Lineamientos de Política Institucional	5
1.5. Organigrama Estructural	5
1.6. Planas de Consejeros y Funcionarios Regionales	7
<b>II. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS</b>	
2.1. Acciones Legislativas Fiscalización, Control y Transparencia	8
2.2. Acciones de Desarrollo Económico	10
2.3. Acciones de Desarrollo social	27
2.4. Acciones de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	51
2.5. Defensa Civil y Seguridad Nacional	56
2.6. Organos de Asesoramiento y Apoyo	58
<b>III. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES</b>	
3.1. Logros	62
3.2. Limitaciones	64
<b>IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS</b>	68
<b>V. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES</b>	74
<b>VI. BALANCE GENERAL</b>	98

## PRESENTACION

Dando cumplimiento a las Directivas N° 006-2007 y 001-2008-EF/93.01, Directivas para la Preparación y Presentación de Información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y de metas de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República; me complace presentar la Memoria Institucional Anual del año 2010, del Gobierno Regional de Huancavelica; en ella se plasman las principales actividades y logros de la entidad, desarrolladas en el marco del Desarrollo Integral y Sostenido del Departamento, mismas que se orientaron a la mejora de las condiciones socio-económicas y ambientales de las población Huancavelicana.

La Memoria Anual 2009, se presenta en una secuencia ordenada de principales actividades y proyectos, distribuidos según Organos Estructurados, así como un resumen de los principales logros y limitaciones en la gestión, finalizando con la Evaluación del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, Programa de Inversiones y el Balance General.

Es de resaltar, la labor activa y comprometida que tuvieron las Organizaciones de la Sociedad Civil, y Gobiernos Locales, quienes conjuntamente con Funcionarios, Directivos y Trabajadores en pleno, permitieron llevar adelante la gestión regional, en un marco de democracia participativa y concertada; para todos ellos mi especial agradecimiento.



**FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ  
PRESIDENTE REGIONAL DE  
HUANCVELICA**

## I. DEL GOBIERNO REGIONAL

### 1.1. NATURALEZA Y FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo

### 1.2. LEY DE CREACION Y FUNCIONES

#### LEY DE CREACION

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902.

#### FUNCIONES GENERALES

- **Función Normativa y Regulatoria:** Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.
- **Función de Planeamiento:** Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- **Función Administrativa y Ejecutora:** Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
- **Función de Promoción de las Inversiones:** Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
- **Función de supervisión, Evaluación y Control:** Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

### 1.3. MISION, VISION, Y LINEAMIENTOS DE POLITICA

#### MISION

Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores

#### VISION


La Región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

## 1.4. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

- Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales
- Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.
- Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el analfabetismo.
- Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
- Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades
- Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional
- Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC
- Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos


## 1.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, entra en vigor a partir de enero del año 2009, como parte del proceso de Reestructuración Administrativa Institucional.

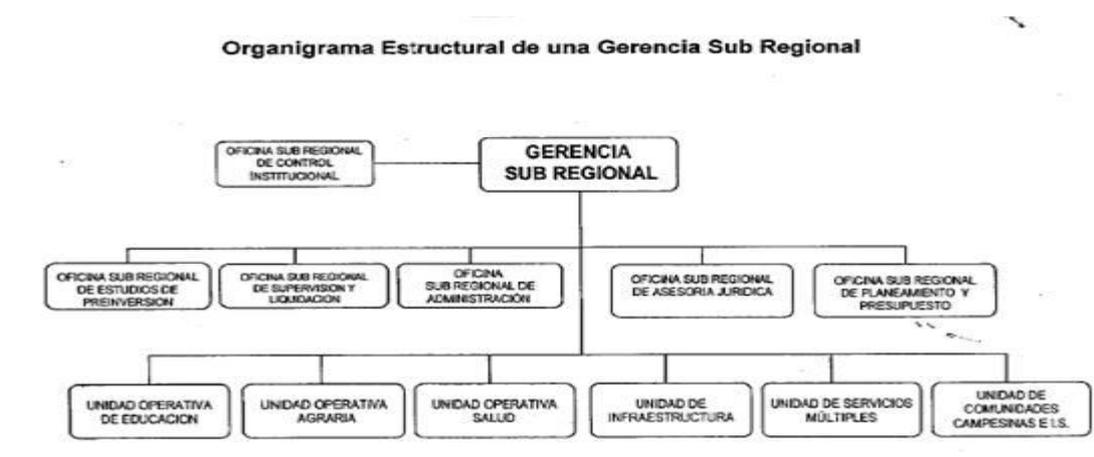

**ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA REGION HUANCAMELICA**

Organigrama Estructural del Gobierno Regional Huancavelica

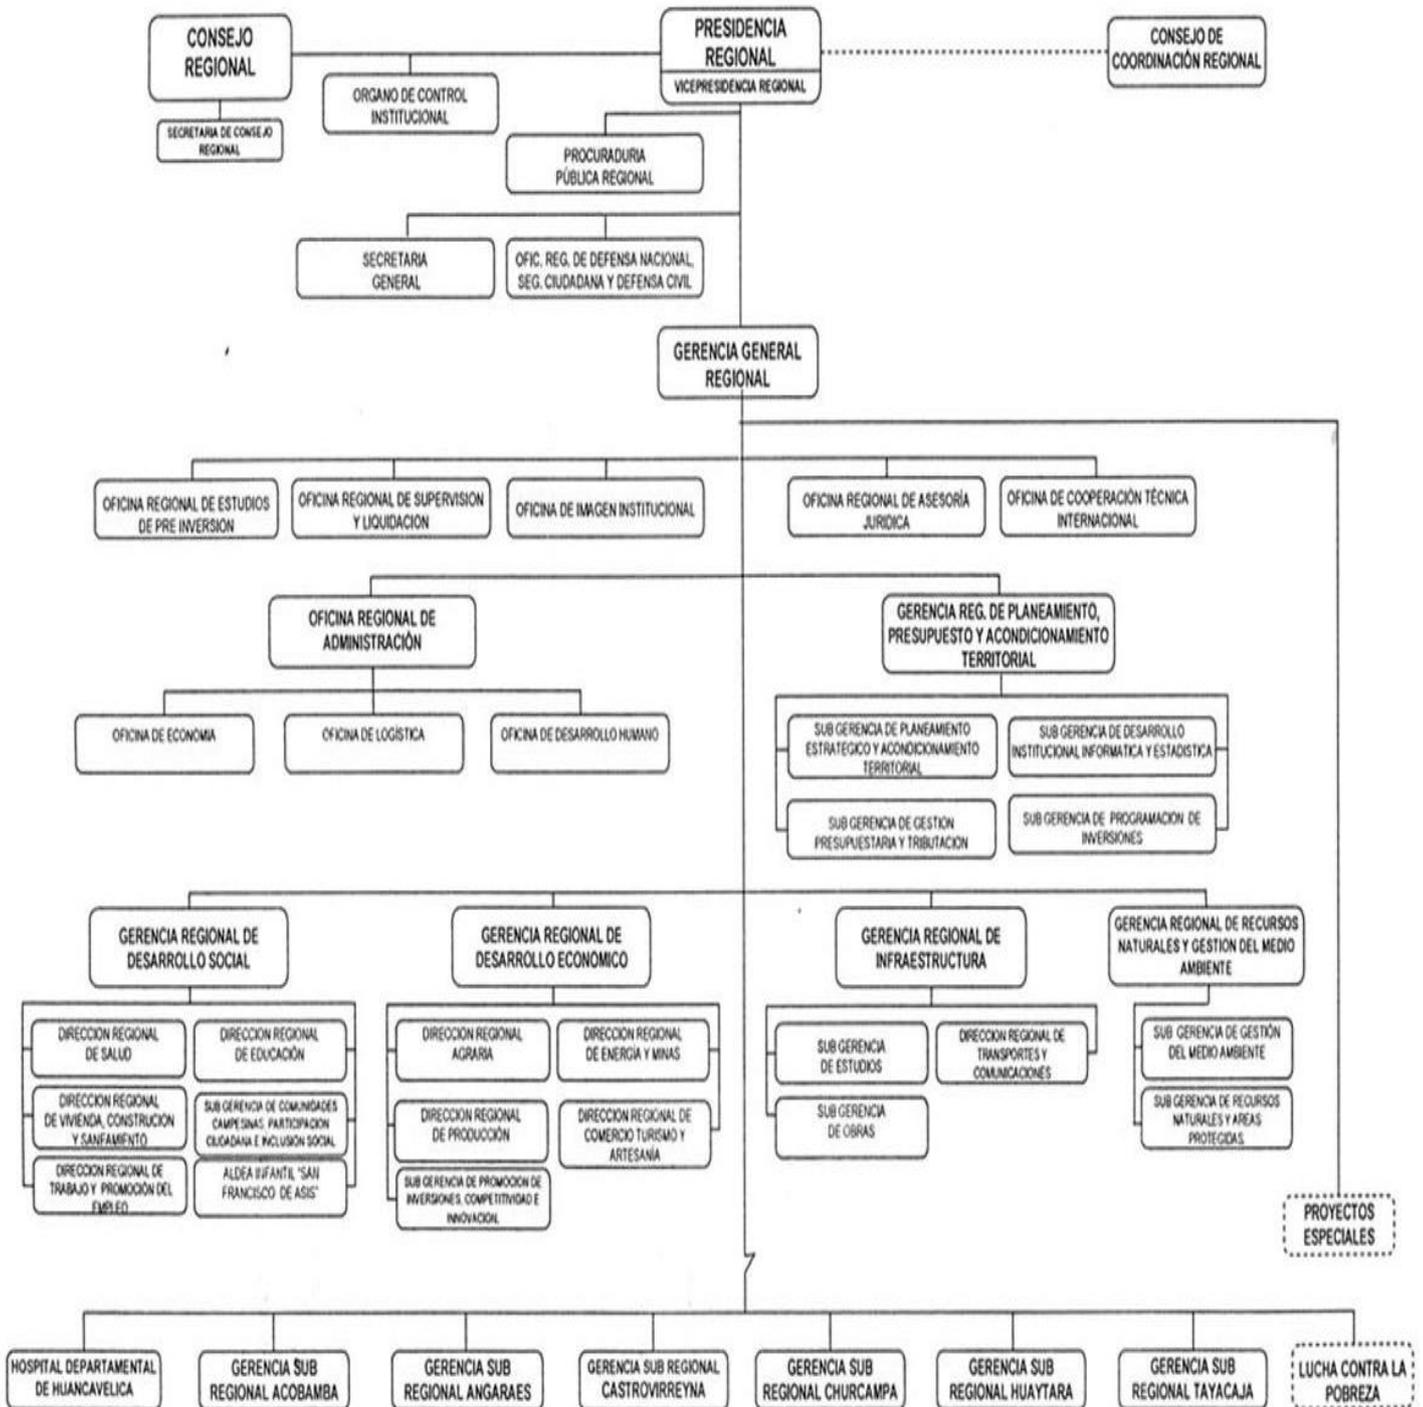

## 1.6. PLANAS DE LA ALTA DIRECCION Y CUERPO DE GERENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

**PRESIDENTE REGIONAL:** Federico Salas Guevara Schultz  
**VICE PRESIDENTE REGIONAL:** Arq. Alfredo Larrauri Zorrilla

### CONSEJEROS REGIONALES:

- Ing. Gladys Gonzáles Lezama: Consejera de Tayacaja
- Prof. Maria Villavicencio Valle: Consejera de HUCA
- Ing. Benito Navarro Muñoz: Consejero de Acobamba
- Abog. Abel Yance Ortíz: Consejero de Churcampa
- Ing. Orlando Salazar Quispe: Consejero de Castrovirreyña
- Lic. Edith Auris Bellido: Consejera de Huaytará
- Abog. Alfredo Bonzano Cárdenas: Consejero de Angaraes

### GERENTES REGIONALES

- Eco. Vicente Malásquez Gil: Gerente General
- Ing. Ciro Soldevilla Huayllani: Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y A.T.
- Ing. Jorge Quinto Palomares: Gerente Regional de RR.NN y Gestión Medio Ambiente
- Ing. Hortencia Valderrama Torre: Directora Regional de Administración
- Ing. Patricia Olivera Montero: Gerente Regional de Infraestructura
- Ing. Nelson Huamaní Villalva: Gerente Regional de Desarrollo Económico
- Abog. Felipe Allca Velazco: Director Regional de Asesoría Jurídica
- Lic. Alfredo Villanueva Ayala: Gerente Regional de Desarrollo Social

### GERENTES SUB REGIONALES

- Ing. Denny Matos Paz: Gerente Sub Regional de Angaraes
- CPC. Aurora Soriano Llanovarcid: Gerente Sub Regional de Acobamba
- Ing. Luis Laurente Chahuayo: Gerencia Sub Regional de Castrovirreyña
- Ing. Julio Aliaga Rodríguez: Gerente Sub Regional de Churcampa
- Ing. Agustín González Bravo: Gerente Sub Regional de Huaytará
- Lic. Héctor Zárate Palomino: Gerente Sub Regional de Tayacaja

### PLANA DE GERENTES REGIONALES



## II. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

### 2.1. ACCIONES LEGISLATIVAS, FISCALIZACION, CONTROL Y TRANSPARENCIA

#### CONSEJO REGIONAL

El Consejo Regional durante el año 2010, llevó a cabo dieciocho (18) Sesiones Ordinarias, seis (06) Sesiones Ordinarias Descentralizadas y Once (11) Sesiones Extra Ordinarias y 01 Sesión Extraordinaria Descentralizada. Las Sesiones Ordinarias Descentralizadas se llevaron a cabo en el Distrito de Huaribamba - Tayacaja, Distrito de Marcas – Acobamba, Distrito de San Juan de Castrovirreyna – Castrovirreyna, Distrito de Santiago de Chocorvos – Huaytara, Distrito de Anchonga – Angaraes y Distrito de Cosme – Churcampa; y una Sesión Extraordinaria Descentralizada en el Distrito de Paucarbamba – Churcampa, con la finalidad de abordar problemáticas de la población y autoridades.

Por otro lado se aprobaron 177 Acuerdos Regionales y 13 Ordenanzas Regionales, las principales se detallan a continuación:

#### PRINCIPALES ACUERDOS Y ORDENANZAS 2010

Acuerdo N°	SUMILLA
5	<b>DISPONER</b> el inicio del Proceso de Planificación Vial en el Departamento de Huancavelica, con la finalidad de orientar y determinar de manera ordenada y transparente, la demanda de intervención de los caminos departamentales.
6	<b>DECLÁRESE</b> en situaciones de Emergencia al Departamento de Huancavelica, por desastres ocasionados por la naturaleza, para la ejecución acciones inmediatas destinadas a la atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.
11	<b>APROBAR</b> la conformación del Comité Regional de Vigilancia y Control del Proceso de Presupuesto Participativo del Departamento de Huancavelica, para el periodo 2010.
15	<b>ASIGNAR</b> la Subvención Económica de S/. 3,000.00 mensuales durante el Ejercicio Fiscal 2010, a favor de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados “Hogar Santa teresa de Jornet” para contribuir al sostenimiento de la mencionada Institución.
33	<b>APRUEBESE</b> la Memoria Anual del Gobierno Regional de Huancavelica-2009, la misma que contiene Ciento Diecisiete (117) folios, dividido en Seis (06) Capítulos.
38	<b>APROBAR</b> la Implementación del D.U 105-2009; destinando S/. 900.000.00 de la Fte RDR, para el financiamiento de Programas De Vivienda en el ámbito rural de esta Jurisdicción regional .
44	<b>EXPRESAR</b> la felicitación y reconocimiento a los alumnos de la Institución educativa Augusto Salazar Bondy del distrito de Huaribamba, por haber ocupado el Primer puesto en el área de interpretación musical tradicional Juegos Florales Escolares Nacionales 2009,
53	<b>ACEPTAR</b> la donación de material e instrumental médico, instrumental odontológico y material de vestir y acampar, efectuado por el PROGRAMA UMBRAL DE IMMUNIZACIONES (USAID) a favor del Gobierno Regional de Huancavelica, por un monto de S/. 161,277.88
55	<b>ACEPTAR</b> la transferencia de los recursos financieros de FORSUR, para ser destinados al financiamiento de los Proyectos del anexo adjunto al Acuerdo de Consejo Regional.
69	<b>APROBAR</b> el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) 2010-2013, del Gobierno Regional de Huancavelica, instrumento de trabajo que permitirá orientar inversiones en los próximos tres años.

76	<b>ESTABLECER</b> como política prioritaria de Salud en la Región Hvca, la "Vacunación Contra la Influenza Pandémica AH1N1 y la Semana de Vacunación en las Américas en la Región Huancavelica".
84	<b>APROBAR</b> la ejecución de los Proyectos del año 2010, de la actividad Núcleos Ejecutores, en cumplimiento del D.U. N° 085-2009.
116	<b>ACEPTAR</b> la donación de insumos médicos: medicamentos y equipo médico, efectuado por Direct Relief International, con un peso de 4520.6 JG y un valor de US \$/. 777,305.12
136	<b>ACEPTAR</b> la Donación de materiales médicos, medicinas y apoyo humanitario varios, efectuado por el Comité de Misiones Médicas Peruvian American Medical Society, por un valor de USD \$ 16 925.20
143	<b>INSTITUCIONALIZAR</b> el día Internacional de la Paz, el 21 de Setiembre de todos los años, en la Región Hvca.
163	<b>APROBAR</b> el presupuesto correspondiente al 4% del monto designado para Proyectos del año fiscal 2011, con la finalidad de implementar el PROCOMPITE, conforme dispone el D.S. N° 192-2009-EF.

ORDENANZA N°	SUMILLA
149	APRUEBA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR) DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.
150	DISPONE EL INICIO DEL PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 Y APRUEBA SU REGLAMENTO.
152	APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
153	APRUEBA LA MODIFICATORIA DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) DE LAS GERENCIAS SUB. REGIONALES.
156	APRUEBA LA POLÍTICA REGIONAL EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.
157	APRUEBA LA CREACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE HUANCAMELICA (CORCYTEC-HVCA)
158	APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DEL PROCESO DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.
159	APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- HUANCAMELICA 2010-2015.
163	DISPONE GESTIONE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, ANTE LA AUTORIDAD SECTORIAL COMPETENTE, PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVERSIÓN.
164	DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA REGIONAL LA DESCONTAMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES RÍOS, LAGUNAS UBICADOS EN LA REGION HUANCAMELICA.



Consejeros Regionales en Sesión de Consejo

**AUDIENCIAS REGIONALES**

Durante el año 2010, el Gobierno Regional de Huancavelica desarrolló 02 Audiencias Públicas, 01 en Huancavelica y 01 en el Distrito de capillas, rindiendo cuenta de los avances y logros de la gestión.

**ACTIVIDADES DE CONTROL INSTITUCIONAL**

En atención al Plan Anual del Organo de Control Institucional 2010, aprobado con R.C ° 015-2010-CG, se cumplieron las siguientes actividades:

- Examen Especial a la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, Período 2008 – 2009.
- Examen Especial a los Proyectos de Inversión por Administración Directa, Período - 2008.
- Examen Especial al Cumplimiento de Recomendaciones Relacionadas a Procesos Administrativos, Período 2008 - 2009.

Remitiendo al Titular de la Entidad y a la Contraloría General de la Republica: 03 Informes Especiales de tipo Civil, 02 Informes Especiales de tipo Penal, y 03 Informes Administrativos.

**ACTIVIDADES DE PROCURADURIA REGIONAL**

La Oficina de Procuraduría Pública Regional, desarrollo las siguientes actividades principales:

- Atención de 863 procesos contenciosos administrativos.
- Denuncia por peculado de 46 Municipalidades que incumplieron los convenios de Encargo de obras, así como las rendiciones respectivas.
- Atención de 281 procesos penales entre ordinarios y sumarios, ante la Sala y Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Hvca.
- Apertura de 52 procesos penales, por la comisión de ilícitos penales contra la Administración Pública.
- Tramite de 38 procesos penales con sentencia condenatoria, para cobro de las reparaciones civiles.
- Atención de 106 denuncias de parte.
- Atención de 13 expedientes en materia de conciliación y 354 en materia arbitral.

**2.2. ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, desarrolló una serie de actividades y proyectos, que se orientaron a fortalecer el sector productivo y empresarial, en un marco de promoción de la competitividad. Entre ellos tenemos:

- Desarrollo del Taller Energías Renovables y su Tecnología Aplicadas al Desarrollo de Proyectos Sociales Sostenibles y Ecológicos.
- Apoyo en el desarrollo de eventos feriales agropecuarios, como la XXX Feria Agropecuaria de Ñuñungayo, y la I Feria Agropecuaria Artesanal y Folklórica de Huanaspampa
- Ejecución del proyecto: Instalación de Campos Semilleros de Quinoa, Kiwicha, Tarwi, Arveja, Haba y Maiz amiláceo en el Dpto de Hvca: Proyecto de continuidad, que elevará el rendimiento por Ha, con una meta total de 71 Has semilleros, 42 cursos de capacitación, 15 Asociaciones de Productores organizados y otros, con 2875 productores beneficiarios y un costo total de S/.886,499.88.
- Ejecución del Proyecto Recuperación de Suelos Agrícolas mediante la Aplicación de Biofertilizantes en el Distrito de Ñahuimpuquio, que producirá biol en módulos demostrativos, con asistencia técnica, 300 beneficiarios. Costo Total S/.114,163.00 al culminar el proyecto.
- Ejecución del Proyecto, Producción de Hortalizas en Fitotoldos en las Zonas Altas del Sector Chopcca, Distritos de Yauli y Paucará, que mejorará la dieta de 232 pobladores rurales. Costo total S/.101,359.00, Concluido.



Proyecto Instalación Semilleros de Quinua



Taller sobre Energías Renovables



Llamas y ganado vacuno en la Feria Agropecuaria de Hvca



Personal de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico



Personal de la Dirección Regional de Agricultura

**PROMOCION DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACION**

- Monitoreo y seguimiento de proyectos productivos a cargo de la SGPICI, Red de Centros Rurales-REDCENFOR, acciones para instalación de SENATI en Hvca y otros.

- Elaboración y difusión de la Revista de Potencialidades agropecuarias, hidrobiológicos, artesanales, agroindustriales, hidroeléctricos y metálicas de la región de Huancavelica, se distribuyó un total de mil ejemplares.
- Elaboración de 5 Planes de Negocios de Productos Estrella, las mismas que fueron presentados a AGROEMPENDE del Ministerio de Agricultura.
- Elaboración de 02 PIPs menores de Proyectos Productivos para la ejecución con Núcleos Ejecutores.
- Organización de Mesas Técnicas para el impulso a la articulación comercial, se conformó la Mesas de papa nativa, palto y Tara.
- Operativización del Consejo Regional de la Competitividad
- Desarrollo del Diagnóstico situacional de los grupos organizados de productores, microempresas y empresas en Hvca, determinándose 418 organizaciones en el ámbito regional.
- Desarrollo de 02 Evento de Promoción y Difusión de la Asociatividad Empresariales y Desarrollo del emprendimiento empresarial en la educación y cadenas productivas de la región
- Promoción y participación en eventos empresariales: Perú Regiones 2010 y Perú Mucho Gusto, apoyando la sistencia de empresarios huancavelicanos.
- Desarrollo de 04 eventos de Capacitación para el Desarrollo de la Calidad (BPA,BPO,BPM;HACCP,ISO) y producción orgánica, con 224 asistentes.
- Implementación del Centro de Información Empresarial de la Región, mismo que ha sido puesto al servicio de los productores y empresarios huancavelicanos.

## AGRICULTURA Y PECUARIA

La Dirección Regional de Agricultura Huancavelica, sus Agencias Agrarias y Areas de Infraestructura, desarrollaron las principales actividades y proyectos:

### **PROMOCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**

- Recuperación de la capacidad productiva pecuaria, atendiendo a 712,601 cabezas de ganado afectados por las bajas temperaturas, a nivel regional.
- Conformación de 57 Organizaciones de productores en cadenas productivas, logrando la constitución legal de 52 de ellas.
- Conformación de 8 Mesas Técnicas regionales y provinciales.
- Desarrollo de 07 Foros de cadenas productivas, a nivel regional.
- Identificación de 20 mercados potenciales para cadenas productivas.
- Formulación de 26 Planes de Negocios para las cadenas productivas.
- Desarrollo de 151 eventos de capacitación en tecnologías de producción y/o técnicas de valor agregado.
- Prestación de 5559 asistencias técnicas en tecnologías de producción agropecuaria.
- Organización de 36 eventos feriales, a nivel departamental, provincial y distrital.
- Desarrollo de 9 pasantías para los productores organizados, fortaleciendo sus capacidades.
- Prestación de 128 servicios de inseminación artificial, a nivel regional.
- Instalación de 31 parcelas demostrativas de cultivos.
- Desarrollo de Asistencias Sanitarias a Ganados Mayores y Menores con 489,644 cabezas atendidas.
- Asistencia Técnica en Prevención y Control Fitosanitario de Cultivos, para 1365 productores.
- Firma de 34 Convenios Interinstitucionales, para la gestión concertada de actividades.
- Capacitación de 172 Informantes Calificados a nivel Distrital y Provincial.
- Elaboración de 31 Boletines de Información Estadística y Agronegocios
- Elaboración de 75 Informes de Investigación de rendimientos de diversos cultivos.
- Reforestación con Plantones Forestales, en un total de 562.31 Has.

- Plantación con Especies Frutícolas, en un total de 15.5 Has
- Desarrollo de 23 eventos de Capacitación en Manejo de Recurso Hídricos.



Actividades de sanidad animal en ganado mayor



Capacitaciones de productores agropecuarios



Parcela demostrativa de cultivos



Exposición de papa nativa en Feria Agropecuaria de Hvca



Calificación de Productos lácteos en Feria Agropecuaria



Encuesta sobre rendimientos de cultivos



Dosificación del ganado afectado por el Friaaje



Desfile por la semana Forestal Nacional-Tayacaja

### PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS y FORESTALES 2010

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Fortalecimiento a Productores de Quinoa de las Provincias de Angaraes, Hvca, Churcampa y Tayacaja	Multiprov	512,352.00	349,636.73	92 Has de quinoa instaladas, y 1840 beneficiarios. Concluye el 2011	Proyecto nuevo
Ampliación de Areas Reforestadas con las C.C Atendidas por Agro Rural en el Dpto de Hvca	Multiprov	5,679,443.00	1,191,516.50	Plantac.definitivas 1250 Has. con protección perimétrica, 30 capacitac, 32,975 benefic.	Proyecto de continuidad
Capacitac.y Asistencia Técnica para el Mejoram. de la Productividad de la Avena en grano, en distritos de Mayor producción.	Multiprov	781,251.00	545,096.82	Meta 2010, 210 Has de Instalac. de avena, capacitación y asistencia técnica. 966 benefic.	Proyecto nuevo



Viveros y plantaciones del Proyecto Forestal en Comunidades atendidas por Agro Rural



Viveros Proyecto Forestal en Distritos de Extrema Pobreza

Proyecto Mejoramiento del ganado vacuno en la Provincia de Tayacaja

### PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2010

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Reconstrucción de la infraestructura de Riego Canal Perpetuo Socorro de la Localidad de Quito Arma	Huaytará	2,304,533.00	555,126.53	Línea de conducción con Tubería de 4,000 ML, defensa ribereña 70 M.L.	Proyecto nuevo
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Riego Jonechuayjo - Runduvilca, Distrito de Colcabamba	Tayacaja	1,251,187.00	1,298,940.23	10.790 Km de canal, 192 Has bajo riego. 408 benefic.	Proyecto nuevo
Construc.Sistema de Riego en las Comunidades Alto Andinas de Pachamarca	Churcampa	2,098,187.00	1,403,490.28	17.400 Km de canal de conduc. 250 Has incorporadas bajo riego, 927 benefic.	Proyecto nuevo
Construc. Sistema de Riego Tecnificado Huaccraccasa - El Chorro- Pampapuquio - Huayrapata - Paccha, Churcampa.	Churcampa	2,092,119.00	1,835,718.64	5.6 Km de tuberías y 01 reservorio. 90 Has a irrigar. 1508 benefic.	Proyecto nuevo
Construc.Canal de Riego Picocho-Antaparco Magnopampa, Distrito de San antonio de Antaparco	Angaraes	1,523,557.00	1,450,654.72	canal de concreto de 10 Km, 200 has a incorporar, 350 benefic.	Proyecto nuevo




Sistema de Riego zona altoandina de Pachamarca



Riego Tecnificado Huacraccasa El Chorro-Churcampa



Sistema de Riego Carhuanchu de S.P.Coris

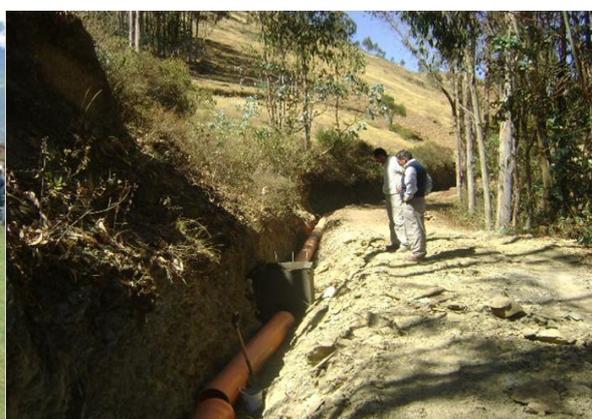

Sistema de Riego Jonechuyco Rundouvilca



Sistema de Riego Tomacucho Ayamarca-Ocayo



Sistema de Riego Perpetuo Socorro Quito Arma

## PRODUCCION E INDUSTRIA

La Dirección Regional de Producción, en el marco de su política de promoción del sector de PYMES y de la Pequeña Industria en Huancavelica, ha desarrollado las siguientes actividades:

- Emisión de 44 Resoluciones Directorales de autorización y concesión para la producción acuícola, mismos que hace sujetos de crédito a los productores artesanales.
- Acreditación a los conformantes del Comité de Vigilancia de productores pesqueros artesanales, autorizando a resguardar y proteger el recurso hidrobiológico de la especie trucha arco iris.
- Culminación de la Línea de Base Estadística – 2009, que contiene la estadística de producción, mano de obra e inversión generada que contribuye al diagnóstico y formulación de los proyectos para la región.
- Evaluación e inventario de 39 recursos hídricos de la región, con fines de identificar oportunidades de inversión para la inversión privada
- Desarrollo de 03 eventos sobre seguridad alimentaria, promoción del consumo de productos Hidrobiológicos, y capacitación en el manejo y preservación de productos hidrobiológicos, con mas 100 participantes.
- Desarrollo de 01 evento sobre Programa Alimentario y Educación al Consumidor, con productos Hidrobiológicos, dirigida a la población estudiantil de hvca, con 150 partiicipantes.
- Apoyo a 10 Asociaciones de piscicultores artesanales, para su formalización jurídica y acceso a créditos a través de FONDEPES, CAJA HUANCAYO, ONGs ALIADOS y AGRO BANCO, con 50 beneficiarios.
- Se realizaron 71 inspecciones técnicas de infraestructura piscícola a nivel regional, con el objetivo de tener un diagnóstico de ellas y mejorarlas.
- Desarrollo de pasantías a Empresas de Lima en la línea de calzados, carpintería en madera y confección en prendas de vestir, con 28 productores beneficiarios
- Apoyo en el Desarrollo del I Festival del Camarón Huancavelicano, organizado por la Asociación de criadores de camarones de Marcas y CARE Perú, realizado en el distrito de San Juan en Castrovirreyna.
- Desarrollo de 31 inspecciones y desinfección de ovas embrionadas de truchas, en los centros piscícolas de la región en cumplimiento a la sanidad acuícola.
- Elaboración de la línea de base estadística de comercialización de los años 2009 y 2010, y difusión de la misma a nivel regional, logrando determinar que la comercialización de trucha para el año 2009 fue de 247 TM, y en el 2010 de 751 TM.
- Desarrollo de 08 eventos de capacitación para productores de productos lácteos y agroindustriales, con 250 beneficiarios.
- Desarrollo del 50% del Estudio de Mercado Laboral y Análisis de Oportunidades para el sector Industrial.
- Apoyo en la Formalización y Constitución de 38 Pequeñas Empresas, a nivel regional
- Desarrollo de la Línea de Base de las MYPEs en la Región Huancavelica.
- Desarrollo de 07 eventos de difusión de las políticas y Agenda Ambiental Regional

**Proyecto:** Instalación de Jaulas Flotantes para la Producción Intensiva de Truchas en las Lagunas de Mina Ccocha (Maylorccocho) y Tanseroccocho, en las Comunidades de Pastales Huando y Tansiri.

Meta total: Construcción de 3 almacenes, con sala de procesamiento, e incubación, instalación de 21 jaulas flotantes. 1050 beneficiarios.

Financiamiento compartido con el Ministerio de la Producción. Costo total: S/.394,831.00

Situación actual: en ejecución avance del 47%



Laguna de Choclococha y Jaulas flotantes de truchas



Desinfección de Ovas embrionadas de trucha



Cursos Taller para producción de panetones



Pasantía en empresas de Lima en confecciones de ropa y calzados



Curso Taller - Normas BPM, HACCP, productos lácteos



I Festival del Camarón Huancavelicano

## COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA

La Dirección Regional de Turismo, Comercio y Artesanía, desarrolló las siguientes actividades y proyectos durante el año 2011:

### PROMOCION DE LA ARTESANIA

- Participación en el Encuentro Nacional de Promotores de la Artesanía Peruana “PROMOARTESANIA 2010”, con 05 asociaciones artesanales participantes.
- Desarrollo del Desfile de Moda, “SUMAQ PACHA 2010”, que significa “BONITA ROPA 2010”, promocionando nuestra artesanía con nombre propio y creando un marca de identificación, participaron 40 asociaciones artesanales.
- Desarrollo de 02 eventos de capacitación en “Mecanismos de Financiamiento, y “Normas Técnicas en Artesanía Textil”, con apoyo del CITE Textil y el MINCETUR, participaron 13 empresas artesanales.
- Participación de Empresas Artesanales seleccionadas, en Eventos Nacionales como, IV Expo Bellas Manualidades 2010, Feria exhibe Perú 2010, Feria Artesanías del Perú, y Feria Perú Gift Show, promocionando las artesanías huancavelicanas.
- Organización de la Feria Artesanal por Semana Santa, participando 25 conglomerados artesanales.
- Desarrollo del Tour Circuito Artesanal Yauli 2010, con 7 empresas artesanales beneficiarias.
- Desarrollo de 06 Cursos Talleres de Masificación de la Producción Artesanal Textil, con 249 Artesanos capacitados.
- Desarrollo de 05 Talleres en Iniciativas Empresariales y Creatividad, con 88 artesanos capacitados, y 03 Talleres en Técnicas Productivas de Cerámica.
- Actualización de la Pagina Web de artesanía y del catalogo artesanal, logrando el diseño de 05 web: [www. textilestaype.com](http://www.textilestaype.com), [www. tejidosintikanchari.com](http://www.tejidosintikanchari.com), [www. tejidosllactamaki.com](http://www.tejidosllactamaki.com), [www. textilesmulticolor.com](http://www.textilesmulticolor.com), y [www. tejidosyauli.com](http://www.tejidosyauli.com)



Desfile de Moda en Prendas de Alpaca

Afiche del Circuito Artesanal Turístico



Feria Perú Gisft Show



Cursos de Capacitación para artesanos



Curso Tallere en Tejido a Palito



Diseño de Web de Emp. Artesanal

**Proyecto:** Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en los Distritos de Huancavelica, Palca, Yauli y Paucará de las Provincias de Huancavelica y Acobamba  
 Proyecto en ejecución, incluye Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda virtual. 150 beneficiarios, Costo total: S/.150,611.00

**Promoción del Turismo:**

- Desarrollo de charlas en Atención al Cliente, Calidad en Servicios Turísticos, Buenas Prácticas en Hospedaje y Restaurants, a diferentes operadores de la región.
- Organización del III Encuentro de Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario, con 50 comunidades participantes de la Región, logrando identificarse 06 ideas de proyectos en Turismo Rural.
- Participación en la Semana Turística de Ica, y Feria Turística en la Ciudad Lima, promoviendo el turismo interno e internacional.
- Desarrollo de 05 charlas, en Promoción Turística, en II.EEs localizadas en zonas con potencial turística, con 1200 estudiantes sensibilizados.
- Promoción de la Semana santa Huancavelica en la ciudad de Lima.



Charlas de Sensibilización en II.EEs



Difusión de la Semana Santa en Lima

**Proyecto:** Puesta en Valor del Santuario Ecoturístico Señor de Oropesa, proyecto en ejecución, Costo Total, S/. 1,294,378.40, con 22,573 beneficiarios.

**Comercio Exterior:**

- Capacitación en materia de Comercio Exterior y Consorcios de Exportación (Taller de costos de exportación para MYPES, medios de pagos, envases y embalajes de productos). Con 210 Empresarios capacitados.
- Participación en ferias nacionales y misiones comerciales, como PROMO 2010, y EXPOALIMENTARIA, con 12 beneficiarios
- Capacitación a Alumnos, Directores y profesores de los centros educativos de nivel secundario de la Región Huancavelica, con 140 participantes.
- Desarrollo de 02 eventos “Asociatividad en Consorcios de Exportación y Formalización de Empresas y Gestión tributaria”, en las Provincias de Huaytara, y Acobamba, con 68 participantes.
- Se llevo a cabo el evento “Capacitación en Comercio exterior a profesores de educación Secundaria, en las provincias de Acobamba y Tayacaja, con 152 participantes, entregándose la Guías para Docentes y alumnos, en temas de Comercio Exterior



Curso sobre Comercio Exterior



Exposición en evento ferial de Lima

**Proyecto:** Desarrollo del Turismo Cosmogónico, Histórico, Artístico y de Aventura, Eco Agrario de Angaraes. Costo total: S/. 1,673,520.00

**Metas 2010:** Fortalecimiento e implementación para turismo vivencial y artesanías, capacitación a los operadores turísticos locales, y promoción turística a nivel nacional y regional. Distritos beneficiarios, Julcamarca, Lircay, Santo Tomás De Pata, A.S.Antaparco y Chincho.

**Proyecto:** Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en los Distritos de Palca, Yauli y Paucará. Costo Total: S/.150,611.00, con 2,573 beneficiarios.

Metas: Capacitaciones, rueda de negocios, elaboración de catálogos, ferias y tienda artesanal instalada.

**Proyecto:** Puesta en Valor del Santuario Ecoturístico Señor de Oropesa, con un costo total de S/: 1,027,175.00, y 22,573 beneficiarios, en ejecución.



Casona de Ocopa, del proyecto Desarrollo del Turismo Cosmogónico



Producción artesanal a mejorar con el Proyecto Desarrollo de la Competitividad Artesanal

## ENERGIA Y MINAS

En pro de la promoción de las inversiones minero-energéticas, con responsabilidad social y la preservación del medio ambiente, la Dirección Regional de Energía y Minas ha desarrollado las siguientes actividades y proyectos:

- Otorgamiento de certificación ambiental a 04 empresas mineras.
- Otorgamiento de 05 certificados para operaciones mineras.
- Aplicación de 12 fiscalizaciones en seguridad e higiene minera
- Elaboración de 01 Registro Estadístico de Empresas mineras.
- Desarrollo de 06 inspecciones de campo a empresas mineras metálicas y no metálicas.
- Evaluación y aprobación de PAMAS, DIAS, EIAs del sector minero
- Evaluación de 24 DIAs para actividades eléctricas.
- Evaluación y aprobación de 08 estudios ambientales para actividades de hidrocarburos.
- Desarrollo de 18 Talleres previos a los estudios ambientales de proyectos mineros y energéticos.
- Aplicación de 12 fiscalizaciones en medio ambiente de los pequeños productores mineros.
- Manejo de 04 eventos de conflictos socio-ambientales.
- Desarrollo de 17 eventos de asesoramiento a beneficiarios potenciales en temas energéticos
- Formulación del inventario y estadística de concesiones mineras metálicas y no metálicas de la región.

- Prestación de 300 servicios de asesoramiento a pequeños productores mineros y artesanales de la región.
- Evaluación técnico-legal de 105 solicitudes de petitorios de los PPM y PMA.
- Capacitación de 10 comercializadores de hidrocarburos.
- Desarrollo de 06 operativos de erradicación de comercializadores informales de venta de combustibles líquidos en coordinación con OSINERGMIN
- Levantamiento de 04 inventarios de infraestructura de comercializadores de hidrocarburos.
- Prestación de 50 servicios de asesoramiento en procedimientos y requisitos para comercio y transporte de combustibles y GLP.



Electrif. 10 Localidades CP de Cocha y Suytupampa



Viviendas con Energía Eléctrica

## TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Gerencias Sub Regionales, y Sub Gerencia de Obras, llevaron a cabo las siguientes actividades y proyectos:

- Mantenimiento Rutinario y Conservación de Carreteras, interviniendo en 08 tramos de las redes interprovinciales, con un total de 553.97 Km atendidos, y 89,317 beneficiarios.
- Otorgamiento de 4,324 licencias de conducir, 1836 nuevas, 244 duplicados, 808 revalidadas, 1436 recategorizadas, incrementándose la atención en un 30% , en función al año 2009.
- Otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte de personas, buscando la formalización del servicio.
- Apertura de procesos sancionadores a diversas empresas de transporte del ámbito regional.
- Desarrollo de 01 Taller de capacitación en Educación y Seguridad Vial.
- Desarrollo de Charlas sobre Educación y Seguridad Vial, en auspicio de las Municipalidades de Hvca, y Angaraes.
- Distribución a la ciudadanía de material informativo, en ½ millar por 12 temas diversos, como: Seguridad Vial, Contaminación vial, Decálogo Escolar de la seguridad Vial, Usuarios de las Vías etc.
- Control vehicular permanente, a nivel de las principales vías departamentales, al amparo de la seguridad de los pasajeros y cumplimiento de normas viales.



Mantenimiento y conservación de carreteras



Charlas sobre seguridad vial en II.EEs-Hvca



Material Didáctico distribuido- seguridad vial



Intervenciones en carreteras - Inspectores

**PRINCIPALES PROYECTOS VIALES EJECUTADOS 2010**

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Mejoramiento y Construc. Carretera Tucuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca y Campo Ferial Tucuccasa	Churcampa	2,214,821.00	1,407,422.69	Mejoram.36,71 Km, const.1,60 km, 3036 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucuccasa	Churcampa	2,365,800.00	1,298,506.93	24.5 Km de Carretera afirmada. Continua	Proyecto nuevo
Construcción Carretera Lachocc-San Pedro de Sacsalla-Orcobamba.Acobamba, N.Occoro, Ascensión.	Hvca	2,502,352.00	780,588.64	23 Km de carretera afirmada y 2 puentes,1215 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Construcción y Mejoramiento de la Carretera La Merced Fortaleza Turística de Torongana	Churcampa	1,229,088.89	1,229,088.89	19.225 Km, 527 beneficiarios.	Proyecto nuevo

Mejoramiento de Carretera de Tucuccasa-Arma-Sirihuasi-Buenos Aires, Anco	Churcampa	1,366,962.00	1,143,111.09	15.40 Km Carretera afirmada, 2814 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Construcción de Carretera Huayacca-Antacancha-Cochamarca-Distrito de Aurahuá	Castrov	2,097,283.00	742,968.86	7.60 Km carret.sin afirmar y 2 puentes. Continua	Proyecto nuevo
Construc.Trocha carrozable Occoropampa-Pueblo Nuevo-Pallqapampa-Sta Rosa de Llillinta, Pilpichaca	Huaytará	3,608,388.00	2,189,789.62	22.85 Km de Carretera afirmada, incluye 2 pontones, 670 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Construcc.y Mejoramiento Carretera Minabamba-Mayunmarca	Acobamba	1,525,933.00	1,428,337.06	11.81 Km.2068 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha- Huancas-Totora	Multiprov	2,380,103.00	1,784,666.81	27.548 Km de Trocha sin afirmar, 2534 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento Carretera Antamachay-Cuticsa-Santo Tomás de Pata -Chupacc	Angaraes	2,319,808.00	1,454,369.36	Carretera afirmada de 40.8 Km tipo CV-3, 2984 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo



Mantenimiento Rutinario mecanizado de carretera



Mantenimiento rutinario de carretera - bacheo



Carretera Minabamba-Mayunmarca-Acobamba



Carretera Puente Romero-Cullupite-Pampahuasi



Carretera Tuccuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi



Carretera Puente Integración Anco-Andabamba-Manzanayoc-La victoria-Tucuccasa



Carretera Auxilio Chico Huachacc Pauranga



Carretera Corerac-S.Miguel Curis-Huirpacancha



Carretera Colpa Huayarqui-Huaribamba



Carretera San Pedro de Sacsalla, Acobambilla



Const. Trocha Carrozable Huancayoccasa Arhuayacu



Mejora.Carretera Caja Espiritu-Marcas Allcomachay

## 2.3. ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

### GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, ha conducido el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos de los sectores Vivienda, Trabajo y Promoción Social, Educación, Salud, y Aldea Infantil, desarrollando las siguientes principales actividades, a nivel de Gerencia :

- Instalación de 12 aulas Pre fabricadas en 05 distritos de la región, complementadas con mobiliario e instalaciones sanitarias.
- Entrega de 35 paquetes de materiales de trabajo a la Asociación de lustrabotas, como parte de la política de apoyo a los grupos necesitados.
- Organización del Congreso Macrorregional del Adulto Mayor, con 165 participantes de la Región Centro.
- Elaboración del Plan Regional de Infancia y Adolescencia, para encaminar las acciones a favor de los niños y adolescentes de la región.
- Mantenimiento preventivo básico de la IIEEs del Area Rural del Departamento, atendiendo aun total de 77 centros educativos.
- Elaboración del PIP menor, Mejoramiento de los servicios a la Mujer Afectada por la Violencia”
- Implementación de la OREDIS Huancavelica, a fin de atender a la población con discapacidad de la región.
- Desarrollo de 08 Talleres Productivos, dirigidos a la población con discapacidad, con el fin de promover la generación de ingresos.
- de capacitación

**Proyecto:** Avance al 95% del proyecto “Implementación de Tecnologías Productivas en la Instituciones Educativas de Zonas Rurales de la Región Hvca” cuya meta total es la instalación de 144 módulos compuestos por 1 galpón de cuyes, 1 galpón de pollos y un fitotoldo en 144 IIEEs, considerando la instalación de abonos orgánicos y pastos cultivados, distribución de computadoras e impresoras, y desarrollo de talleres, los beneficiarios serán un total de 11,634 alumnos.



Fitotoldos v galbón para cuves. instalados en los II.EEs. del provento de Tecnologías Productivas



Propuesta Curricular de Educación Productiva, distribuidos en 5,000 ejemplares.



Aulas Pre fabricadas instaladas



Entrega de materiales a los Lustrabotas de Hvca



Taller con Adultos Mayores

- Atención de proyectos por la Modalidad de Núcleos Ejecutores, con un total de 30 obras, para los sectores que a continuación se detalla:

## OBRAS POR MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES

ITEM	PROVINCIA	TIPO					TOTAL	
		SOCIAL	SALUD	TROCHA	IRRIGAC	AGUA Y DESAGUE		EDUCACIÓN
1	ACOBAMBA			1			1	2
2	ANGARAES				2	2		4
3	CASTROVIRREYNA					4		4
4	HUANCAVELICA	1				7	3	11
5	HUAYTARÁ					4		4
6	CHURCAMP				1			1
7	TAYACAJA		1		2		1	4
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>30</b>

## EDUCACION

En este sector con participación de la Dirección Regional de Educación, Gerencias Sub Regionales y Gerencia de Infraestructura, se desarrollaron las siguientes actividades y proyectos principales:

- Participación en el I Taller Nacional para el Fortalecimiento de los Equipos Técnicos Regionales del Programa Estratégico PELA, con 04 Especialistas de la DRE capacitados.
- Desarrollo del Taller Macro Regional para la elaboración de materiales educativos EIB, con 77 participantes de HUCA, Ayacucho y Apurímac
- Desarrollo de eventos de Capacitación a directores y docentes de las REDES y UGELES del ámbito regional, con 333 participantes especialistas capacitados.
- Desarrollo de una Guía sobre Programación Curricular, que contiene el PCI, PCA, UA y Sesiones de aprendizaje.
- Participación en el II Taller Nacional para el fortalecimiento de los Equipos Técnicos Regionales del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR”, con 8 especialistas de la Región HUCA capacitados.
- Participación en el Taller Nacional para el fortalecimiento de los Centros de Recursos del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, con 7 representantes de la Región HUCA capacitados.
- Capacitación a directores y docentes de las I.E.E. REDES y UGELES del ámbito regional, con participación de especialistas, directores y docentes de las I.E.Es focalizadas en el marco del PELA con 105 participantes.
- Desarrollo del Taller nacional de evaluación del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, con 05 especialistas de HUCA capacitados.
- Reunión de la Mesa Técnica EIB, con 18 representantes de la UGELES y DRE
- Desarrollo del IX Concurso Regional de Comprensión Lectora en quechua y castellano, con participación de las 07 UGELES.
- Desarrollo del III Tinkuy Cultural Regional “Takiy mantawan Willakuy manta 2010”, en quechua y castellano, con participación de las UGELES
- Desarrollo de la Evaluación Censal de Estudiantes 2010, con participación de los estudiantes del 2° y 4° grado de primaria de las I.E.E de la Región de Huancavelica.
- Diseño y desarrollo de proyecto Educación Especial inclusiva, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa en Huancavelica en convenio con la ONG. SEPEC-EEIE-DREH.

- Ejecución y presentación Regional y Nacional de las Experiencias Exitosas en Educación Especial Inclusiva financiado por Save Fhe Children.
- “I Encuentro Regional sobre Educación Especial Inclusiva” con ponentes especializados de la ciudad de Lima.
- Desarrollo de 02 capacitaciones para Directores responsables del manejo de Presupuesto de Mantenimiento Preventivo de II.EEs.
- Saneamiento Físico Legal de 76 Instituciones Educativas en los niveles de Educación Inicial y Primaria, los mismos a la fecha se encuentran con fichas de Inscripción definitiva.
- Elaboración del Padrón de las II.EE del ámbito Regional de Educación Huancavelica, por UGELs.
- Evaluación de docentes de Educación Básica Especial Alternativa y CEPTR0, conforme a las normas legales.
- Desarrollo de capacitaciones en Tems Medioambientales, impartidas en las II.EEs del departamento

**Metas del PELA:**

En el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de la EBR, durante el año 2010, se desarrollaron actividades importantes, cumpliendo con metas que se detallan en los cuadros siguientes:

**METAS LOGRADAS PELA NIVEL INICIAL**

RESUMEN REGIONAL EDUCACIÓN INICIAL	ACOMPAÑANTES	DOCENTES	Nº DE II.EE.	NIÑOS BENEFICIADOS
ACOBAMBA	6	48	48	1156
ANGARAES	5	60	48	1244
CASTROVIRREYNA	5	48	48	391
CHURCAMP	8	47	47	1015
HUANCAMELICA	5	62	48	1461
HUAYTARA	11	57	57	922
TAYACAJA	44	110	109	2448
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>432</b>	<b>405</b>	<b>8637</b>



Docente en pasantía

FUENTE: DREH-ESTADISTICA 2011

**METAS LOGRADAS PELA NIVEL PRIMARIA**

RESUMEN REGIONAL EDUCACIÓN INICIAL	ACOMPAÑANTES	DOCENTES	Nº DE II.EE.	NIÑOS BENEFICIADOS
ACOBAMBA	11	110	110	2054
ANGARAES	12	106	88	1708
CASTROVIRREYNA	9	81	71	779
CHURCAMP	9	98	98	1511
HUANCAMELICA	17	172	151	2946
HUAYTARA	11	105	93	1027
TAYACAJA	17	160	160	2476
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>832</b>	<b>771</b>	<b>12501</b>



Capacitación de Docentes

FUENTE: DREH-ESTADISTICA 2011



CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PELA

RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2010  
SEGUNDO GRADO: EDUCACION PRIMARIA

UGEL	% COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS		
	NIVEL 2	NIVEL 1	POR DEBAJO DEL NIVEL 1
Huancavelica	10,70%	53,60%	35,70%
Acobamba	13,40%	42,40%	44,20%
Angaraes	6,70%	37,30%	56,00%
Castrovirreyna	4,10%	41,00%	54,90%
Churcampa	10,10%	56,20%	33,60%
Huaytará	4,10%	54,80%	41,10%
Tayacaja	8,20%	51,10	40,60%
Región de Hvca	<b>6,60%</b>	<b>48,70%</b>	<b>44,70%</b>
A nivel Nacional	15,90%	54,30%	29,80%

UGEL	NIVEL DE LOGRO		
	% LÓGICO MATEMÁTICA		
	NIVEL 2	NIVEL 1	POR DEBAJO DEL NIVEL 1
Huancavelica	10,40%	37,70%	51,90%
Acobamba	6,90%	40,80%	52,30%
Angaraes	7,60%	22,90%	69,50%
Castrovirreyna	5,70%	29,70%	64,60%
Churcampa	10,70%	36,70%	52,60%
Huaytará	5,70%	28,70%	65,60%
Tayacaja	8,60%	35,70%	55,70%
Región de Hvca	<b>6,40%</b>	<b>34,20%</b>	<b>59,50%</b>
A nivel Nacional	7,20%	36,30%	56,50%

FUENTE: Evaluación Censal de Estudiantes UMC-MED  
DREH-ESTADISTICA 2011



Juegos dinámicos con los alumnos



Docentes pasantes en la I.E 36007 Hvca



Taller sobre Estrategias de Comunicación



Módulos de comunicación y matemática para las II.EEs



Desfile de pancartas con materiales del PELA



Materiales fungibles para las II.EEs

- Mantenimiento Preventivo Básico, en el marco de la Ley N° 29465, atendiendo a un total de 1514 II.EEs, con un costo de S/.
- Gestión para el incremento de 264 plazas de docentes, que se incorporaron a las diferentes II.EEs del departamento, ampliando la cobertura del servicio educativo.

**INCREMENTO DE PLAZAS 2010**

UGELES	PLAZAS
<b>UGEL ACOBAMBA</b>	
INICIAL	2
SECUNDARIA	11
<b>UGEL ANGARAES</b>	
INICIAL	6
SECUNDARIA	26
<b>UGEL CHURCAMP</b>	
INICIAL	5
SECUNDARIA	32
<b>UGEL HVCA</b>	
INICIAL	13
SECUNDARIA	47
<b>UGEL HUAYTARA</b>	
INICIAL	8
SECUNDARIA	7
<b>UGEL TAYACAJA</b>	
INICIAL	1
SECUNDARIA	26
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL 2010</b>	<b>264</b>

**MANTENIMIENTO DE II.EES 2010**

REGION	UGELES	NUMERO DE II.EE. E IST Y PP.	MONTO ASIGNADO
HVCA	Huancavelica	221	1,448,700.00
	Acobamba	131	773,200.00
	Angaraes	213	1,237,100.00
	Castrovirreyna	132	662,300.00
	Huaytara	201	988,100.00
	Tayacaja	337	1,951,800.00
	Municipalización	76	436,100.00
	Churcampa	190	1,094,600.00
	Institutos	13	98,800.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1514</b>



Personal de la UGEL Hvca



Concurso de Danzas en el Nivel Inicial

**PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2010**

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini, Hvca	Hvca	3,078,901.48	1,859,475.14	Const.y mejoram.36 aulas y ambientes, cerco perimét, losa deport, patio multiuso y otros. 596 alumnos benef. Continua	Proyecto contin
Implementación de Tecnologías Productivas en la Instituciones Educativas de Zonas Rurales de la Región Hvca.	Multiprov	5,691,844.00	1,772,026.64	Instalac. 447 módulos productivos, instalac.abonos orgánicos, y pastos cultivados, 11,634 alumnos benefic. Concluye enero 2011	Proyecto contin
Implementación de Areas Recreativas para la población Infantil en las C.C.del Departamento de Hvca	Dptal	4,863,000.00	4,862,389.33	Módulos de juegos recreativos instalados, 159,375 benefic. Concluido	Proyecto nuevo
Mejoram.de Infraestructuras y equipamiento de las Instituc. Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur	Angaraes	5,517,949.00	3,640,936.45	17 II.EEs intervenidas en 06 distritos. Continua 2011	Proyecto nuevo
Mejoramiento Servicios Educativos Nivel secundario en la I.E.José Gálvez Egúsqüiza, Acoria.	Hvca	1,917,612.00	1,319,722.48	Const.6 Aulas, 7 ambientes, Cerco, Losa Multiuso y otros. 230 alumnos benef. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Huaribamba	Tayacaja	2,080,108.00	2,028,335.10	Const 8 aulas,6 amb, equipo PAD, mobiliario y capacit.2130 benefic. Concluido	Proyecto nuevo
Sustitución de Infraestructura de la I.E. de San Pedro de Surcubamba	Tayacaja	1,893,870.00	1,842,965.24	Const 10 aulas, 6 amb, 2SH, losa deport, y otros. 233 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Const.Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Básica Regular N° 31044 Mariscal Cáceres, Daniel Hernández.	Tayacaja	2,414,620.00	2,351,141.43	Const.20 aulas, 7 amb, 8 SH, equipo PAD, y otros. 467 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Construc. Ampliac, rehabilitac, y equipamiento de la I.E. Antonio Raymondi de Churcampa	Churcampa	1,863,209.00	1,657,581.98	Const.2 talleres, 2 amb, losa deport, y otros. 548 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Sustituc. e Implementación de Infraestructura en la I.E. Jorge Chávez Dartnell de Choclococha - Pomacocha	Acobamba	1,805,096.00	1,418,761.02	09 aulas, 4 ambientes, S.H y otros. 270 alumnos benef. Continua	Proyecto nuevo
Construcción e Implementación de Infraestructura en la I.E.José Carlos Mariátegui de Caja	Acobamba	1,912,052.00	1,178,966.81	05 aulas, 4 ambientes,losa deport, y otros. Continua	Proyecto nuevo



Const.I.E.Jorge Chávez Dartnell-Pomacocha



Const.de I.E.36201 de Paloma-Marcas



I.E. 1° de Mayo de Cochaccasa-Angaraes



I.E. Ricardo Palma de Carhuapata-Angaraes



I.S.T.P de Ticrapo-Castrovirreyna



I.E. 30989 del Distrito de Locroia



I.E. 31141 de Chupas-Locroja



Frontis UGEL Huaytará



I.E. Mx. Técnico Agropec. Artesanal de Llillinta



Construc. I.E. 30961 Pazos Tayacaja



Construc. I.E. Carlos A. Salaverry-Andaymarca



Construc. I.E. J.Olaya Balandra Condorhuachana



Construc. I.E. 36117 de Tacsana Yauli



Construc. I.E. Augusto Salazar Bondy de Manta



Construc. I.E. Católico Bilngue Isolina Clotet F-Hvca



Construc. I.E. 31302 de Paltarumi-Daniel Hernández

## SALUD

En el sector Salud, con el concurso de la DIRESA, Redes de Salud, Hospital Departamental de Hvca y Gerencias Sub Regionales, se desarrollaron las siguientes principales actividades y proyectos.

### Servicios de Salud y Gestión de la Calidad:

- Desarrollo del sistema de información actualizada de la cartera de servicios por tipo de categoría de los EE.SS, en cada una de las Redes Operativas de salud.
- Supervisión a las 13 rutas de intervención del AISPED

### Atención Integral de la Salud

- Capacitación de 62 profesionales de la salud, en vacunación segura.
- Instalación de 7 refrigeradoras solares en los EE.SS que no cuentan con fluido eléctrico.
- Implementación de 267 EE.SS con hemoglobímetro, para mejorar el DX de anemia en niños menores de 5 años.
- Implementación de 88 EE.SS con equipo PAD, para la mejora de sus sistemas de información en el área niño y nutrición.
- Implementación de 267 EE.SS con balanzas pediátricas, tallímetros y sets de evaluación, que mejorará la atención del menor de 5 años.
- Implementación de 178 EE.SS con equipos de cadena de frío, refrigeradoras y congeladoras, termos y kits para conservar y transportar adecuadamente las vacunas.



Reunión de equipos AISPED

Redes de Salud	Nº de Evaluados	Nº de D.C.	Crónico %
ACOBAMBA	5535	2060	37.2
ANGARAES	7264	3257	44.8
CASTROVIRREYNA	2176	673	30.9
CHURCAMP	5308	1917	36.1
HUANCAMELICA	16660	6104	36.6
HUAYTARA	2840	920	32.4
TAYACAJA	13428	5015	37.3
<b>DIRESA</b>	<b>53211</b>	<b>19946</b>	<b>37.5</b>

- Atención del 86% de cobertura en niños de menores de 5 años, con suplementación de vitamina y multimicronutrientes.
- Evaluación nutricional de 53,211 niños menores de 5 años a través del SIEN.
- Capacitación y actualización de 366 profesionales de la salud en sesiones demostrativas, consejería nutricional, SIEN, y otros asociados al PAN.
- Suplementación con sulfato ferroso y vitamina A, de 39,974 niños de 6 a 59 meses.
- Desarrollo de 221 supervisiones de almacenes de alimentos de los Programas PIN y Wawa Wasis.
- Atención de 3,311 casos de anemia por deficiencia de hierro, en niños menores de 5 años.
- Atención de 6,319 casos tratados de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años.
- Suplementación con Hierro y Acido Fólico de 7,264 gestantes y puérperas, para disminuir los casos de anemia y otras complicaciones.
- Campañas de información sobre salud sexual y reproductiva, con 8,360 familias informadas.
- Atención de 21,961 parejas con métodos de planificación familiar modernos.
- Desarrollo de 6,728 atenciones prenatal reenfocada.
- Atención de 6,300 partos normales, 77 partos complicados no quirúrgicos, y 438 partos complicados quirúrgicos.
- Atención de 7,342 puérperas normales, y 147 con complicaciones.
- Atención de 6,221 R.N normales, 246 con complicaciones, y 63 casos de cuidados intensivos.
- Atención de 1642 gestantes con complicaciones.
- Equipamiento de los EE.SS de capitales de provincia con ecógrafos, para la detección precóz del embarazo.



Sesiones demostrativas nutricionales



Campañas para consumos de alimentos de la región



Sesiones sobre maternidad saludable



Psicoprofilaxis con adecuación intercultural



Práctica del parto vertical



Adiestramiento de Promotres Comunales

### **ESTRATEGIA SANITARIA**

- Conformación de la COREMUSA Regional del VIH7SIDA TBC y malaria.
- Desarrollo de la Reunión Técnica de Implementación de la Estrategia Sanitaria de Pueblos Indígenas, con enfoque intercultural con la Población Chopcca.
- RED

- Actualización de la sala situacional de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, los que fueron socializados y publicados.
- Elaboración del Análisis Situacional de salud de la DIRESA Hvca, quedando pendiente su entrega a las redes.

#### **GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

- Formulación de 35 proyectos de inversión pública, para mejora del equipamiento de cadena de frio, y 04 estudios para construcción y equipamiento de Casas de espera.

#### **PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL**

- Monitoreo al 83% de los recursos hídricos del área de influencia del Proyecto Camisea I y II.
- Elaboración del registro, calificación y sistematización de entidades que generan residuos sólidos y sustancias químicas peligrosas en la región Hvca.
- Capacitación a los responsables de Salud Ambiental en las 07 Redes de salud.
- Conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la DIRESA Hvca.
- Vigilancia de 71 EE.SS en bioseguridad y salud Ocupacional.
- Implementación con normas técnicas a la 07 Redes de salud de Hvca.



Asistencia Técnica en Residuos Sólidos



Evento sobre Salud Ocupacional



Personal de la D.P.M.Ambiente y S. Ocupacional

#### **VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGO SANITARIO**

- Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en la Región Huancavelica, con 98% de sistemas vigilados.
- Evaluación de la calidad de agua para consumo humano, registrando un 14% de muestras en riesgo alto y 6% en riesgo muy alto.

- Vigilancia sanitaria en 67 distritos (71.2%), determinando un nivel de riesgo alto en un 32.6% de ellos, en la gestión de residuos sólidos.
- Desarrollo del I Curso Taller “Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos”
- Evaluación de la densidad poblacional de los insectos vectores en zonas de riesgo (03 Provincias)
- Inmunización de 61% (42,582) de los canes programados para vacunación.
- Actualización del mapa entomológico de la región Huancavelica.
- Inspección sanitaria de establecimientos procesadores de alimentos y bebidas.
- Vigilancia del 51% de distritos y 86% de provincias, en rabia humana.
- Capacitación y adiestramiento de responsables de los Pgs de vigilancia y control de las Redes de Salud



Vigilancia de Sistemas de Agua



Desinfección de Sistemas de Agua



Capacitación a Promotores Comunales



Capacitación a II.EEs en tenencia responsable de animales domésticos



Vigilancia sanitaria de panadería



Evaluación de gestión de desechos sólidos

### GESTION DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD

- Formación del Comité de Gestión Conjunta para la evaluación de las Instituciones Educativas Promotoras de Salud.
- Asistencia técnica y capacitación de los procesos y ejes temáticos a desarrollarse para el logro de IEPS, Municipios y Comunidades Saludables a las 07 Unidades Operativas de Salud.
- Se realizó el Pre Congreso de Agentes Comunitarios de Salud teniendo como producto la "Declaración de la bella durmiente" como propuesta provincial de ACS de Castrovirreyna para el III Congreso Regional de ACS en Huaytará.
- Desarrollo del III Congreso Regional de Agentes Comunitarios de Salud en la ciudad de Huaytará teniendo como producto la "Declaración de Inka Wasi".
- Desarrollo del II Encuentro de Adolescentes Líderes de II.EEs de la Región.
- Desarrollo del Foro Multisectorial "Análisis y Propuestas sobre Muertes Maternas" Desarrollo de propuestas y compromisos multisectorial para la disminución de la Mortalidad Materna Región Huancavelica 2010.
- Sesiones demostrativas para Familias con niñas y niños menores de 36 meses, con temas educativos para el cuidado infantil y salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable.
- Implementación del Rotafolio de "Promoviendo Buenas Prácticas para lograr una Familia Saludable", con Agentes comunitarios de Salud
- Desarrollo de 01 campaña de Prevención del embarazo en Adolescentes de II.EEs del Nivel secundario.
- Desarrollo de 01 campaña de lactancia materna en la provincia de Acobamba.



Campañas de lactancia materna y prevención del embarazo

### SEGURO INTEGRAL DE SALUD

- Afiliación en el componente subsidiado o gratuito de 453,730 personas, que representa el 95% de la población asignada, reduciendo la brecha de acceso a los servicios de salud de las poblaciones pobres.
- Atención a 316,138 beneficiarios del SIS, en los diferentes servicios de salud a nivel departamental.
- Implementación de puntos de digitación del SIS, sumando actualmente un total de 27 puntos.
- Capacitación del personal digitador del SIS, para el escalamiento del sistema integrado de información de inmunizaciones a nivel de las 07 Redes de salud.

El SIS contó con un total de S/. 5,735,575.72 de transferencias recibidas

**PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL PPR- PAN-SMN**

PROVINCIA	SUELDO MENOR 1080			SUELDO MAYOR 1080		
	INMUNIZAC	NUTRICIONAL	MATERNO	INMUNIZAC	NUTRICIONAL	MATERNO
HUANCAMELICA	15	14		21	28	24
ACOBAMBA	24	2	2	41	14	10
ANGARAES	3	4		52	15	13
CASTROVIRREYNA	6	4		15	11	7
CHURCAMP	8	2		29	14	9
HUYTARA	6	2		9	18	13
TAYACAJA	13	7		28	35	28
HOSPITAL	1			2	0	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>197</b>	<b>135</b>	<b>104</b>

**PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL EUROPA AÑO 2010**

Nº	RED	ENFER	TECN.E NFER	MEDICO	TEC. INFORM AT	OBSTETRA	ODONT OLOGO	BIOLOG O	TEC.LABO RAT	NUTRICI ON	ADM	CONTADO R
		Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
1	HUANCAMELICA	52	53	13	11	8	2	3	6			3
2	ANGARAES	15	9	16		11		6		6	1	
3	TAYACAJA	36	19	25	8	10		5	1	4		
4	ACOBAMBA	12	4	9	1	14	2	2	2			2
5	CASTROVIRREYNA	11	3	4		3		1	3			
6	CHURCAMP	17	16	6		7		8		4		
7	HUAYTARA	9	4	2		1			1			
<b>TOTAL</b>		<b>152</b>	<b>108</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

**HOSPITAL DPTAL DE HVCA-EQUIPAMIENTO**

- Implementación del Departamento de Pediatría, con 01 incubadora de transporte para las referencias pediátricas, 01 incubadora estándar, 07 monitores multiparámetro, Bombas de infusión, 02 ventiladores volumétricos, 02 conservadoras de vacunas con estándar de la OMS y la UNICEF, y otros equipos de medición y mobiliario médico.
- Adquisición de 01 ecógrafo de última generación, para apoyo al diagnóstico.
- Adquisición de 01 ambulancia Tipo II, para el transporte de los pacientes referidos y de emergencia.



Equipo para UCI Neonatal-Incubadora



Monitor multiparámetro



Ecógrafo de Última generación



Ambulancia Tino II adquirida

**PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2010**

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención del C.S Ayaccocha, P.S.Huanaspampa, de la Microred Ayaccocha	Hvca	1,914,228.00	588,215.30	C.S.Ayaccocha y P.S.Huanaspampa, 2305 benefic. Concluido	Proyecto contin
Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva del C.S de Pampas en Hospital, Red de Salud Tayacaja	Tayacaja	9,654,099.31	1,117,269.99	Mejoram.y const.8 bloques de ambientes, equipam. adquisic.ambulancia. 8066 benefic. Concluido.	Proyecto Contin
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de San José de Miraflores, Chillhuapampa, Nueva Acobambilla, Tinyaclla y Vista Alegre Micro Red Huando.	Hvca	2,822,517.00	2,180,925.53	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de 05 EE.SS, 7899 benefic. Continua 2011	Proyecto nuevo

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de Villapampa, Atalla, Paltamachay, Pucaccasa, Chopcca, Ccollpaccasa y Condorhuachana, Micror Yauli .	Hvca	3,390,422.00	2,446,079.21	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de 06 EE.SS, 4,240 benefic. Continua 2011	Proyecto nuevo
Mejoram.Capacid.Resolutiva de los servicios de salud del Per Nivel de Atención de los P.S de Nueva Esperanza, Violeta Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral, Microred Acostambo, Red Tayac	Tayacaja	2,304,802.00	2,218,432.87	Construc. Y equipamiento de 05 EE.SS, 3571 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Mullaca, San Lucas de Tongos y Santa Cruz de Ila de la Microred de Pazos, Red Tayac	Tayacaja	1,755,358.00	1,699,070.73	Construcción de 03 EE.SS y equipamiento biomédico. Continua	Proyecto nuevo
Mejoram. Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel Atención de los P.S: Santo Domingo de Capillas, Huañacancha y Vista Alegre, Microred Huaytará, Red Huaytará	Huaytará	1,702,984.00	491,876.71	Construcción de 3 EE.SS y equipamiento biomédico. 984 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento de los Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos de Salud del Nucleo Santiago de Chocorvos, Red Hvca DIRESA	Huaytará	2,976,382.00	1,689,662.56	Construc.04 EE.SS, remodelac. 3 P.S. adquisic. De Equipos y capacitaciones. Continua	Proyecto nuevo



P.S.Condorhuachana de Microred Yauli



P.S.Nueva Acobambilla Microred Huando



P.S.Tinyaclla de la Microred Huando



P.S.de Chacarilla del distrito de Yauli



P.S.de Huaribambilla-Churcampa



P.S.de Tuco Microred Cochaccasa



P.S. del Distrito de El Cármen



P.S. Sta Rosa de Ututo-Huaytará



P.S. San Lucas de Tongos-Tayacaja



P.S. de Chacarilla Hvca



P.S. de Pilchaca Microred Moya



Construc. Hospital de Pampas-Tayacaja



Construc. P.S. Mullaca Microred Pazos



Const. P.S, San Lucas de Tongos Microred Pazos

## TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social, desarrolló entre otras las siguientes actividades:

- Declaratoria de necesidad en las 07 provincias del Fortalecimiento del plan regional del servicio de Orientación Vocacional e información Ocupacional (SOVIO)
- Aprobación mediante Ordenanza Regional, de la Política Regional en Materia de Trabajo Infantil en el Ambito de la Región Huancavelica.
- Implementación de la oficina de Ejecución Coactiva, la misma que viene operando normalmente.
- Aplicación de 105 Inspecciones de empresas, para determinación de cumplimiento de normas laborales y prevención de conflictos laborales.
- Desarrollo de 10 eventos de capacitación a trabajadores y empleadores, en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo.
- Desarrollo de campañas sobre discriminación en los centros de trabajo.
- Atención de 549 consultas laborales, en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo.
- Atención de 255 conciliaciones laborales administrativas entre empleadores y trabajadores.
- Gestión para la incorporación de 98 trabajadores a planilla, en diversos centros laborales de Hvca.
- Prestación de defensa legal gratuita, atendiendo 73 casos demandados.
- Colocación de 214 trabajadores, a puestos de trabajo en centros laborales de Hvca.

- Aplicación de 2672 test sobre orientación vocacional, a alumnos del 5to año de secundaria, de los diferentes I.EEs del Departamento de Huancavelica.
- Desarrollo de 30 charlas sobre Información Ocupacional, en convenio con la DIRESA Hvca.
- Atención de 67 Constancias de Registro Nacional de las MYPES, como requisito para proveer al estado.
- Elaboración de 01 Guía de Orientación para estudios superiores, para alumnos del 5to año de secundaria de las I.EEs de Hvca.

## VIVIENDA y SANEAMIENTO

La Dirección Regional de Vivienda y Construcción, desarrolló las principales actividades y proyectos:

- Monitoreo a la elaboración de 54 expedientes técnicos de proyectos de reconstrucción en el sector Educación, FORSUR, contando con 44 expedientes que tendrán transferencias financieras para febrero del 2011, por un monto total de S/10,650,306.82.
- Difusión de los planes nacionales de Vivienda y Saneamiento, Programas de Viviendas y Asistencia Técnica en materia de Construcción y Saneamiento, con 512 autoridades y ciudadanos informados.
- Formulación del diagnóstico de base, para los planes regionales de vivienda y saneamiento, en 12 distritos priorizados.
- Formulación de 28 Perfiles de proyecto en saneamiento, a nivel departamental, como II Etapa del Programa de Saneamiento en el Departamento de Hvca.
- Desarrollo de 09 Fóruns como parte del FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, en las 07 Provincias de la Región Huancavelica, para la Difusión de los Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento; el Reglamento Nacional de Edificaciones; Programas de Vivienda y Asistencia Técnica en materia de construcción y saneamiento. Esto en el marco de la transferencia de funciones del Pliego Ministerial
- Levantamiento del "DIAGNOSTICO DE BASE PARA LOS PLANES REGIONALES DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO", habiéndose intervenido un total de 14 Distritos y 140 C.P. para diagnóstico de situación de vivienda, 12 Distritos 7 127 C.P. para el caso de saneamiento.



Difusión sobre Planes Nacionales de Vivienda y Saneamiento en las ciudades de Pampas y Lircay



Validación del proyecto de FORSUR en Ouerco



Distribuc. Materiales de Difusión en Talleres-Castrov.



Diagnóstico sobre servicios de agua y desague en los C.P

**Proyecto :** Mejoramiento del Hábitat en el Departamento de Huancavelica, Costo total: S/. 5,845,246.00, Cobertura: 07 provincias del departamento  
Metas: 100 vivienda prototipo, 100 talleres de capacitación y formación teórico-práctico, desarrollo de capacidades en manejo de cocina y corrales mejorados, y manejo de recursos forestales, 44,566 beneficiarios.

Estado: en ejecución, II etapa (2010) se invirtió S/. 2, 398,065.30, capacitándose a 1453 familias en formación teórica práctica de manejo de cocinas y corrales y la construcción de 72 viviendas prototipo con adobe reforzado y geomalla



Detalle de geomallas en las viviendas prototipo del proyecto Mejoramiento del Habitat en el Dpto. de Hvca



Personal de la D.R.de Vivienda

**PRINCIPALES PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO 2010**

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Construcción y Ampliación de los Sistemas de Agua potable en los C.P de Paltamachay-Tacsana y Ambato, Yauli.	Churcampa	2,211,501.00	1,170,856.77	14,624 ML de redes a instalar, 3760 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento, Instalación sistema de agua potable y alcantarillado Ayacancha, Distrito de Huaribamba	Tayacaja	1,271,714.00	1,231,358.09	161 conex domicil.529 beneficiarios, fideicomiso. A.D	Proyecto nuevo
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca, Paltamarca, Ichupata, Villamayo, Illpe y Patibamba, Distrito de Pachamarca	Churcampa	2,266,212.00	2,100,021.20	6778 ML de redes, 197 letrinas, 2220 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Ampliación, Mejoram, Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Yaureccan, Churcampa	Churcampa	2,155,331.00	2,080,249.42	282 conexiones domicil.de agua y desague, 6970 ML de redes de agua y 7538 de desague, 1337 benefic. Continua	Proyecto nuevo
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huayllay Grande	Angaraes	1,082,239.00	1,013,692.10	534 conexiones domicil.agua, 3708 ML de redes de agua y 2170 ML de desague, 1493 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo



Sistema de Agua y alcantarilla de Paltamarca-Churca



Sistema de Agua y alcantarillado Ayacancha



Sistema de Agua y alcantarillado C.P.Anta Tayacaja



Sistema de Desague C.P. Pueblo Libre Hvca



Sistema de Desague C.Ps. Paltamachay, Tacsana y Ambato-Yauli

## ALDEA INFANTIL SFA

En el marco de la atención integral al niño y adolescente en estado de abandono, la Aldea Infantil San Francisco de Asis, ha desarrollado las siguientes principales actividades:

- Atención integral a 46 niños y adolescentes en estado de abandono, brindándoles la atención propia de un hogar familiar.
- 04 Evaluaciones del crecimiento y desarrollo de los niños aldeanos, para control de su desarrollo normal.
- Aplicación de 48 evaluaciones y tratamiento psicológico de niños, adolescentes y madres sustitutas.
- Capacitación de los niños, adolescentes albergados y madres sustitutas, en habilidades y destrezas en actividades productivas, y capacidades comunicacionales.
- Manejo de los huertos y módulos de animales menores, para la generación de ingresos propios para la Aldea Infantil.

## 2.4. ACCIONES DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RECURSOS NATURALES

### PROMOCION Y GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

- Monitoreo de residuos sólidos municipales, cumpliendo con 07 Monitoreos.
- Desarrollo del Primer Encuentro Regional de la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil.
- Conformación del Grupo Técnico Regional del Agua, ejecutando actualmente el proyecto de Gobernabilidad del Agua.
- Formulación de Políticas de Gestión del Agua-Diagnóstico Temático del Agua, en convenio con IPROGA
- Formulación del Inventario de Conflictos del Agua, en convenio con IPROGA
- Desarrollo de 05 eventos de capacitación en Cambio Climático y Políticas Públicas
- Evaluación del Enfoque Ambiental aplicado en 120 I.E.Es de la región, en coordinación con la DRE-Hvca, con entrega de premios a las I.E.Es ganadoras y entrega de 625 guías de educación ambiental
- Desarrollo de 11 campañas ambientales, en función al calendario Ambiental: Día Mundial del Ambiente, Día de la Tierra, Día de la Diversidad Biológica y otros.
- Desarrollo de la campaña de limpieza del Río Ichu, en coordinación con la Municipalidad de Huancavelica y las madres del Programa Vaso de leche.



Reunión Técnica con Grupo Tecnico Mantaro



Celebraciones por Día de la Tierra



Celebraciones por Día Mundial del Ambiente



Evaluación de Agenda Ambiental

**COORDINADORA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS:**

- Desarrollo de 07 eventos de Fortalecimiento de desarrollo de capacidades de los actores y Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres.
- Atención de 63 registros de supervisión de Captura y esquila de Vicuñas
- Desarrollo de 02 Eventos de inducción al manejo de los Registros de producción en camélidos domésticos.
- Desarrollo de 04 supervisiones de centros de acopio y/o transformación de fibra de alpaca y vicuña.
- Desarrollo de 02 eventos de acopio y comercialización organizada de la Producción de camélidos Sudamericanos.
- Desarrollo de 04 eventos de Difusión del Proyecto de Normas Técnicas Peruanas (PNTTP) de camélidos sudamericanos.

**Cuadro Comparativo de Producción de fibra de Vicuña  
Región Hvca**

2005	2006	2007	2008	2009	2010
331	332	434	437	564.816	657.345

Fuente: CRCS-2011.



Rebaño de vicuñas para esquila



Premiación de alpacas en Feria Agropecuaria de Hvca

**PRINCIPALES PROYECTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS**

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Desarrollo de las Alpacas en las Partes Altas del Proyecto Camisea - Huaytara.	Huaytará	2,347,358.00	171,290.25	Asist.técnica, manejo de bofedales y praderas, transferen. Tecnológica, mejoramiento genético.	Proyecto nuevo
Instalación Cercos Permanentes con Repoblamiento Vicuñas-Cochatay-Huaracopata, Seclla.	Angaraes	1,002,112.84	71,321.12	22.39 km de cerco de malla para 1080 Has, 01 Puesto manejo de 06 amb, 02 casetas control, equipam. y capacít. 3,210 beneficiarios, Concluido	Proyecto de continuidad
Fortalecimiento Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Hvca	Multiprov	1,446,751.00	12,589.00	Cercos permanentes 24.5 Km, planes de manejo, 1 censo de vicuñas, 40 módulos de guardaparques, 22,659 Benefic. Por concluir	Proyecto de continuidad



Evaluac.de alpacas adquiridas Py Desarrollo de alpacas Camisea



Verificacion del Aspensor para riego, Py alpaquero



Py, Fortalecim.Competitiv.comunalpara manejo de Vicuñas



Verificacion del Cerco Perimetrico de la Comunidad de Cachimavo

### AREA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

La intervención en el área, se concentró en la ejecución de proyectos forestales, a continuación detalles de los principales proyectos.

#### PRINCIPALES PROYECTOS FORESTALES 2010

PROYECTO	LOCALIZAC	COSTO TOTAL	EJECUC.2010	DESCRIPCION DE METAS	
Forestación y Reforestación con los grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria en la Región Hvca	Multiprov	5,528,378.00	1,073,954.57	1225 Has reforestadas con cerco, capacitaciones. 54,858 benefic. Continua	Proyecto de continuidad
Forestación en Laderas Altoandinas de la Sub Cuenca del Rio San Juan, Castrovirreyna	Castrov	3,376,163.08	1,092,532.45	600 Has plantaciones definitivas cercadas, capacit, 10 comités conformados, 5179 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Ampliación de areas Forestales con Fines Ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa.	Multiprov	5,891,867.00	1,740,353.19	Const. 18 reservorios, 1614 Has reforestadas y cercadas, 6365 benefic. 70 Comites conformados. Continua	Proyecto nuevo
Forestación con Fines de Protección Ambiental en la Provincia de Huancavelica.	Hvca	5,609,447.00	2,392,924.60	1137 Has plantac. definitivas y cercado, 23694 benef. Continua	Proyecto nuevo

Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Departamento de Huancavelica	Huaytará	6,111,248.00	2,241,329.08	1439 Has plantac.definit, con cercos de protec.27 comités conformados. 5116 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Establecimiento de Plantones Forestales con Fines Ambientales en las Provincias de Castrovirreyna, Angaraes, Huaytará y Acobamba.	Multiprov	5,992,543.00	901,461.23	84 viveros, 13 cursos, 84 Comités conformados, 17,278 beneficiarios. Continua	Proyecto nuevo
Ampliación Superficie con Aptitud Forestal en Areas rurales de los 16 Distritos de la Prov.de Huancavelica	Hvca	5,975,277.00	1,291,380.83	79 comités conformados, 79 viveros, 1741 Has de plantac. definitivas, 12,938 benefic. Continua	Proyecto de continuidad



Instalación de viveros forestales



Entrega de herramientas en Orocococha

Embolsado de sustrato Cotas



Supervisión y visita a viveros




Plantulas repicadas con Tinglado-Sacsamarca



Capacitación en Quirahuará

**PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE HVCA**

Con el objetivo de ejecutar el proceso de ordenamiento y distribución adecuada del territorio para el desarrollo sostenible del departamento de Huancavelica, se viene ejecutando el proyecto aludido, que tendrá los siguientes productos:

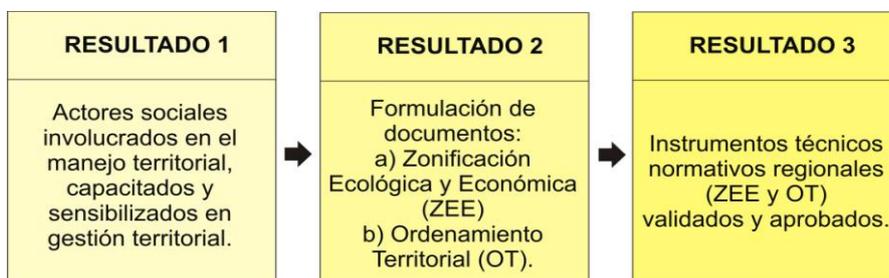

El costo total del proyecto asciende a S/. 2,478,242, habiendo ejecutado al 2010, S/. 1,191,950.64, mostrando un avance del 70% de las metas 2010, con la conformación de las Comisiones Técnicas Provinciales y Talleres de sensibilización en las provincias de Angares, Huancavelica, Huaytará, Castrovirreyna, y Churcampa.



Taller de sensibilización de Acobamba-  
Py Des.capacidades para  
Ordenam.Territorial



Lanzamiento del proyecto en la ciudad  
de HUCA

## 2.5. DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD NACIONAL


La Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, ha desarrollado las siguientes principales actividades:

- Se conformó las siguientes comisiones: Comisión Coordinadora de Acciones de Obras de Prevención, Comisión de Planificación, Comisión de Ciencia y Tecnología, Comisión de Operaciones, Educación y Capacitación, Comisión de Logística, Comisión de Salud, Comisión de Ley, Orden e Inspecciones Técnicas, y la Comisión de comunicaciones
- Curso Taller en Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido a Comunicadores Sociales.
- Curso taller Formando brigadas Comunitarias en gestión de Riesgo de Desastres, en 04 distritos, formando 130 Brigadas.



Desarrollo de Talleres

- Desarrollo de 06 simulacros de sismo en las instituciones educativas de la región, y 01 simulacro nacional, monitoreadas por la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.

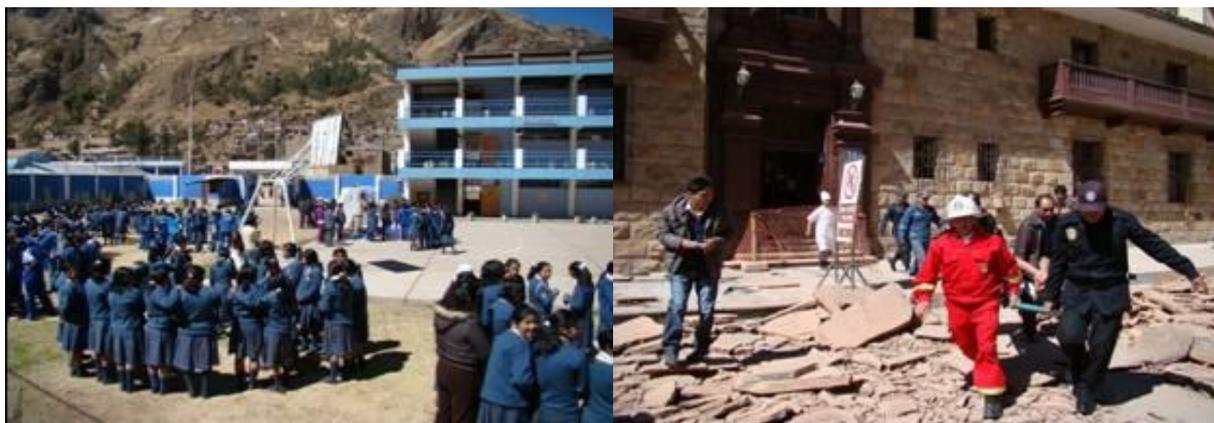

Participación de las II.EEs y población en general en simulacros

- Instalación y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
- Atención con ayuda humanitaria a las poblaciones damnificadas, por diferentes eventos de riesgo y desastre, anivel regional.

FENOMENO/PELIGRO Y/O EMERGENCIA	ATENCIONES REALIZADAS CON AYUDA HUMANITARIA
COLAPSAMIENTO DE VIVIENDAS	05 ATENCIONES
CONTAMINACION AMBIENTAL	05 ATENCIONES
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS	07 ATENCIONES
HELADAS	76 ATENCIONES
INCENDIO URBANO	09 ATENCIONES
INUNDACION	05 ATENCIONES
LLOCLLA (HUAYCO)	06 ATENCIONES
LLUVIAS	55 ATENCIONES
SEQUIAS	11 ATENCIONES
VIENTOS FUERTES	05 ATENCIONES



Entrega de ayuda humanitaria


- Limpieza del cauce del Rio Ichu, en prevención de riesgos en la cuenca hidrográfica del mismo, en el tramo Puente San Cristóbal – Puente Warmichaca, canal de Accocucho del Barrio de San Cristóbal.



**LOCALES DE LA PNP CONSTRUIDAS**



PNP de Villa de Arma

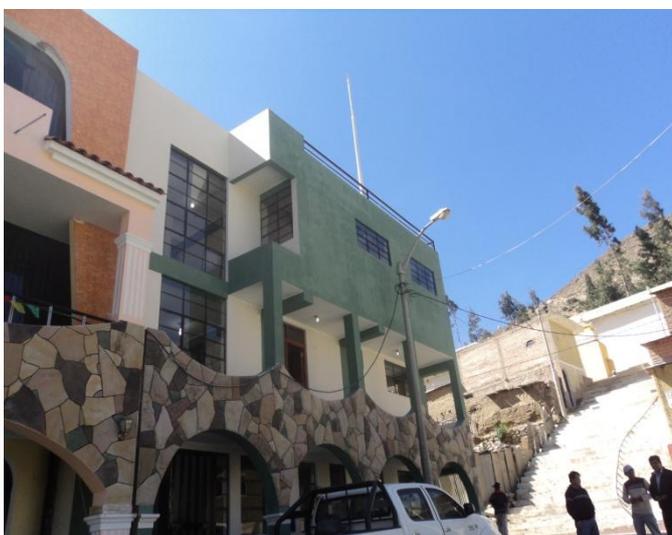

PNP de Stgo de Chocorvos

**2.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO**

**ACCIONES DE PLANEAMIENTO E INSTITUCIONALIDAD**

- Culminación de la Actualización del Plan Vial Departamental 2010-2018
- Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional 2007-2010
- Elaboración y evaluación del POI Regional 2010
- Formulación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Huancavelica
- Saneamiento de Límites y Organización Territorial de la Provincia de Churcampa.
- Formulación de la Rendición de Cuentas de Titulares de Pliego, 2009.
- Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional 2010

**PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PP 2011**

SECTOR	PYS EJE TERRITORIAL	PYS EJE TEMATICO	TOTAL PYS
AGRICULTURA	0	3	3
EDUCACION	1	3	4
SALUD	1	0	1
TRANSPORTES	5	2	7
SANEAMIENTO	1	0	1
MULTISECTORIAL	1	1	2
ENERGIA	1	3	4
CAMELIDOS SUDAMERICANOS	1	3	4
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>



Taller de Priorización de Pvs- Mesa Hvca



Taller de Identificación de Proyectos



Juramentación de Miembros del CVC

### ACTIVIDADES OREPI

Durante el año 2010, la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión, programó un total de 92 proyectos por A.D y 31 por Consultorías, acumulando un total de 73 estudios viabilizados y aprobados, así mismo se cuenta con 20 estudios aprobados en el marco del Convenio UNI-GRH (16 educativos y 4 viales), 03 estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad aprobados. Detalle en los cuadros siguientes:

#### ESTUDIOS POR ADM.DIRECTA

ESTUDIOS DE PRE INVERSION SEGÚN CONDICION	CANTIDAD	ESTUDIOS DE PRE INVERSION POR SECTORES	CANTIDAD
		Proyectos especiales	9
Estudios aprobados	54	Infraestructura vial	10
estudios observados	6	Cobertura educativa	44
Estudios presentados	22	Saneamiento	4
Estudios culminados	5	Salud	14
En formulación	5	Riego	7
		Otros	4
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

#### ESTUDIOS POR CONSULTORIA

ESTUDIOS DE PRE INVERSION SEGÚN CONDICION	CANTIDAD
Estudios aprobados	19
estudios observados	6
Estudios presentados	1
Estudios rechazados	5
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

#### PRINCIPALES PROYECTOS DE PRE INVERSION APROBADOS ELABORADOS POR LA OREPI

NOMBRE DEL ESTUDIO	DISTRITO	CODIGO SNIP	MONTO S/.
ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO LOS ANGELES DE CCARAHUASA	HUANCAMELICA	77557	17,147,656.00
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ - HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	105807	20,787,863.00
CONSTRUCCION IRRIGACION CHACAPERDIDA-TANTARA, DISTRITO DE TANTARA-CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	TANTARA	135883	5,755,729.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA, ALLPAS, BELLAVISTA, 3 DE OCTUBRE, HUAYLLAPATA, YANACCOCHA Y CHOCLOCOCHA.	ACOBAMBA	149858	10,483,841.00
MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.	HUANCAMELICA	147267	12,077,008.00
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL AMBIENTAL DE HUANCAMELICA	MULTIDISTRITAL	170928	8,436,535.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL, TIPO I-4 DE LA MICRORED ASCENSIÓN, RED HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	HUANCAMELICA	142446	6,880,430.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRORED ASCENSIÓN, RED HUANCAMELICA.	HUANCAMELICA	142357	7,925,619.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ACOSTAMBO TIPO I-4, DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA	ACOSTAMBO	146767	6,687,502.00
CONSTRUCCIÓN IRRIGACIÓN CHACAPERDIDA-TANTARA-CASTROVIRREYNA	TANTARA	135883	5,755,729.00
REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ÑUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA COLCABAMBA SANTO DOMINGO.	SANTO DOMINGO	124269	5,364,124.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO RONDAY-CONDORAY-TOTORA-QUERCO (AFIANZAMIENTO HÍDRICO)	QUERCO	154480	6,175,118.00
<b>TOTAL</b>			<b>113,477,154.00</b>

FTE: Informe 060-2011-Gob.Reg-Hvca/GGR-OREPI

### OPI REGIONAL

- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, ha evaluado y declarado viables un total de 212 Estudios de Pre Inversión, por un monto total de S/. 270,815,595.66, a nivel departamental, según detalle siguiente:

#### ESTUDIOS DE PRE INVERSION VIABILIZADOS POR LA OPI REGIONAL AÑO 2010

SECTOR	TOTAL	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO S/.
SANEAMIENTO	41	10,415,272.00
EDUCACION	71	96,820,394.47
SALUD	21	20,212,889.19
AGRICULTURA	29	64,263,699.00
TRANSPORTES	25	37,451,037.00
ENERGIA	11	8,731,355.00
VIVIENDA	0	0.00
MEDIO AMBIENTE	6	23,519,916.00
PCM	3	3,167,707.00
TURISMO	3	3,047,907.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	3,104,417.00
MINISTERIO DE LA MUJER	1	81002.00
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>270,815,595.66</b>

Asi mismo se cuenta con 66 estudios observados, 10 rechazados y 08 que pasaron a otro nivel de estudio (Pre Factibilidad y Factibilidad)

## DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

- Implementación de solución de telefonía IP en la Sede Central, Gerencias Regionales y Sub Gerencia de Huancavelica (I etapa) e interconexión inalámbrica de voz y datos, esta implementación está permitiendo la reducción de costes de tráfico de llamadas y abre la puerta al desarrollo de aplicaciones vía software que permiten al usuario acceder a funcionalidades de telefonía avanzada hasta ahora inaccesibles en la telefonía tradicional.
- Implementación del Sistema de Gestión Documentario SISGEDO, (Sistema de Información), que mejora el acceso a la información y disminuye los tiempos de atención a la ciudadanía, pues permite conocer el estado del trámite que se ha iniciado en todo expediente



- Implementación del Sistema Único de Planillas SUP, a nivel regional, incluyendo las 7 provincias y de acuerdo a la nueva estructura orgánica, logrando contar con información en tiempo real y mayor control en el proceso de pagos.
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, el cual sirve para realizar la ejecución del gasto desde la nota de pedido hasta la entrega del bien o servicio.
- Cableado estructurado categoría 6 en Locales de la Sede y Gerencias Sub Regionales, con 164 puntos, que ampliarán la red informática y acceso a los servicios y beneficios de la red
- Rediseño y Fortalecimiento de la página Web del Gobierno Regional de Huancavelica, con plataforma en línea que permite la actualización descentralizada de la página, y brindando servicios en línea a la ciudadanía para el seguimiento de sus trámites documentarios.
- Se formuló y consolidó el Manual de Organización y Funciones de la Sede Central, y Gerencias Sub Regionales, en base al nuevo ROF y CAP.
- Se formulo, actualizó y se consolidó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de todas las Unidades Orgánicas del Gob Reg. Hvca, publicado en la página web, para que los usuarios externos puedan visualizarlos
- Se Elaboraron, actualizaron y/o revisaron 13 Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gobierno Regional Huancavelica.
- Se elaboraron, actualizaron y/o revisaron 03 Reglamentos internos de los sistemas administrativos, los cuales están aprobados y publicados en la página web del Gobierno Regional Huancavelica.

## III. PRINCIPALES LOGROS Y LIMITACIONES

### 3.1. LOGROS

#### SECTOR ECONOMICO PRODUCTIVO

- Atención de 712,601 cabezas de ganado afectados por las bajas temperaturas, a nivel regional, como parte del programa de emergencias.
- Conformación de 57 Organizaciones de productores en cadenas productivas
- Identificación de 20 mercados potenciales para cadenas productivas.
- Formulación de 26 Planes de Negocios para las cadenas productivas.
- 5,559 productores agropecuarios con asistencia técnica en tecnologías de producción agropecuaria.
- Incremento de la práctica inseminación artificial en los productores de vacunos.
- Conformación de Comités de Vigilancia de productores pesqueros artesanales, para proteger el recurso hidrobiológico de la especie trucha arco iris.
- Levantamiento de la Línea de Base Estadística del sector producción.
- Fortalecimiento de capacidades de los empresarios Huancavelicanos, via pasantías a Empresas de Lima en la línea de calzados, carpintería en madera y confección en prendas de vestir.
- Apoyo en la Formalización y Constitución de 38 Pequeñas Empresas, a nivel regional
- Fortalecimiento de las capacidades empresariales y de comercialización de las MYPEs huancavelicanas, a través de participación en ferias nacionales y regionales, y eventos de capacitación.
- Promoción de las iniciativas empresariales y creatividad, a través de capacitaciones de empresarios.
- Incorporación de 04 asociaciones artesanales en la promoción y venta via web, con la construcción de sus páginas web respectivas.
- Promoción de la pequeña empresa minera, con responsabilidad social por el ambiente.
- Participación de 15 conglomerados artesanales en las ferias Nacionales e Internacionales.
- Los artesanos interiorizaron las ofertas crediticias de cada una de las empresas financieras (de Cajas Municipales y Bancos) de la localidad de Huancavelica.
- Posicionamiento del Circuito Turístico Artesanal en la localidad de Yauli, que involucra 7 Empresas artesanales adecuadamente preparadas para este objetivo.
- Reducción del 50% de la informalidad en los transportistas de Hvca.
- Reducción del 90% en accidentes de tránsito, por efecto de trabajos de fiscalización en carreteras.
- 210 Has de avena forrajera instaladas y 92 Has de quinua, como parte de los proyectos de cadenas productivas, con 2740 beneficiarios.
- Instalación de canales de riego, en un total de 38.339 Km, y 83.44 Km en curso, con mas de 23512 beneficiarios.
- Mejoramiento de carreteras en un total de 243.98 Km, y 44.96 Km en curso.
- Construcción de 16.31 Km de carreteras y 145.57 en curso.
- Instalación de 56 has de plantaciones de Ayrampu, con fines de procesamiento del fruto.

#### SECTOR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

- Organización del Congreso Macroregional del Adulto Mayor, con 165 participantes de la Región Centro.
- Elaboración del Plan Regional de Infancia y Adolescencia, para encaminar las acciones a favor de los niños y adolescentes de la región.
- Implementación de la OREDIS Hvca. a fin de atender a la población con discapacidad de la región.
- Aprobación mediante Ordenanza Regional, de la Política Regional en Materia de Trabajo Infantil en el Ambito de la Región Huancavelica.

- Monitoreo a la elaboración de 54 Exp.Téc.de proyectos de reconstrucción en el sector Educación, FORSUR, que permitirá las transferencias financieras por S/.10,650,306.82, para el año 2011.
- Formulación del diagnóstico de base, para los planes regionales de vivienda y saneamiento, en 12 distritos priorizados.
- Formulación de 28 Perfiles de proyecto en saneamiento, a nivel departamental, como II Etapa del Programa de Saneamiento en el Departamento de Hvca.
- Instalación y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

### **SALUD y SANEAMIENTO**

- Disminución de la desnutrición crónica en el ámbito regional, registrando un tasa de 37.5%, frente al 42.9% del año 2009.
- Incremento del 10% de cobertura en las vacunas de Neumococo y rotavirus, en relación al año 2010.
- Cobertura del 43% de la meta de intervenciones quirúrgicas de cataratas, y 126% de tamizajes de catarata.
- Contratación de 191 profesionales de la salud (Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Biólogos y Otros) con cargo al presupuesto del PPR.PAN
- Logro del 86% de cobertura de suplementación de vitamina y multimicronutrientes a niños menores de 5 años.
- Evaluación nutricional a través del SIEN a 53,211 niños menores de 5 años a nivel regional.
- control pre natal reenfocado 2754 (91.5%), atención del parto institucional 96.79 % de las gestantes atendidas
- Se logró incrementar la atención de adolescentes con crecimiento y desarrollo completo de 69,2% en el 2009 a 89,8% en el 2010. En cuanto a la valuación nutricional en el 2009 se logra al 72.8% de los atendidos y en el 2010 al 91,1%.
- 26% de la población Huancavelicana, accede a agua segura, frente al 23% registrado para el año 2009.
- Vigilancia sanitaria en 67 distritos (71.2%), determinando un nivel de riesgo alto en un 32.6% de ellos, en la gestión de residuos sólidos.
- Cobertura del 95% de la población asignada, en la afiliación al SIS.
- Incremento del 12% en las afiliaciones al SIS, en referencia al año 2009.

### **EDUCACION**

- Mejora de la capacidad de comprensión lectora en alumnos del 2do Grado de Educación Primaria, de 2.8% registrado para el año 2007, a 6.6% para el año 2010, y en razonamiento lógico matemático se pasó de 1.7% registrado para 2007 a 6.4% para el año 2010.(POI 2011-DRE)
- Equipo Técnico del PELA, es soporte técnico-pedagógico del proceso de Acompañamiento Pedagógico en el marco del Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje”.
- Mayoría de Especialistas de los niveles de Educación Inicial y Primaria comprometidos que ejecutan las acciones de Monitoreo de acuerdo a la muestra establecida por el Ministerio de Educación.
- Cobertura de un 98% de acompañantes pedagógicos, quienes vienen laborando de acuerdo a las exigencias del Programa.
- 130 Acompañantes Pedagógicos capacitados y competentes en estrategias y metodologías de comunicación, matemática, programación curricular, evaluación de los aprendizajes y protocolos
- 10 Responsables de Centros de Recursos, cumplen las funciones de manera adecuada en acciones de apoyo administrativo, institucional y técnico pedagógico.
- 114 micro talleres ejecutados por los docentes acompañantes en el ámbito de sus Jurisdicciones.
- 15 Campañas de información sobre los aprendizajes de los estudiantes y de la Evaluación Censal de Estudiantes dirigidos a Padres de Familia de la Instituciones Educativas focalizadas.
- Acompañantes Pedagógicos aplican diseños de aprendizajes significativos para desarrollar capacidades comunicativas de oralidad, comprensión, y pensamiento lógico matemático

- 1,264 capacitados entre docentes y directores, en Gestión de la Educación, Estrategias Metodológicas de Comunicación, Matemática, Programación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes a través de Talleres
- 28 pasantías ejecutadas con participación de docentes de aula a nivel regional, para intercambiar experiencias exitosas.
- Incremento de participación activa de las Instituciones Educativas inclusoras a nivel de la región

#### **Proyectos:**

- Instalación de sistema de agua potable en 45,361 ML, con 795 conexiones domiciliarias de agua y desagüe instalados, y 8170 conexiones en curso.
- Reconstrucción de 05 EE.SS afectadas por el sismo del 2007, y 02 EE.SS con obra en curso.
- Mejoramiento y ampliación de 24 EE.SS considerando su equipamiento y capacitaciones para el personal, así como 36 EE.SS con obra en curso.
- Culminación del Hospital de Pampas, con más de 30,000 beneficiarios.
- Instalación de 447 Módulos productivos en las I.EEs del departamento, bajo el enfoque productivo de la educación Básica.
- Construcción y mejoramiento de 19 I.EEs, a nivel departamental, y 55 I.EEs con obra en curso.

#### **SECTOR AMBIENTAL, RECURSOS NATURALES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL**

- Desarrollo del Primer Encuentro Regional de la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil.
- Conformación del Grupo Técnico Regional del Agua, ejecutando actualmente el proyecto de Gobernabilidad del Agua.
- Formulación de Políticas de Gestión del Agua-Diagnóstico Temático del Agua, en convenio con IPROGA
- Evaluación del Enfoque Ambiental aplicado en 120 I.EEs de la región, en coordinación con la DRE-Hvca
- Fortalecimiento de capacidades de los actores y Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres, en la región Huancavelica
- Instalación de 11,129 Has con plantaciones forestales definitivas, con cercos de protección y organización de comités Comunales.

#### **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OTROS**

- Evaluación y declaratoria de viabilidad de 212 Estudios de Pre Inversión, por un monto total de S/. 270,815,595.66, a nivel departamental
- Modernización del sistema de telefonía (Sistema IP) en la Sede Central, Gerencias Regionales y Sub Gerencia de Huancavelica (I etapa) e interconexión inalámbrica de voz y datos, esta implementación está permitiendo la reducción de costes de tráfico de llamadas y abre la puerta al desarrollo de aplicaciones vía software que permiten al usuario acceder a funcionalidades de telefonía avanzada hasta ahora inaccesibles en la telefonía tradicional.
- Implementación con equipos PAD modernos, de las oficinas de la Sede Central del Pliego Regional.

### **3.2. LIMITACIONES**

- Limitaciones presupuestales y legales, para la implementación de los CAPs de las diferentes U.Es del pliego, que restringen el accionar institucional.
- Dificultad de acceso y medios de comunicación a zonas rurales, para la intervención de los diferentes sectores.
- Limitación en la disponibilidad de ambientes apropiados y equipados, para el personal, que se encuentre acorde a la actual carga laboral.
- Limitación en la disponibilidad de presupuesto de gasto corriente, para el desarrollo de actividades de “línea” de los diferentes órganos estructurados de la región.
- Retrazos en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, limitando los niveles del gasto.

- Falta de Institucionalización de Programas de Capacitación para el personal, que mejoren las aptitudes y capacidades de los mismos.
- Centralismo administrativo en la Sede Central del Pliego, que restó la autonomía de las U.Es descentralizadas.
- Disponibilidad limitada de unidades móviles, que restó las acciones de campo, supervisión y control propios de los Organos Sectoriales.
- Ausencia de políticas públicas sectoriales, que direccionen las actividades de las Direcciones Regionales Sectoriales.
- Sistemas de referencias y contra referencias de salud deficientes.
- Falta de un laboratorio para análisis físico químico de aguas, y profesionales biólogos, para analisis bacteriológico de muestras.
- Falta de equipamiento del laboratorio entomológico de la DIRESA.
- Falta de adecuación del Organigrama Estructural de la DRTyPS, a sus funciones reales.
- tancia.



Personal de la G.R.de Desarrollo Social



Personal de la G.S.R.de Churcampa



Personal de la G.R.de Desarrollo Económico



Personal de la G.Regional de Infraestructura



Personal de la G.Regional de RR.NN y GMA



Personal de la Oficina Regional de Administración



Personal de la G.S.R de Huaytará

## IV. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

### COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del Gobierno Regional de Huancavelica, para el año 2010, fue de S/. 371,759,009.00 por toda Fuente de Financiamiento, ascendiendo a S/. 589,948,580.00 como Presupuesto Institucional Modificado (PIM), esto por efecto de las transferencias de los diversos conceptos de Canon y Regalías Mineras, así como recursos por transferencias de funciones, para el SIS, EUROSPAN (PAN), INDECI, MINEDU, los recursos para inversiones de los Bonos Soberanos, FORSUR y FONIPREL etc. Mismos que se orientaron a la ejecución de metas tanto de actividades y proyectos.



El siguiente Cuadro, nos muestra las variaciones del PIA y PIM, y Ejecución Presupuestal, según Fuentes de Financiamiento y Genéricas del gasto.

### PIA, PIM Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2010 SEGÚN RUBROS DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO

FTE FTO/GEN. DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% PIM/PIA	% Ejec/PIM
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					
52.1 PERS.OBLIG.SOCIALES	198,655,662	202,393,246	199,224,566.53	101.88	98.43
52.2 PENSIONES	17,111,916	17,636,788	16,300,639.17	103.07	92.42
52.3 BIENES Y SERVICIOS	51,710,942	53,829,207	49,205,066.80	104.10	91.41
52.5 OTROS GASTOS	813,000	3,403,982	3,327,417.97	418.69	97.75
62.5 OTROS GASTOS	0	1,755,052	1,755,051.23		100.00
62.6 ADQ.ACT.NO FINANC	73,515,350	98,968,779	51,750,389.85	134.62	52.29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>341,806,870</b>	<b>377,987,054</b>	<b>321,563,131.55</b>	110.58	85.07
<b>REC.DIRECT.RECAUDADOS</b>					
5.2.1 PERS.OBLIG.SOCIALES	101,600	101,600	0.00	100.00	0.00
52.3 BIENES Y SERVICIOS	3,658,400	3,518,532	2,313,079.22	96.18	65.74
52.5 OTROS GASTOS	0	36,000	25,006.32		69.46
62.6 ADQ.ACT.NO FINANC	240,000	1,216,972	689,569.36	507.07	56.66
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,873,104</b>	<b>3,027,654.90</b>	121.83	62.13
<b>DONAC.Y TRANSFERENCIAS</b>					
5.2.1 PERS.OBLIG.SOCIALES	0	828,388	170,600.00		20.59
52.3 BIENES Y SERVICIOS	0	17,673,950	9,299,155.58		52.62
62.6 ADQ.ACT.NO FINANC	0	16,354,103	2,874,796.96		17.58
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34,856,441</b>	<b>12,344,552.54</b>		35.42
<b>RECURS.DETERMINADOS</b>					
52.3 BIENES Y SERVICIOS	2,895,214	6,119,306	3,928,431.40	211.36	64.20
52.5 OTROS GASTOS	0	881,600	0.00		0.00
62.4 DONAC.Y TRANSFEREN	2,745,911	3,314,344	3,178,099.66	120.70	95.89
62.5 OTROS GASTOS	0	4,219,976	4,219,976.00		100.00


62.6 ADQ.ACT.NO FINANC	20,311,014	157,696,755	103,968,745.80	776.41	65.93
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25,952,139</b>	<b>172,231,981</b>	<b>115,295,252.86</b>	663.65	66.94
<b>A TODA FUENTE</b>					
5.2.1 PERS.OBLIG.SOCIALES	198,757,262	203,323,234	199,395,166.53	102.30	98.07
5.2.2 PENSIONES	17,111,916	17,636,788	16,300,639.17	103.07	92.42
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,264,556	81,140,995	64,745,733.00	139.26	79.79
5.2.5 OTROS GASTOS	813,000	4,321,582	3,352,424.29	531.56	77.57
62.4 DONAC.Y TRANSFEREN	2,745,911	3,314,344	3,178,099.66	120.70	95.89
62.5 OTROS GASTOS	0	5,975,028	5,975,027.23		100.00
62.6 ADQ.ACT.NO FINANC	94,066,364	274,236,609	159,283,501.97	291.54	58.08
<b>TOTAL A TODA FUENTE</b>	<b>371,759,009</b>	<b>589,948,580</b>	<b>452,230,591.85</b>	<b>158.69</b>	<b>76.66</b>

En los siguientes gráficos vemos la variación porcentual entre el PIA y el PIM, a nivel del Pliego y por Genéricas del Gasto.

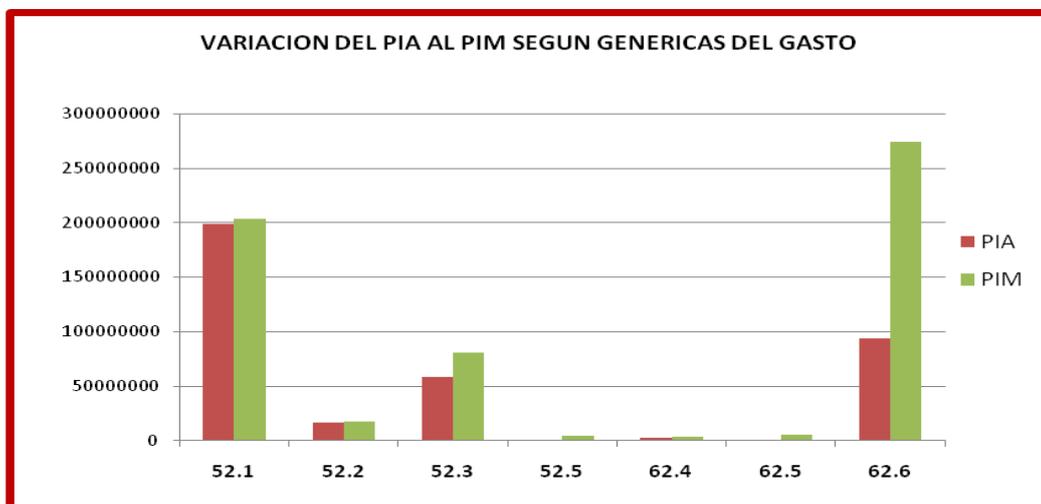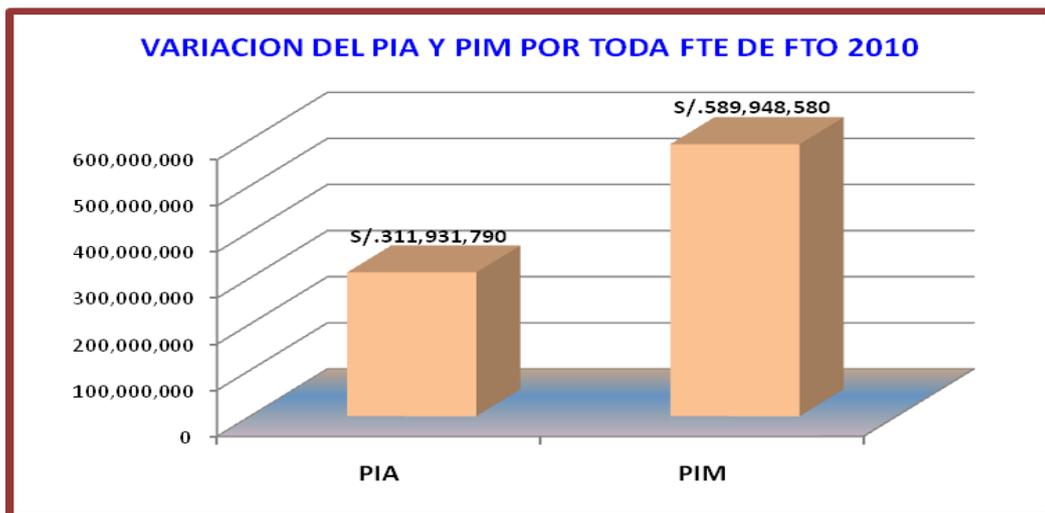


**PARTICIPACION DE LOS RUBROS DE FINANCIAMIENTO EN EL PIM 210**

El PIM 2010 del Pliego Región Huancavelica, estuvo integrado por 04 Fuentes de Financiamiento, correspondiendo la mayor participación a los Recursos Ordinarios, con 64%, seguido los Recursos Determinados con 29%, Donaciones y Transferencias con 6%, y los Recursos Directamente Recaudados, con 1%. Inciden en la participación de los Recursos Ordinarios, los recursos de planillas del personal activo y pensionista del Pliego, así como los gastos de inversiones.

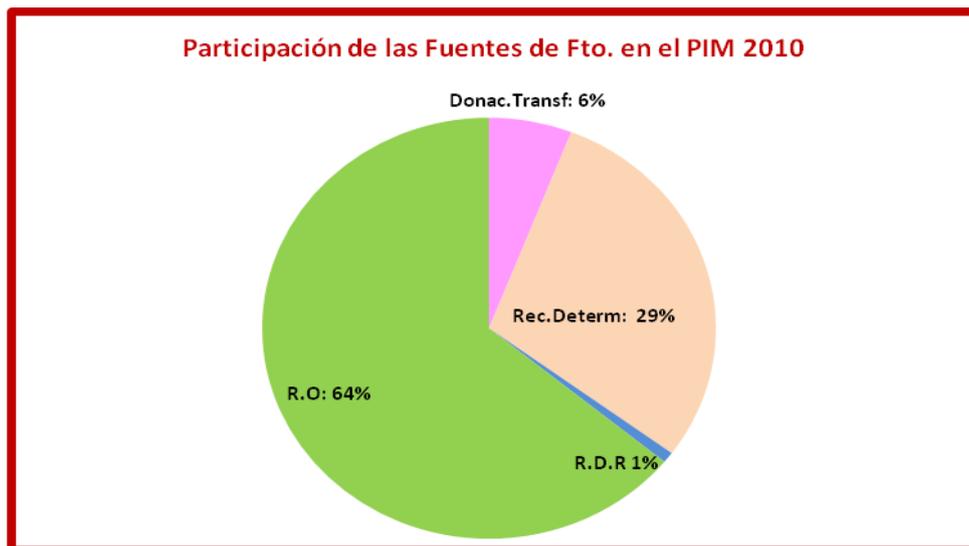

**COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO FRENTE AL PIM 2010 POR GENERICAS DEL GASTO**

Los niveles del gasto, frente al PIM 2010, muestra porcentajes diferenciados a nivel de la Genéricas del Gasto, así tenemos que las Genéricas con mayores niveles de gasto fueron la 52.1 (Personal y Obligaciones Sociales), la 52.2 (Pensiones) y 62.5 Otros Gastos, con 98.07%, 92.42% y 100% respectivamente, esto por lo puntual de los conceptos que financian; caso contrario se observa en la genérica 62.6 (Adquisición de Activos No Financieros), con apenas el 58.08% de cumplimiento, incidiendo en este caso la menor ejecución de los recursos de inversiones, por las razones que se exponen en el Item del Seguimiento del Programa de Inversiones. El siguiente gráfico muestra lo señalado.

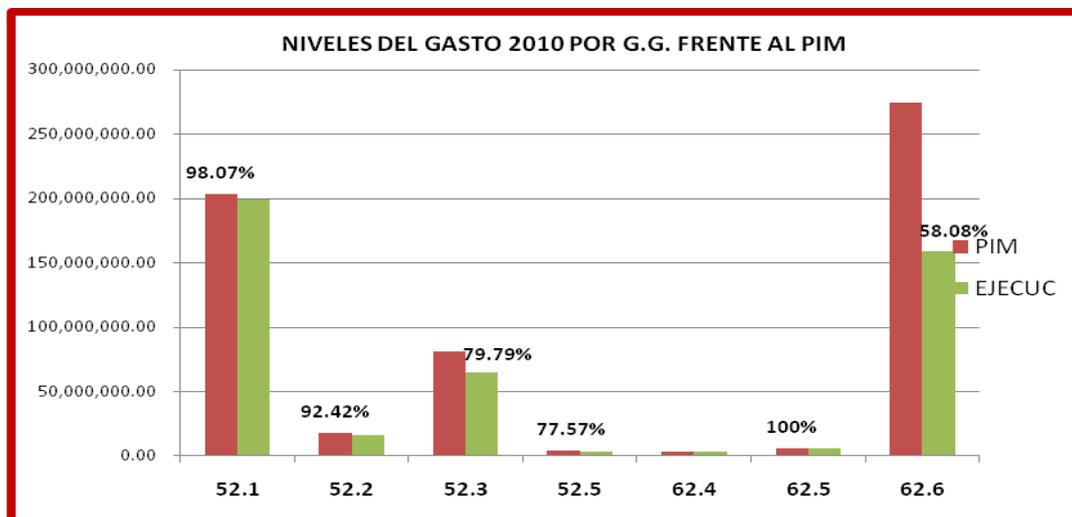

**COMPORTAMIENTO DEL GASTO 2010 SEGÚN FUNCIONES  
PROGRAMATICAS A TODA FUENTE**

FUNCIÓN	EJECUCIÓN DE GASTO			% PARTICIP. DE LA FUNCIÓN
	GASTO DE CAPITAL	GASTO CORRIENTE	A TODA FUENTE	
AGROPECUARIA	11,669,487	5,133,068	16,802,555	3.72%
CULTURA Y DEPORTE	57,758	0	57,758	0.01%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	98,199	0	98,199	0.02%
EDUCACIÓN	58,319,948	175,348,903	233,668,851	51.67%
ENERGÍA	3,616,738	143,008	3,759,746	0.83%
INDUSTRIA	14,350	264,829	279,179	0.06%
MEDIO AMBIENTE	16,542,717	0	16,542,717	3.66%
MINERÍA	2,880	269,831	272,711	0.06%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,205,044	460,486	2,665,531	0.59%
PESCA	45,706	323,878	369,584	0.08%
PLANEAM.GESTIÓN Y RESERVA CONTIN	5,668,463	25,826,672	31,495,135	6.96%
PROTECCIÓN SOCIAL	356,600	522,287	878,887	0.19%
SALUD	23,462,523	61,270,593	84,733,116	18.74%
SANEAMIENTO	10,899,570	0	10,899,570	2.41%
TRABAJO	3,000	353,705	356,705	0.08%
TRANSPORTE	25,299,619	5,603,760	30,903,379	6.83%
TURISMO	886,505	130,878	1,017,383	0.22%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	93,360	352,582	445,942	0.10%
PREVISIÓN SOCIAL		16,515,557	16,515,557	3.65%
COMERCIO		164,074	164,074	0.04%
COMUNICACIONES	41,035	262,979	304,014	0.07%
<b>TOTAL</b>	<b>159,283,502</b>	<b>292,947,090</b>	<b>452,230,592</b>	<b>100.00%</b>

Los niveles del gasto para el año 2010, se concentra mayormente en las Funciones de Educación con 51.67%, Salud con 18.74%, seguidos de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 6.96% y Transporte con 6.83%. Inciden en el comportamiento de las dos primeras Funciones, los recursos asignados al gasto de planillas de personal activo y pensionista de las Direcciones Regionales de Educación y Salud, cuyas PEAs son las mas numerosas del Pliego, así como la asignación de mayores recursos para la atención de los Programas Estratégicos (PELA, PAN, SMN).

**COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DEL GASTO SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS 2010**

Unidad Ejecutora	RUBROS DE FINANCIAMIENTO								TOTALES			
	Donaciones y Transferencias		Recursos Determinados		Recursos Directamente Recaudados		Recursos Ordinarios		PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIM	% Particip. UEs
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN				
ACOBAMBA	958,297	714,523	9,085,379	6,606,662	68,319	65,913	28,680,948	26,761,835	38,792,943	34,148,934	88.03%	7.55
ANGARAES	1,288,696	819,480	16,584,369	13,603,232	62,903	40,470	34,394,975	30,650,837	52,330,943	45,114,019	86.21%	9.98
CASTROVIRREYNA	459,370	327,558	5,077,228	3,016,790	36,580	15,607	22,968,871	21,723,910	28,542,049	25,083,866	87.88%	5.55
CHURCAMP	933,783	623,027	16,119,475	13,521,371	30,500	21,239	26,938,404	26,084,890	44,022,162	40,250,528	91.43%	8.90
HOSPITAL DPTAL	1,491,436	1,418,801			750,238	356,107	13,147,181	12,925,863	15,388,855	14,700,771	95.53%	3.25
HUAYTARA	242,453	189,053	10,640,698	4,063,374	30,857	10,200	23,847,080	22,490,194	34,761,088	26,752,820	76.96%	5.92
SEDE CENTRAL	23,853,780	6,720,337	88,992,752	52,435,226	3,674,216	2,301,859	177,100,424	135,570,187	293,621,172	197,027,609	67.10%	43.57
TAYACAJA	5,628,626	1,531,773	25,732,080	22,048,597	219,491	216,260	50,909,171	45,355,414	82,489,368	69,152,044	83.83%	15.29
<b>TOTAL</b>	<b>34,856,441</b>	<b>12,344,553</b>	<b>172,231,981</b>	<b>115,295,253</b>	<b>4,873,104</b>	<b>3,027,655</b>	<b>377,987,054</b>	<b>321,563,132</b>	<b>589,948,580</b>	<b>452,230,592</b>	<b>76.66%</b>	<b>100.00%</b>

El comportamiento del gasto por Unidades Ejecutoras, que se señalan en el Cuadro, nos muestra que los niveles mayores se concentran en la UE Sede Central con 43.57%, seguido de la UE Tayacaja con 15.29%, mientras que los menores niveles corresponden a las UEs Castrovirreyna y Hospital Departamental, con 5.55% y 3.25% respectivamente. Inciden en el nivel alcanzado por la Sede Central, la mayor participación en los gastos de planillas (por efecto de la nueva estructura Orgánica) y la centralización de los recursos de inversiones que esta tuvo.

Por otro lado, los mayores niveles del gasto en referencia al PIM, corresponden a las UEs Hospital Dptal y Churcampa con 95.53% y 91.43%, caso contrario el menor nivel alcanzado corresponde a la Sede Central con 67.10%, por efecto del menor gasto de recursos de inversiones en todas las Fuentes de Financiamiento.


**PRESUPUESTO MODIFICADO Y RECAUDACION DE INGRESOS, POR UNIDADES EJECUTORAS Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO**

UNIDAD EJECUTORA	RUBROS DE FINANCIAMIENTO						PIM PLIEGO	RECAUDACIÓN PLIEGO	% RECAUD/ PIM
	Donac y Transferencias		Recursos Determinados		Recursos Directam. Recaudados				
	PIM	RECAUDACIÓN	PIM	RECAUDACIÓN	PIM	RECAUDACION			
ACOBAMBA	958,297	0.00	8,951,941	880,976.74	68,319	87,878.06	9,978,557	968,854.80	9.71%
ANGARAES	1,288,696	1,288,402.00	15,302,609	14,054,985.10	62,903	71,660.40	16,654,208	15,415,047.50	92.56%
CASTROVIRR	459,370	407,620.00	2,299,114	4,041,872.00	36,580	23,745.55	2,795,064	4,473,237.55	160.04%
CHURCAMP	933,783	933,783.00	14,859,033	13,571,560.86	30,500	27,130.62	15,823,316	14,532,474.48	91.84%
HOSPITAL	1,491,436	1,709,426.93			750,238	875,930.80	2,241,674	2,585,357.73	115.33%
HUAYTARA	242,453	242,453.00	7,496,820	1,124,522.87	30,857	17,197.39	7,770,130	1,384,173.26	17.81%
SEDE CENTRAL	27,749,615	23,976,763.13	98,948,465	101,672,930.80	3,674,216	3,013,455.80	130,372,296	128,663,149.73	98.69%
TAYACAJA	1,732,791	5,630,605.68	24,373,999	19,154,288.00	219,491	232,970.11	26,326,281	25,017,863.79	95.03%
<b>TOTAL</b>	<b>34,856,441</b>	<b>34,189,053.74</b>	<b>172,231,981</b>	<b>154,501,136.37</b>	<b>4,873,104</b>	<b>4,349,968.73</b>	<b>211,961,526</b>	<b>193,040,158.84</b>	<b>91.07%</b>

La recaudación de ingresos a nivel del Pliego, muestra un grado de cumplimiento del 91.07% frente al PIM previsto, por toda Fuente de Financiamiento.

A nivel de UEs, los mayores montos de recaudación, se dieron en la Sede Central, seguido de Tayacaja, Angaraes y Churcampa. Por otro lado el comportamiento de la recaudación frente al PIM, muestra que los mayores niveles corresponden a las UEs Castrovirreyna y Hospital, con 160.04% y 115.33% respectivamente, mientras los menores niveles fueron registrados por las UEs Acobamba y Huaytará, con 9.71% y 17.81%.

En las fuentes Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias, las recaudaciones corresponden mayoritariamente a las transferencias para ejecución de proyectos de inversión.

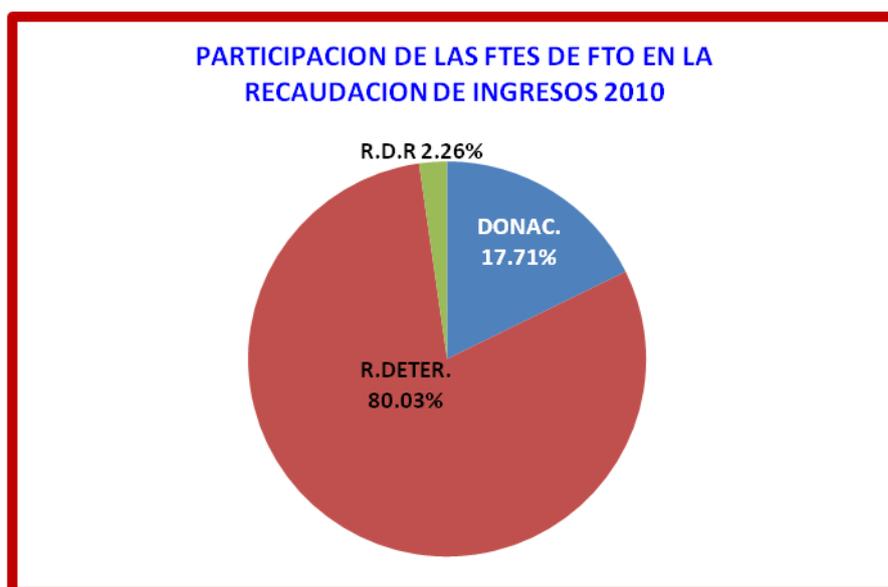

## V. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

El Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica, se apertura para el año 2010 con un PIA de S/. 92,632,109.00 por toda fuente de Financiamiento, incrementándose a S/. 266,373,909.00 para el PIM, como producto de las transferencias financieras por Canon Hidroenergético, Minero y Regalías Mineras, así como las transferencia por los Bonos Soberanos (Fideicomiso S/. 71,045,540.36), y el FONIPREL, entre otros. El comportamiento del gasto presenta un nivel promedio de 57.75% frente al PIM, correspondiendo el mayor porcentaje a la Fuente Recursos Determinados con 65.81%, seguido de Recursos Ordinarios con 51.58% y Donaciones y Transferencias con 12.70%.

En general el comportamiento que se presenta, obedece a los retrasos en los procesos de aprobación de Expedientes Técnicos y POAs de los proyectos, así como al de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios; así mismo se sumaron a ello la desahabilitación de buen número de PIPs de Gobiernos Locales que superaron la sensibilidad de sus estudios, en la elaboración de sus Expedientes Técnicos, determinando su exclusión y reemplazo en el Programa de Inversiones, con los retrasos que ello ameritó en la ejecución de los gastos. El siguiente Cuadro, nos muestra el comportamiento aludido.

### COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2010 (S/.)

FUENTE FTO	PIA	PIM	EJECUCION	% EJEC/PIM
Recursos Ordinarios	72,321,095.00	95,827,610.00	49,429,488.46	51.58
Donac.Transferencias	0.00	14,731,647.00	1,871,481.06	12.70
R.Determinados	20,311,014.00	155,814,652.00	102,542,690.39	65.81
<b>TOTAL</b>	<b>92,632,109.00</b>	<b>266,373,909.00</b>	<b>153,843,659.91</b>	<b>57.75</b>

La ejecución de proyectos, se llevó a cabo bajo tres modalidades, es así que de los 218 de proyectos programados, 51 corresponden a la modalidad Contrata, 15 a Encargo, y 152 a Administración Directa. Los proyectos por encargo corresponden a convenios suscritos con Municipalidades en el año 2009 y que tuvieron continuidad para el 2010.

### PROYECTOS 2010 SEGÚN MODALIDAD DE EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION	Nº DE PROYECTOS	% PARTIC.
Administración Directa	152	69.72
Contrato	51	23.39
Encargo	15	6.88
<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>100.00</b>

Por otro lado, se concluyeron con un total de 63 proyectos, entre nuevos y de continuidad, estando en proceso de liquidación y entrega.

En el siguiente cuadro, podemos apreciar la distribución y comportamiento del gasto de inversiones 2010, a nivel de las Unidades Ejecutoras, evidenciándose la centralización mayoritaria de los recursos en la UE Sede Central con 56.40%, mientras que la UE con menor participación, fue la UE Castrovirreyna con apenas 2.80%. Así mismo los niveles de gasto frente al PIM por Unidades Ejecutoras, muestran que la UE con mayor nivel fue Churcampá con 86.76%, y la menor nivel Huaytará con 45.47%

**COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN POR UEs Y FTES DE FTO (S/.)**

Unidad Ejecutora	Donaciones y Transferencias		Recursos Determinados		Recursos Ordinarios		A Toda fuente		% PARTIC/PIM
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	
ACOBAMBA			9,023,823	6,606,662.20	5,391,906	4,468,349.97	14,415,729	11,075,012	5.41
ANGARAES			16,584,369	13,603,231.67	6,941,552	4,351,954.47	23,525,921	17,955,186	8.83
CASTROVIRREYNA			5,077,228	3,016,790.02	2,373,347	2,071,052.50	7,450,575	5,087,843	2.80
CHURCAMP			16,119,475	13,521,371.27	5,355,827	5,110,212.39	21,475,302	18,631,584	8.06
HUAYTARA			10,640,698	4,063,374.31	2,896,111	2,091,878.64	13,536,809	6,155,253	5.08
SEDE CENTRAL	10,835,812	1,710,821.36	72,636,979	39,682,452.45	66,763,428	30,493,579.15	150,236,219	71,886,853	56.40
TAYACAJA	3,895,835	160,659.70	25,732,080	22,048,808.47	6,105,439	842,461.34	35,733,354	23,051,930	13.41
<b>TOTAL</b>	<b>14,731,647</b>	<b>1,871,481.06</b>	<b>155,814,652</b>	<b>102,542,690.39</b>	<b>95,827,610</b>	<b>49,429,488.46</b>	<b>266,373,909</b>	<b>153,843,660</b>	<b>100.00</b>

Por otro lado, la distribución de los recursos de inversión ejecutados por Provincias, muestra las mayores participaciones para las provincias de Huancavelica y Tayacaja, con 31.97% y 17.97% respectivamente; mientras las de menor participación fueron las Provincias de Castrovirreyna y Acobamba, con 4.59% y 9.49%. El cuadro que sigue muestra dicho comportamiento.

**DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN POR PROVINCIAS Y FTES DE FTO (S/.)**

Provincia	Donaciones y Transferen	Recursos Determinados	Recursos Ordinarios	Total	% PART/PROV
ACOBAMBA	608,914.86	9,043,614.71	4,940,919.37	14,593,448.94	9.49
ANGARAES	150,057.56	13,782,476.90	5,581,453.58	19,513,988.04	12.68
CASTROVIRREYNA	0.00	4,240,009.11	2,818,093.34	7,058,102.45	4.59
CHURCAMP	145,167.64	13,976,312.76	5,890,573.12	20,012,053.52	13.01
HUANCAMELICA	380,692.74	30,431,622.51	18,379,012.40	49,191,327.65	31.97
HUAYTARA	316,227.00	6,924,259.97	8,582,447.23	15,822,934.20	10.29
TAYACAJA	270,421.26	24,144,394.43	3,236,989.42	27,651,805.11	17.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,871,481.06</b>	<b>102,542,690.39</b>	<b>49,429,488.46</b>	<b>153,843,659.91</b>	<b>100.00</b>

Los detalles de los avances físicos y financieros, a nivel de proyectos se aprecian en los cuadros siguientes del **Seguimiento del Programa de Inversiones 2010**.

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6,150,875</b>	<b>3,210,691.74</b>				
		<b>00</b>	<b>3,264,876</b>	<b>1,862,095.86</b>				
		<b>13</b>	<b>84,425</b>	<b>32,872.32</b>				
		<b>18</b>	<b>2,801,574</b>	<b>1,315,723.56</b>				
<b>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>								
Estudios de Pre Inversión Hvca, Contrapartidas (0001)	Hvca	18	87,998	0.00				No programado
Estudios de Pre Inversión Hvca (0005)	Hvca	00	677,638	416,299.90	Estudio		S/I	
		18	52,071	0.00				
Estudios de Pre Inversión Tayacaja	Tayacaja	00	99,943	52,389.08	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión Castrovirreyna	Castrovirrey	00	64,015	27,459.00	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión Huaytará	Huaytará	00	84,613	78,270.00	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión Acobamba	Acobamba	00	77,627	19,800.00	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión Angaraes	Angaraes	00	70,815	66,455.84	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión-Estudio Mejoram. Ampliac. Sistema Agua y alcantarillado C.P.M. S.Rosa de Pachacla, Cunyac, Yauli.	Hvca	18	10,000	0.00				No programado
Estudios de Pre Inversión: Estudio Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua potable y Alcantarillado de la localidad de Izcuchaca. 0615	Hvca	18	35,000	34,590.00	Estudio	1	S/I	
Estudios de Pre Inversión, Const.del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina de Callqui Chico Hvca. 0616	Hvca	18	30,000	25,179.10	Estudio	1	S/I	
Estudios de Pre Inver: Protección, Conservación y Aprovecham.Repoblamiento de Vicuñas en las Comunidades Altoandinas de Castrovirrey y Huaytará.	Hvca	18	30,000	22,000.00	Estudio	1	S/I	
Estudio de Pre Invers.Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas en las I.Es de la Región Hvca, en el Marco de una Educación, Intercultural Bilingüe. 0634	Hvca	18	30,000	0.00				No programado
Estudios de Pre Inversión (devengados). 0655	Hvca	00	29,680	17,680.00				Pago deudas de ejercicios anteriores
		18	29,040	29,040.00				
<b>006 GESTION</b>								
Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Dpto (0022)	Dptal	00	1,658,264	1,168,500.64	Acción	3		69 talleres, 44 equipos, 73 mat cartograf, Pg.formulac. Estudio ZEE. A.D
Estudios de Pre Inversión Hvca 2009. (0395)	Hvca	00	424,074	0.00				No programado
Estudios de Pre Inversión Churcampa	Churcampa	00	78,207	15,241.40	Estudio		S/I	
Estudios de Pre Inversión Evaluac. Exp.Técnicos (CREET)	Multiprov	18	462,690	451,663.76	Exp.Téc		S/I	
Estudios de Pre Inversión-Estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad 2009. (0433)	Multiprov	18	938,392	318,895.00	Estudio	6	50%	03 estudios aprobados, 1 presentado, 1 observado y 1 paralizado (OREPI)
Estudios de Pre Invers-Estudio Mejor.Ampliac.Agua y Alcantarillado Acobamba-Pueblos aledaños.0311	Acobamba	18	140,000	131,076.70	Estudio	1	S/I	
Estudios de Pre Inversión-Estudios Factibilidad Py Sistema Riego Papachacra, Stgo Chocorvos.	Huaytara	18	160,000	96,000.00	Estudio	1	100%	estudio presentado
Estudios de Pre Inversión-Estudio manejo de Pasivos Ambientales Mineros en la Región. 0434	Hvca	18	60,812	5,312.00	Estudio	1	S/I	
Estudios de Pre Inversión-Elaborac.Expe,Técnicos del Sector Salud, FORSUR. (0456)	Hvca	18	63,000	60,956.00	Exp.Téc		S/I	
Estudios de Pre Inversión, Estudio Factibil, Const. Sistema de Riego L.Angeles de Ccarahuasa.	Hvca	18	124,790	112,311.00	Estudio	1	100%	Estudio aprobado
Estudios de Pre Inversión-Elaboración de estudios definitivos Gob Reg. (0512)	Hvca	18	146,657	28,700.00	Estudio		S/I	
Estudios Pre Inversión. Pago del Convenio 147-2009 con la UNI Hvca.0586	Hvca	18	355,969	0.00				No programado
Estudios de Pre Inversión-Est.Pre Fact.Mejoram. Carretera Lircay-Seclla-Julcanmarca-Puente Laramate.	Hvca	18	45,155.00	0.00				No programado
Rehabilitac. Del Muro de contención del local de la Dirección Regional de Transportes Hvca. 0626	Hvca	13	84,425	32,872.32	Obra	94.17%	49.38%	
<b>05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>			<b>4,254,415</b>	<b>2,177,252.36</b>				
		<b>00</b>	<b>2,051,636</b>	<b>1,707,717.74</b>				
		<b>18</b>	<b>2,202,779</b>	<b>469,534.62</b>				
Reconstrucción Comisaria PNP Villa de Arma Castrovirreyna (Sismo) 0400	Castrovirrey	00	445,681	440,675.32	M2	902.18	71.00%	Incluye const. 07 ambientes y patio, 1504

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								beneficiarios, Contrata
		18	244,982	68,512.87				
Reconstruccion de la Comisaria PNP Ticrapo-Castrovirreyna (sismo) 0396	Castrovirrey	00	460,452	129,720.52	M2	442.49	5.36%	Incluye 07 ambientes y patio, 1795 beneficiarios, Paralizado, Contrata.DRV
		18	174,142	0.00				
Reconstruccion de Infraestructura de la Comisaria PNP Huachos (Sismo) 0397	Castrovirrey	00	120,320.00	120,320.00	M2	888.46	0%	07 ambientes y patio, 1774 benef. Problemas de incompatibilidad de terreno, Contrata.DRV
		18	602,173	1,217.77				
Reconstruccion de la Comisaria PNP Huaytará, distrito de Huaytara (Sismo) 0251, 0398	Huaytará	00	570,546	570,546.00	M2	1053.38	100%	Incluye 07 ambientes y patio, 23274 beneficiarios, Contrata.DRV
		18	390,673	324,531.98				
Reconstruccion de la Comisaria PNP Santiago de Chocorvos, distrito de Santiago de Chocorvos (Sismo)	Huaytará	00	454,637	446,455.90	M2	473.85	100%	Incluye 07 ambientes y patio, 3359 beneficiarios, Contrata.DRV
		18	90,402	38,092.00				
Construc.Muro de Contención en el Río Libertadores en el CP de Libertadores, Dist.Paucará (0514)	Acobamba	18	334,601	9,000.00	Exp.Téc	1	100%	Exp concluido
Construc.Muro de Contención en el Río San Pedro Comunidad de San Pedro-Chopcca, Distrito de Paucará.	Acobamba	18	336,626	9,000.00	Exp.Téc	1	100%	Exp concluido
Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Oficina Regional de Defensa Civil para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres. 0516	Dptal	18	10,000.00	0.00				No programado
Construcción e Implementación de la Comisaria PNP Castrovirreyna	Castrovirre	18	19,180	19,180.00				Pago de devengados
<b>09 TURISMO</b>			<b>1,271,393.00</b>	<b>881,865.20</b>				
		<b>00</b>	<b>106,760.00</b>	<b>15,750.00</b>				
		<b>13</b>	<b>42,070.00</b>	<b>42,070.00</b>				
		<b>18</b>	<b>1,122,563.00</b>	<b>824,045.20</b>				
Puesta en Valor del Santuario Ecoturístico Señor de Oropesa (0234)	Hvca	18	957,215	715,320.13	Proyecto	1	67.05%	Incluye 3 ambientes, salón de ventas, sala uso múltiple y S.H, 22573 benef. A.D
Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en los Distritos de Palca, Yauli y Paucará. 0436	Multiprov	18	165,348	108,725.07	Proyecto	1	96%	Capacitaciones, pasantías, Rueda de negocios, elaborac. catálogos, ferias y tienda virtual. A.D, 150 benefic.
Mejora de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada, 0566	Hvca	13	42,070	42,070.00	Panel	26	100%	II Etapa, instalación de 26 letreros de señalización en la ruta Pazos-Hvca. A.D
Restauración y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Templo Inca del Distrito de Huaytará.	Huaytará	00	106,760	15,750.00	Exp Téc	1	50%	Exped.con observaciones. Obra a financiar por COPESCO-Mincetur, 1219 benefic.
<b>10 AGRARIA</b>			<b>23,726,675</b>	<b>14,963,897.96</b>				
		<b>00</b>	<b>10,225,782</b>	<b>6,072,323</b>				
		<b>13</b>	<b>672,776</b>	<b>0</b>				
		<b>18</b>	<b>12,828,117</b>	<b>8,891,574.87</b>				
<b>023 AGRARIO</b>								
Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas del Productor de Papa Nativa en el Dpto.de Huancavelica	Multiprov	00	149,491	9,611.64	Proyecto	27%	0.00%	Continuid, Meta total: instal.76 has de semillas básica y 38 Has de semilla garant.05 cursos capac. 2 pasantías, festival de papa nativa, y estudio de mercado.3316 benefic. A.D.

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Instalación Campos Semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi, arveja, haba y maíz amiláceo en Dpto Hvca	Dptal	00	81,010	73,667.30	Proyecto	1%	1.00%	Continuid, Meta: 71 Has semilleros, 42 cursos de capacít, 15 Asoc.product. organizados, 2875 benef. A.D. Concluido
		18	359	358.68				
Capacitac.y Asistencia Técnica para el Mejoram. de la Productividad de la Avena en grano, en distritos de Mayor producción de las Prov.de Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja (0038)	Multiprov	00	783,758	545,096.82	Has	210	100%	Meta 2010, 210 has de Instalación de avena en grano, 03 eventos de capacitación y 02 asistencias técnicas. Concluido.966 benefic. A.D
Fortalecimiento a Productores de Quinua de las provincias de Angaraes, Huancavelica, Churcampa y Tayacaja	Multiprov	00	512,352	349,342.73	Proyecto	1	54%	92 Has de quinua instaladas, y 1840 beneficiarios. A.D
Fortalecimiento de la Dirección de Promoción Agraria para la Promoción de Productos Agropecuarios (0238)	Hvca	18	103,048	86,348.77	Proyecto	1	87%	Continuid, Meta:Adq.carpas, estrados, equipo de sonido y otros para campo ferial Hvca.
Implement.Fitotoldos para mejorar la dieta alimentaria en la Microcuenca de Ccarhuacc,Yauli	Hvca	18	16,932	13,712.49	Fitotoldo	35	99%	Continuid, Incluye 10 cursos talleres, y asistencia técnica, 797 beneficiarios. AD.
Ampliación de Areas Reforestadas con las Comunidades Atendidas por Agro Rural en el Dpto	Multiprov	18	1,553,440	1,191,516.50	Proyecto	1	54%	Plantac.definitivas 1250 Has.con protección perimétrica, y 30 capacitaciones, 32,975 beneficiarios. A.D.
Incremento de la Producción y Productividad del Cultivo de Cereales (Cebada y trigo), mediante la extensión y fortalecimiento de capacidades en las zonas productoras de la Región. (0421)	Dptal	00	22,500	21,250.00	Exp Téc	1	0%	Expediente en elaboración
Fortalecimiento y desarrollo de la Cadena Productiva de la Quinua en el Dpto.de Hvca.0517	Dptal	18	48,027.00	0.00				No programado
Fortalecimiento de capacidades competitivas a los Productores Agropecuarios en Agronegocios de los Distritos de Hvca, Ascensión, Yauli y Acoria. 0527	Hvca	18	194,098	159,134.11	Proyecto	1	100%	Asistencias técnicas, Cursos de transfer.de tecnología, Eventos feriales, Pasantías, 231 benefic.A.D
Recuperación de Suelos Agrícolas mediante la Aplicación de Biofertilizantes en el Distrito de Ñahuimpuquio. 0595	Tayacaja	00	197,947	108,659.78	Proyecto	1	47%	Produc.de biol en módulos demostrativos, asistencia técnica, 300 benefic.A.D
Produc.Hortalizas en Fitotoldos en las Zonas Altas del Sector Chopcca, Distrito de Yauli y Paucará, Prov. De Hvca y Acobamba. 0596	Multiprov	00	107,953	96,467.06	Fitotoldo	40	100%	Incluye adquisición de herramientas, 232 benefic.A.D
<b>024 PECUARIO</b>								
Desarrollo de las Alpacas en las Partes Altas del Proyecto Camisea - Huaytara. 0041	Huaytará	00	807,406	171,290.25	Proyecto	1	16.5%	Asist.téc, manejo bofedales y praderas, transf.tecnológ.mejoram iento genético y capacitaciones. Contrato
Mejoramiento de Producción del ganado vacuno en las Comunidades de las Provincias de Tayacaja y Hvca.	Multiprov	00	455,496	226,943.22	Proyecto	1	46.0%	Adquis.7 empacadoras, 7 segadoras, Instalac.7 Hás de pastos, potreros demostrativos, 28 organiz.y 7 asociac.de productores conformadas,56 talleres.1653 benefic.A.D
Mejoramiento de la Producción y Productividad de Ovinos y Alpacas en las Comunidades Altoandinas de Chupamarca, Castrovirreyna. 0426	Castrovirrey	18	53,200	0.00				No programado, perfil desactivado
Instalación Cercos Permanentes con Repoblamiento Vicuñas-Ccochatay-Huaracopata, Secla. 0458	Angaraes	00	78,355	71,321.12	Proyecto	1%	1%	meta total: 22.39 km de cerco de malla para 1080 Has, 01 Puesto manejo de 06 amb, 02 casetas

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
		18	507.00	0.00				control, equipam. y capacit. 3210 benefic.AD.
Fortalecimiento Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Hvca (Hvca, Castrov y Huaytará). 0518	Multiprov	18	82,159	12,589.00	Proyecto	28.5%	0%	Meta total: cercos permanentes 24.5 Km, elabor. de 47 planes de manejo, 01 censo de vicuñas, Implement. de 40 módulos de guardaparques, 04 pasantías, y otros. 47 C.C y 22,659 Benef. A.D,
Instalación Cerco Permanente P. Protección y Conservación de Vicuñas -C.C.San José Acobambilla.	Hvca	18	266.00	0.00				No programado.
Mejoramiento Genético y Desarrollo de la crianza de Alpacas en el distrito de Ascención. (0520)	Hvca	18	69,528.00	0.00				No programado.
<b>025 RIEGO</b>								
Construc.Irrigación San Isidro-Chonta- Marcas-Huarpa y Mozobamba, Distrito de Marcas.0043	Acobamba	00	60,000	51,927.60	Exp.Téc	1	100%	Expediente supero sensibilidad de estudio
Construc. De la presa Occsa y Sistema de Riego Tecnificado C.P. José Carlos Mariátegui, Distrito de Acoria - Hvca. 0044	Hvca	00	132,365	52,945.92	Exp.Téc	1	100%	Expediente supero sensibilidad de estudio
Construc.sistema de Riego Atanaccana - Chillhuapampa - San Miguel de Curis - Coreracc . 0272.	Huaytará	00	109,664	43,865.28	Exp.Téc	1	100%	Expediente supero sensibilidad de estudio
Construcción Canal de Riego Allcaccocha Huando II Etapa. 0264	Hvca	18	194,304	81,827.60	Presa	0.77	0.00%	Continuid, II Etapa paralizado, I Etapa 12 Km canal (83%) 8,447 benef. 2500 Has, Contrata
Instalación Sistema Riego Angaraes Norte (Callanmarca, H.Huanca, Huayllay Gde, Anchonga, Cochaccasa, Lircay) 0404	Angaraes	00	29,819	28,120.25	Proyecto	10.00%	10.00%	Continuid, Incluye 14 pequeños sistemas de riego (65,36 Km canal) y otros. Culminado. 38,818 beneficiarios. A.D
Construcción Irrigación Yauliccocha-Pazos (0302)	Tayacaja	00	184,841	144,184.00				Pago de devengados, concluido 2009
Construcción Canal Irrigación Tincocc, Tintay Punco.	Tayacaja	00	18,425	16,093.54	Proyecto	1	15.7%	Continuid, 17.738 km de canal entubado, 890 benef. Paralizado, Convenio.
Reconstrucción de la infraestructura de Riego Canal Perpetuo Socorro de la Localidad de Quito Arma (sismo)	Huaytará	00	924,933	550,460.59	Proyecto	42.89%	39.50%	1.10 Km de canal, línea de conducción con Tubería de 4,000 ML, defensa ribereña 70 M.L.continua 2011. Contrata.
		18	62,254	4,665.94				
Reconstrucción de la Infraestructura de Riego del Canal Tomacucho-Ayamarca, distrito de Ocoyo (sismo)	Huaytará	00	450,000	450,000.00	Km	3.74	100%	Incluye 11 alcantarillas de 5m. refac.de reservorio de 1200m3.Contrata, 217 benefi
		18	326,387	288,256.53				
Mejoramiento Irrigación Lircay (Lircay y Huayllay Grande) 0403	Angaraes	00	12,269	10,943.50				Concluido 2009
Mejoramiento Sistema de Riego Socococha - Los Andes - San Antonio - Yaureccan - Lacroja (0282)	Churcampa	00	69,924	62,931.60	Exp.Téc	1	100%	Expediente en verificac.viabilidad
		18	1,771,552	0.00				
Repesamiento de la laguna Ñuñunga y Sistema de Riego Maravillapampa-Colcabamba-Santo Domingo del Distrito de Chupamarca (0290)	Multiprov	00	136,463	54,585.00	Exp TéC	1	100%	Expediente superó sensibilidad de estudio
Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Riego Jonechuayjo - Runduvilca, Distrito de Colcabamba	Tayacaja	18	1,375,425	1,298,940.23	ML	10790	100%	Fideicomiso, canal entubado, 192 Has bajo riego. 408 benefic.A.D
Mejoramiento y Ampliac.Canal Riego Pumararri-Matibamba, Salcabamba	Tayacaja	00	9,776	9,770.73				Pago de devengados
Mejoramiento del Sistema de Riego de la Zona Altina del distrito de Paucarbamba	Churcampa	18	580,344	499,504.62	Km	7.2	100%	Fideicomiso. Incluye 02 reservorios y capacitaciones, 873

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								benefic.A.D
Construcción Sistema de Riego en las Comunidades Alto Andinas de Pachamarca	Churcampa	18	2,097,000	1,403,490.28	Proyecto	1	22.0%	Fideicomiso.17.400 Km de canal de conduc.250 has incorporadas bajo riego, 927 benefic.A.D
Construc. Del Sistema de Riego Tecnificado Huacraccasa - El Chorro- Pampapuquio - Huayrapata - Paccha, Provincia de Churcampa, Huancavelica	Churcampa	18	1,986,162	1,835,718.64	Km	5.6	98%	Instalac.tuberías, 01 reservorio y capacitac. 90 Has a irrigar. A.D. Fideicomiso. 1508 benefic.
Construc.Canal de Riego Plocucho-Antaparco Magnopampa, Distrito de San antonio de Antaparco	Angaraes	18	1,626,610	1,450,654.72	Proyecto	1	76.53%	canal de concreto de 10 Km, 200 has a incorporar, 350 benefic.Fideicomiso, A.D
Mejoramiento y Ampliación Canales de Irrigación del Valle Interandino de Chincho	Angaraes	00	92,000	49,680.00	Exp Téc	1	0%	Expediente en elaboración
Construcción Irrigación Viñas Pallpapampa. 0488	Hvca	13	670,592	0.00				No programado
Mejoramiento del canal de Riego Echocán-Huancho, Distrito de San Juan. 0489	Castrovirrey	13	2,184.00	0.00				No programado
		00	53,290	0.00				
Construcción Canal Riego Huayarqui (Huaribamba). 0522	Tayacaja	18	318,085	256,729.78	Proyecto	25.36%	0%	Continuid, 5.40 Km, 817 benefic.Paralizado. Convenio
Construcción Sistema de Riego Soytooccocha Antamachay-Seclla (0281)	Angaraes	00	133,546	53,418.24	Exp Téc	1	100%	Expediente superó sensibilidad de estudio
Mejoramiento de la Irrigación Tincocc-Pacomarca. 0600	Huaytará	00	358,921	356,471.04	Proyecto	1	85.54%	Continuid, 26 Km de canal, Perfil en reformul. Convenio.
Mejoram.Hidrico de la Microcuenca Tambohuaycco Anexo Sinto, Distrito de Castrovirreyna.	Castrovirrey	00	118,000	118,000.00	Exp Téc	1	0%	Exp en elaboración
Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción Canal Checche Lanlanya, Distrito de Santiago de Córdova	Huaytará	00	1,518,703	750.00	Proyecto	1	0%	S/I
Instalación del Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión Yauyopata, Moya. 0617	Hvca	18	325,481	268,738.90	Proyecto	1	100%	4566.91 ML de tuberías, 235 beneficiarios Contrata
Mejoramiento del Sistema de Riego Carhuancho, Distrito de San Pedro de Coris	Churcampa	00	102,817	102,816.80	Proyecto	50%	50%	Continuid, 6.443 Km, 3 bocatomas, 393 benef. Concluido, Convenio.
Mejoramiento Canal Riego Santa Rosa-Tantará	Castrovirrey	00	308	308.00	Proyecto	45%	0%	Continuid, Canal de concreto y obras de arte, 420 benefic. Conv.
Construc.del Vaso de Represamiento de Huarajo Anexo de Cochamarca-Distrito de Aurahuá	Castrovirrey	00	72.00	72.00	Presa	1	0%	Continuid, Presa de 40,5 mt, 503 benefic.Convenio
Construc.Sistema Irrigación Churcampa-La Merced-Mayocc II Etapa. 0653	Churcampa	00	3,000.00	0.00				No programado
<b>039 MEDIO AMBIENTE</b>								
Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Departamento de Huancavelica (Laramarca, Ocoyo, Córdova, Querco, Stgo.Quirahuará) 0259	Huaytará	00	2,510,378	2,241,329.08	Proyecto	0.5	30.00%	Meta total, 1439 Has de plantac.definit, con cercos de protec.11 cursos capacitac.27 comités conformados. 5116 benefic. A.D
Reforestación con Ayrampu en la Comunidades de Callqui Chico y Antaccocha, Hvca. (0308)	Hvca	18	21,351	19,436.71	Has	30	96%	Instal.02 viveros, produc.22230 plantones, 3 cursos capacit.966 benefic. AD
Forestación y Reforestación con Ayrampu Berberis Lutea, en San Juan de Ccarhuacc, Yauli. (0315)	Hvca	18	21,598	19,951.37	Has	26	94%	Instalación 01 vivero, produc.21000 plantones, 5 cursos capacitación, 792 benefic. AD
<b>11 PESCA</b>								
Instalación de jaulas Flotantes para la Producción intensiva de truchas en las lagunas de Mina Ccocha (Maylorccocho) y Tanseroccocha, Ascensión (0265)	Hvca	18	188,238	21,925.57	Proyecto	1	47.3%	Const.de 3 almacenes, con sala de procesamiento, e incubación, instalac.de 21 jaulas flotantes. 1050 beneficiarios, Fto

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								compartido con Minist.Produc. A.D
<b>12 ENERGIA</b>			<b>11,546,997</b>	<b>3,616,738.12</b>				
		<b>00</b>	<b>5,994,357</b>	<b>259,188.24</b>				
		<b>13</b>	<b>2,873,365</b>	<b>1,013,007.50</b>				
		<b>18</b>	<b>2,679,275</b>	<b>2,344,542.38</b>				
Electrificación Rural con Sistema Fotovoltaicos de 240 localidades de la Provincia de Huaytará. 0392	Huaytará	00	4,985,459	8,400.00	Proyecto	1	0%	982 sistemas fotovoltaicos domésticos (Exp)
Suministro Provis. Electrificación Rural de 10 Localidades de los C.P.San Isidro de Cocha y Los Angeles de Suytupampa, II Etapa	Castrovirrey	18	1,429,276	1,332,808.06	Proyecto	94.60%	79.62%	486 conexiones domiciliarias instaladas. A.D, 2175 beneficiarios.
Ampliación Línea primaria en 7.62 Kv y Red Secundaria en 440/220 voltios para el Anexo de Tulturi, Moya. 0435	Hvca	18	196,351	143,288.15	Proyecto	1	100%	3.69 Km L.P, 48 conex.domicil. Contrata
Electrificación Rural de Localidades de la Margen Izquierda del Distrito de Acoria. 0443	Hvca	18	21,450	303.99	Proyecto	1	65%	488 conex.domicil. 5.00 Km de LP, 2440 beneficiarios. Contrata
		13	117,773	69,065.29				
Electrificación de 05 Localidades del Distrito de Ayaví.	Huaytará	18	49,654	41,851.99	Proyecto	1	16%	81 conex.domicil. Contrata
		13	211,102	25,206.77				
Electrificación de Alfapata y Empedrado de Acostambo-Hvca. (0445)	Tayacaja	18	3,252	303.99	Proyecto	1	21%	88 conex.domicil. 2 Km de LP.Contrata
		13	106,128	18,606.43				
Electrificación Rural Margen Derecha del Rio Acora San Fco.de Sangayaico. 0446	Huaytará	18	296,966	268,603.99	Proyecto	1	48%	132 conex.domicil. 12 Km de LP.Contrata
		13	189,822	116,494.63				
Electrificac.Barrio San Juan, Llaco y Machoera, Sector Añancusi, Distrito Acoria. 0447	Hvca	18	13,636	303.99	Proyecto	1	33%	229 conex.domicil. 2 Km de LP.Contrata
		00	198,370	0.00				
		13	334,966	95,632.20				
Electrificación Rural de 16 Localidades del Distrito de Anta-Hvca. 0448	Acobamba	18	247,010	236,602.99	Proyecto	1	71.00%	424 conex.domicil. 11 Km de LP.Contrata
		13	521,078	330,284.16				
Electrificación de 18 Localidades del Distrito de Anco. 0449	Churcampa	18	13,029	303.99	Proyecto	1	73.00%	490 conex.domicil. 35 Km de LP.Contrata
		00	212,540	0.00				
		13	484,994	126,351.64				
Ampliac.y Mejoramiento Sistema Eléctrico de la Localidad de Paucará y Barrios Periféricos. 0450	Acobamba	18	97,301	71,826.99	Proyecto	1	47.00%	625 conex.domicil. 4 sub estaciones de distribuc.Contrata
		00	223,410	223,410.00				
		13	317,113	67,478.08				
Electrificación Rural de 02 barrios del CPM Vista Alegre de Sachapite-Yauli. 0451	Hvca	18	7,935	303.99	Proyecto	1	16.00%	80 conex.domicil. 2 Km de LP.Contrata
		13	149,676	27,537.22				
Electrificación Rural de 04 Localidades del Distrito de Santiago de Chocorvos. 0454	Huaytará	18	24,955	303.94	Proyecto	1	48.00%	180 conex.domicil. 16 Km de LP.Contrata
		13	194,933	133,937.08				
Electrificación de Pueblo Libre y Barrios Aledaños del Distrito de Huando.0464	Hvca	18	278,460	247,736.32	Proyecto	1	100%	84 conex.domicil. 5.8 Km de LP.Contrata
Pequeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte, Eje Acobambilla. 0490	Hvca	13	56,014	2,414.00				Pago de pendientes
Electrificación de las Localidades del Distrito de Salcabamba. 0491	Tayacaja	13	114,566.00	0.00				No programado
Electrificación de 04 Barrios del Distrito de Huachocolpa. 0496	Hvca	13	25,319.00	0.00				No programado
Electrificación Cono Sur Acostambo II Etapa Lineas y Redes Primarias a 13.2 Kv y Redes Secundarias 440/220V. 0638	Tayacaja	13	49,881.00	0.00				No programado
		00	106,760.00	0.00				No programado
Electrificación de 06 Localidades del Distrito de Salcahuasi,0495	Tayacaja	00	62,197.00	0.00				No programado
Electrificación Rural de las Localidades de Matibamba, Manchay, Pilata y Yananaco del Distrito de Salcabamba. 0498	Tayacaja	00	24,521.00	0.00				No programado
Electrificación de 04 Localidades Chupamarca. 0636	Castrovirrey	00	14,284.00	0.00				No programado

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Instalación de Electrificación Rural en 16 Localidades de Huaribamba. 0637	Tayacaja	00	130,336.00	0.00				No programado
Electrificac.Rural de los 08 Distritos de la provincia de Churcampa. 0642	Churcampa	00	5,084	3,153.24				Pago de pendientes
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de Rosario y Andabamba. 0658	Acobamba	00	6,858	5,500.00				Pago de pendientes
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha. 0659	Acobamba	00	7,430	5,500.00				Pago de pendientes
Electrificación Rural de la Zona Centro de la Provincia de Tayacaja. 0660	Tayacaja	00	3,858.00	0.00				
Electrificación Rural de 25 Localidades del Distrito de Yauli. 0661	Hvca	00	1,250.00	1,225.00				Pago de devengados
Electrificación Rural de Localidades de la Provincia de Hvca (Yauli, N.Occoro, Acobambilla, Vilca, Manta) 0662	Hvca	00	860.00	860.00				Pago de devengados
Electrif.Rural de 37 Localidades de la Provincia de Castrovirreyna (Arma, Castrov, Ticrapo, Mollepampa, Cocas, Huachos, S.Juan, Tantar, Aurahuá) 0663	Castrovirrey	00	1,740.00	1,740.00				Pago de devengados
Electrificación Rural en las Localidades de los Distritos de Paucará y Anta.0664	Acobamba	00	2,400.00	2,400.00				Pago de devengados
Sistema Eléctrico Rural 1era Etapa de la Provincia de Tayacaja. 0665	Tayacaja	00	7,000.00	7,000.00				Pago de devengados
<b>15 TRANSPORTE</b>			<b>63,710,381</b>	<b>25,299,219.61</b>				
		<b>00</b>	<b>15,622,804</b>	<b>8,585,575.96</b>				
		<b>13</b>	<b>6,641,450</b>	<b>600,820.83</b>				
		<b>18</b>	<b>41,446,127</b>	<b>16,112,822.82</b>				
Programa de Caminos Rurales Departamentales (Mantenimiento Rutinario-Asoc.Civiles) 0055, 0406	Multiprov	00	838,496	529,233.09	Km	174.33	66.49%	Mantenimiento de 09 tramos de carretera, de las provincias de Acobamba, Angaraes, Huaytará y Tayacaja, con 80,495 beneficiarios. Contrata
		18	1,054,137	1,040,943.62	Km	45.3	100%	Mant.Carretera Emp.PE 26-B (Cunyacc-Pucapampa-Llamacancha-Checcocruz Contrata
Mejoramiento de la Carretera Palca- San Juan- Tantar- Chupamarca-Aurahuá-Colcabamba, Provincia de Castrovirreyna	Castrovirrey	00	199,666	119,799.56	Exp.Téc	1	0%	Observado por intervenc.PROVIAS y FORSUR en tramos de la carretera
Construcción Carretera Carhuáz Casacancha, San Isidro	Huaytará	18	3,674,945	0.00				No programado, fideicomiso, perfil deshabilitado
Const.Puente Carrozable de Llacce, Interconexión entre las Localidades de Acobamba y Churcampa.	Multiprov	00	95,906	57,543.48	Exp.Téc	1	100%	Expediente en verific.viabilidad
Construcción Trocha Carrozable San Isidro Roble, Provincia de Tayacaja .0133	Tayacaja	00	4,945,575	0.00				No programado
Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz Paucará -Tramo II 0242	Multiprov	18	30,105	26,504.03	Proyecto	52.78%	25.36%	Continuid, 17 Km trocha carroz. y pontón,11250 benef. A.D. Paralizado
<b>Gestión del Programa y Otros-Programa de Caminos Departamentales</b>								
Programa de Caminos Departamentales-Mantenimiento Periodico Carretera Llulluchacasa-Huari-Trancapampa-San Isidro de Acobamba(NM 0407)	Tayacaja	00	1,057,483	969,028.95	Km	37.25	100%	Fondos de PROVIAS, Contrata
Programa caminos departamentales-Manten.Period. Carretera Hvca-Lircay, Tramo II Antacancha, Pongos grande-Lircay (NM 0442)	Angaraes	00	350,000	240,760.89	Km	13.2	100%	Fondos de PROVIAS, DRT. A.D
Programa caminos departamentales-Mantenimiento Periodico de carreteras departamentales-PCD. (0453)	Hvca	13	33,953	0.00				No programado
Programa caminos departamentales- Mejoramiento Carretera Dv.Colcabamba-Dv.Cobriza (0500)	Tayacaja	13	1,911,391.00	0.00				No programado
Programa Caminos Departamentales: Mantenim. carretera Dptal.Acobamba-Chilcapite-Caja espíritu-Allcomachay, 0564	Acobamba	13	171,486	163,348.26	Km	55.5	100%	Carretera Dptal afirmada, Fondos de PROVIAS, contrata
Programa Caminos Departamentales: Mantenim.	Huaytará	13	7,680	7,679.92				Concluido en el 2009.

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
<i>Carretera Dptal Ayavi-Hualas-Reyes-Tambo, 0565</i>								
<i>Programa Caminos Departamentales: Estudio de Pre inversión Carretera Pampas-Colcabamba-Mayocc,0576</i>	Multiprov	13	55,566	55,566.00	Estudio	1	0%	Fondos de PROVIAS, sin información
<i>Programa Caminos Departamentales: Manten. Rutinario Mecanizado de la Carretera Departamental Chaulisma-Ayavi-Huatascocha-Reyes-Tambo. 0619</i>	Huaytará	13	65,100	32,908.60	Km	139.5	0%	PROVIAS, Contrata, por iniciar
<i>Programa Caminos Departamentales- Mantenim. Mecanizado Carretera Pucará-Marcavalle-Pazos-Lachocasa. 0620</i>	Tayacaja	13	56,700	14,819.70	Km	135	100%	concluido con pto 2009, PROVIAS. Contrata
<i>Programa de Caminos Departamentales-Mantenim. mecanizado Carretera Lircay-Desvio Quispicancha-Seclla-Julcamarca. 0621</i>	Angaraes	13	152,947	75,195.16	Km	350	63.7%	PROVIAS, contrata
<i>Programa de Caminos Departamentales- Mantenim. Mecanizado Carretera Acobamba-Chilcapite-Caja Espiritu-Marcas-Allcomachay. 0622</i>	Acobamba	13	96,600	47,804.36	Km	207	89.2%	PROVIAS, contrata
Construcción Carretera Parisa-Cancapampa, Dist.Marcas. 0401	Acobamba	00	30,942	5,000.00				Concluido 2009
Construcción Puente Ninabamba-Congalla. 0409	Angaraes	00	3,850	3,353.35				Continuid, Puente colgante de 56 ml.luz, 6,099 benef. Conv.
Construc.Trocha Carrozable Palermo-La Libertad-Distritos El Cármen, Anco. 0408	Churcampa	00	6,250	6,250.00				Culminado año 2009
Mejoramiento y Construc.Carretera Tuccuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca y Campo Ferial Tuccuccasa	Churcampa	00	1,571,938	1,407,422.69	Km	43.501	35%	Mejoram.43.501 Km, const.1,60 km, 3036 benefic. A.D.
Construcción Carretera Puente Integración Anco Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tuccuccasa	Churcampa	00	1,298,956	1,298,506.93	Km	22.644	51.52%	Carretera afirmada. A.D
		18	210,546	0.00				
Mejoramiento del Jr.Santos Villa-II Etapa, Distrito de Ascensión (0301)		00	74,876	24,954.85	Proyecto	1	94.27%	Pavimento rígido, 2,06 km, en 6,30 mt.de ancho, con áreas verdes, 9373 benef. Conv.Muni Asc
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Vias Urbanas de la Ciudad de Izcuchaca. 0410	Hvca	00	48,985	38,240.00	Exp.Téc	1	0%	Exp.Téc. En elaboración DRV
Mejoramiento de la Carretera Carrozable Apaca Huachojaico, Las Mercedes Timpocpuquio y Callanca, a nivel de afirmado y obras de arte, distrito de Córdova.0295	Huaytará	00	207,508	174,608.10	Exp.Téc	1	100%	Expediente en evaluación
Construcción Puente Ccota - Añancusi (0273)	Hvca	00	89,092	35,636.76	Exp.Téc	1	100%	Expediente en evaluación
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Izcuchaca-Alfapata-Pachapata-Llamacancha-Acraquia-Ahuaycha-Pampas. 0269	Multiprov	00	95,581	91,375.25	Exp.Téc	1	100%	Expediente concluido, en verificac. Viabilidad
Mejoramiento de la Carretera Santa Elena- Llumchi, Lircay (0279)	Angaraes	00	27,376	25,620.00	Exp.Téc	1	100%	Expediente concluido, en verificac. Viabilidad
Construcción Carretera Lachocc-San Pedro de Sacsalla-Orcobamba.Acobamba, N.Occoro, Ascensión.0373	Hvca	18	2,749,157	780,588.64	Km	23	55%	fideicomiso, carret.afirmada y 2 puentes, señalizaciones y recuper.medio ambiente. A.D.1215 beneficiarios
Construc.Carretera Añancusi-Ccota, Distrito de Acoria	Hvca	00	32,419	30,462.00	Exp.Téc	1	100%	Expediente aprobado
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Pucaloma-Molino-Patibamba-Yllpe-Villamayo-Paltamarca, Churcampa. 0437	Churcampa	18	232,075	169,884.40	Exp.Téc	1	100%	Expediente concluido, en verificac. Viabilidad
Construcción Trocha carrozable Huancayoccase - Arhuayacu, Distrito de Colcabamba	Tayacaja	18	785,120	645,694.66	Km	9.00	85%	Fideicomiso. Incluye alcantarillas y obras de arte. 325 beneficiarios, A.D
Construc. Carretera Colpa Huayarqui a nivel de trocha carrozable, Longitud 7.760 KM, Huaribamba. 0114	Tayacaja	18	1,672,971	486,623.34	Proyecto	1	0%	Fideicomiso. 7.76 Km, Incluye badenes y mitigación. 2135 beneficiarios, A.D
Construcción y Mejoramiento de la Carretera La Merced Fortaleza Turística de Torongana	Churcampa	18	1,481,174	1,229,088.89	Km	19.225	85%	Fideicomiso, 527 beneficiarios. contrata
Construcción Carretera Urcay-Patahuasi-Huayllabamba-Chachas, (Chinchihuasi, Colcabamba)	Churcampa	00	487,582	483,250.81	Km	14.30	97.41%	Continuid, Carretera afirmada, 1074 beneficiarios A.D

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
		18	701,971	675,485.45				
Mejoramiento de Carretera de Tucuccasa-Arma-Sirihuasi-Buenos Aires, Anco	Churcampa	00	1,146,907	1,143,111.09	Km	15.40	100%	15.40 Km Carretera afirmada, 2814 beneficiarios. A.D.
		18	347,925	0.00				
Construcción de Carretera Huayacca-Antacancha-Cochamarca-Distrito de Aurahuá	Castrovirrey	18	2,299,114	742,968.86	Proyecto	71.79%	33.26%	8.33 Km de Carret.sin afirmar, incluye 0.733 Km de carretera mejorada, y 2 puentes, fideicomiso.
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - SANTA ROSA DE LLILLINTA, Pilpichaca	Huaytará	18	3,821,875	2,189,789.62	Km	22.85	8.05%	Carretera afirmada, incluye 2 pontones, 670 beneficiarios, fideicomiso. A.D.
Construcc.y Mejoramiento Carretera Minabamba-Mayunmarca	Acobamba	18	1,591,567	1,428,337.06	Km	11.81	100%	11.81 Km Fideicomiso, 2068 beneficiarios, A.D.
Construcción Trocha Carrozable Repartición Cangar-Lenlecc, Caja	Acobamba	18	1,160,454	309,117.19	Proyecto	55%	52%	10 Km de trocha, Incluye 01 badén, 557 beneficiarios. A.D.Fideicomiso
Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Pomacocha-Huancas-Totora (Congalla y Pomacocha)	Multiprov	18	2,336,757	1,784,666.81	Proyecto	1	88.00%	27.548 Km Trocha sin afirmar, 2534 benefic. Fideicomiso. A.D
Mejoramiento Carretera Antamachay-Cuticsa-Santo Tomás de Pata -Chupacc	Angaraes	18	2,551,472	1,454,369.36	Proyecto	0.86	56.94%	Carretera afirmada de 40.8 Km tipo CV-3, 2984 beneficiarios. Fideicomiso. A.D
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA PUENTE ROMERO - CULLUPITE - PAMPA HUASI EN EL DISTRITO DE SECLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES	Angaraes	18	1,110,977	996,141.81	Proyecto	1	66.66%	Mejoram.3.40 Km y const.5.70 Km, 1122 benefic.Fideicomiso. A.D
Construcción Carretera Julcamarca Acobamba Tramo Julcamarca Puente Huancas	Angaraes	00	133,532	60,075.00	Exp.Téc	1	0%	Sin información
Mejoramiento de la Carretera Julcamarca-Yanachocce-Chincho, Huanchuy	Angaraes	00	102,000	91,800.00	Exp.Téc	1	0%	Sin información
Construcción del Puente San Francisco Tramo Mantacra-José Carlos Mariátegui, Distrito de Acoria. 0438	Hvca	18	99,356	36,662.04	Exp.Téc	1	100%	Expediente en evaluación
Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas-Allcomachay (0470)	Acobamba	18	12,614,313	1,767,967.36	Km	30.98	8.90%	Foniprel 2009, carretera afirmada tipo dptal.incluye 3 pontones, 36 gaviones y otros,10,416 beneficiarios A.D.
Mejoramiento del Camino Departamental Ccarhuanra - Patoccocha-Palmira Alta (Acoria, Andabamba, Paucará). 0501	Multiprov	13	93,057.00	0.00				No programado
Mejoram.Carretera Ascensión Ancapa II Etapa (Ascensión, Acobambilla, Nuevo Occoro) 0502	Hvca	13	40,566.00	0.00				No programado
Construcción de la Carretera Chiris-Villoco	Castrovirrey	00	1,321,602	1,158,721.73	Proyecto	1	0%	8.5 Km de Trocha sin afirmar, 560 benefic.Por iniciar A.D
		18	12,330	0.00				
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Moya-Islaychumpi-Putacca-Yayuyopata, Hvca. 0604	Hvca	00	1,142,535	331,479.62	Proyecto	1	42%	14.20 Km, 2272 beneficiarios, Contrata,
Rehabilitac. Puente Boliche por desborde de Río Cachillallas en la localidad de Chuñunapampa Distrito de Yauli. 0624	Hvca	13	60,569	42,839.13	Puente	1	77.22%	DR.Vivienda A.D
Mejoramiento camino Dptal.Palmira Alta Ccheccocruz (Paucará) Pucacruz Acobamba. 0525	Acobamba	18	542,876	164,067.55	Proyecto	68.47%	29%	Continuid, Mejoram.39,45 Km, 38,269 beneficiarios.A.D.
Mejoramiento Carretera Repartición Quispiñicas-Carampa-Pichus, (Pazos, Huaribamba)	Tayacaja	00	219,000	166,596.24	Proyecto	20.00%	20%	Continuid, Py concluido, 29.560 Km, con 5852 beneficiarios, A.D
Construcción Trocha Carrozable Anta Ccarhac Mejorada, Distrito de Chupamarca	Castrovirrey	00	83,507	83,506.22	Proyecto	1	100%	Continuid, 4.5 Km de trocha carrozable, 963 beneficiarios. A.D
Mejoramiento Trocha Carrozable y Construc.del Puente Santa Ola de Angaraes-Acobamba. 0645	Multiprov	00	9,240	9,239.35				Concluido en el año 2009
Mejoramiento y Construc.Carretera Puente Laramate-	Angaraes	00	2,000.00	0.00				No programado

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Antaparco-Sto.Tomás de Pata. 0650								
Mejoramiento Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San Isidro Huirpachancha-Tambo Cruz, (Stgo.Chocorvos)	Huaytará	18	293,028	183,922.13	Proyecto	50.00%	46.46%	Continuid, 32.3 Km de Carret.vecinal tipo 3 afirmada. 4,967 benefic..AD.
Construc.carretera Huayanay, Tambranco, Puente Chopcca, Distrito de Anta	Acobamba	18	71,882	0.00				No programado
Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio, Colcabamba. 0134	Tayacaja	13	3,895,835	160,659.70	Proyecto	94.00%	0.00%	58.420 Km de trocha const. Py paralizado, 7,665 beneficiarios. A.D, Cuenta Pto 2009
<b>17 MEDIO AMBIENTE</b>			<b>18,233,440.00</b>	<b>13,114,771.35</b>				
		00	<b>4,640,335.00</b>	<b>4,110,064.97</b>				
		13	<b>300,000.00</b>	<b>18,816.00</b>				
		18	<b>13,293,105.00</b>	<b>8,985,890.38</b>				
Mejoramiento del Habitat en el Dpto. de Huancavelica (Acoria, Pazos, Chupamarca, Anta, Cochaccasa, Chinchihuasi, Pilpichaca). 0067	Multiprov	00	2,824,742	2,344,345.35	Proyecto	1	50.10%	Meta total: const. de 100 viviendas prototipo, 100 talleres de construc.civil, manejo adecuado de cocina, corrales y RR forestales, forestac.44,566 benef.AD
Forestación y Reforestac.Zona Intermedia Microcuencas Sicra y Opamayo. 0065	Angaraes	00	513,059	474,338.79	Proyecto	36%	27.0%	Continuid, Meta total:37 viveros, 1290 has de plantac.definit, protec.405 Has, 18 cursos de capacit. 3268 benefic, AD
		18	155,950	152,741.20				
Ampliación Superficie con Aptitud Forestal en Areas rurales de los 16 Distritos de la Prov.de Huancavelica (0066)	Hvca	00	1,302,534	1,291,380.83	Proyecto	1	69%	Conformac.79 comités de gest.forestal, instalac.79 viveros, 1741 Has de plantac. definitivas, 112 capacitac.y contrata guardabosques. 12,938 benefic.A.D . 2010, 173, 000 plantones en viveros
Forestación y Reforestación con los grupos Organizados de las Unidades de Gestión Agraria en la Región Hvca (0232)	Multiprov	18	1,936,259	1,073,954.57	Proyecto	1	50%	Continuid, Meta total, 1225 Has reforestadas con cerco, 30 cursos de capacitac.54,858 benefic.
Forestación en Seis Comunidades Campesinas de San Pedro de Coris. 0372	Churcampa	18	300,000	284,753.10	Has	79	70%	Meta total, 142 Has reforestadas con cerco protec.12 talleres de capacitac.1742 benefic. Con DOE RUM a partes iguales. A.D
		13	300,000	18,816.00				
Recuperación del Medio Ambiente en la Cuenca del Rio Mantaro (Acobamba, Churcampa, Tayacaja, y Hvca) 0314	Multiprov	18	91,190	78,793.67	Proyecto	7.73%	7.73%	Py concluido, 2137 Has de TFL, 522 Has de TA, 691 Has de ZI, plantaciones definitivas 2,168 Has, 7651 benef, de 18 dist.y 58 C.C.A.D.
Forestación y Reforestación en los Distritos de Extrema Pobreza del Dpto.de Hvca, distritos de Acobambilla, Manta, Antaparco, Cocas, Huamatambo, Cuenca, Capillas, Quito Arma y Tambo (0233)	Multiprov	18	1,400,352	845,557.06	Proyecto	1	51%	Plantac.en campo definitivo 1783.85 Has, incluye 25 viveros,mantenim.protec .1783,5 Has, cerco perimétrico y 26 eventos de capacitac, 5195 beneficiarios. A.D
Forestación con Fines de Protección Ambiental en la Provincia de Huancavelica. 0457	Hvca	18	2,983,062	2,392,924.60	Proyecto	1	30%	Meta total 83 viveros,1137 Has con plantac.definitivas y

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								cercado, 15 cursos. 23694 beneficiarios. A.D.
Ampliación de áreas Forestales con Fines Ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa. 0571	Multiprov	18	3,091,917	1,740,353.19	Proyecto	1	10%	Meta total: Const. 18 reservorios, 1614 Has reforestadas y cercadas, 27 cursos de capacitac.6365 familias beneficiarios. A.D.
Forestación en Laderas Altoandinas de la Sub Cuenca del Rio San Juan, Castrovirrey, 0572	Castrovirrey	18	1,439,918	1,092,532.45	Proyecto	0.5	26.8%	Meta total, 600 Has plantaciones definitivas cercadas, 42 cursos de capacitac.10 comités conformados, 5179 beneficiarios. A.D.
Establecimiento de Plantones Forestales con Fines Ambientales en las Provincias de Castrovirrey, Angaraes, Huaytará y Acobamba. 0577	Multiprov	18	1,215,043	901,461.23	Vivero	84	71.6%	Meta total, 84 viveros, 13 cursos, 84 Comités conformados, 17,278 beneficiarios. A.D. meta 2010
Instalación de Viveros y Manejo de recursos Forestales en 07 Comunidades de Chupamarca	Castrovirrey	18	634,414	401,419.31	Proyecto	68.50%	24.10%	Meta 158.42 Has reforestadas, 7 viveros, 7 mód.de herramientas. A.D
Plantaciones forestales en Areas con Aptitud Forestal del distrito de Acoria (0635)	Hvca	18	45,000	21,400.00	Exp.Téc	1	0%	Expediente en elaboración
<b>18 SANEAMIENTO</b>			<b>15,641,425.00</b>	<b>10,899,570.46</b>				
		00	<b>3,595,592.00</b>	<b>1,918,815.67</b>				
		13	<b>1,176,297.00</b>	<b>95,631.83</b>				
		18	<b>10,869,536.00</b>	<b>8,885,122.96</b>				
Mejoramiento del Sistema de agua potable y Alcantarillado de Huachocolpa (0236)	Hvca	18	125,462	125,459.27	Proyecto	10%	10%	3891,7 ML de agua, alcantarillado 3870 ML, con 270 conexiones domicili.A.D. Concluido
Construcción y Ampliación de los Sistema de Agua potable en los centros Poblados de Paltamachay-Tacsana y Ambato, Yauli. 0374	Hvca	18	2,008,381	1,170,856.77	ML	14624	79.66%	14624 ML, fideicomiso, 3760 benefic. A.D
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Palca. 0411	Hvca	00	1,085	0.00				No programado
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y construcción de Letrinas del C.P.de Anta, Distrito Huaribamba	Tayacaja	18	901,022	886,039.87	Proyecto	1	100%	Redes de agua y desague, 20 letrinas, 660 beneficiarios. fideicomiso. A.D
Mejoramiento, Instalación sistema de agua potable y alcantarillado Ayacancha, Distrito de Huaribamba	Tayacaja	18	1,394,804	1,231,358.09	Proyecto	1	117%	161 conex. Domicil. 529 beneficiarios, fideicomiso. A.D
Instalación, Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua potable, Alcantarillado y Letrinas en las Localidades de Pachamarca, Paltamarca, Ichupata, Villamayo, Illpe y Patibamba, Distrito de Pachamarca	Churcampa	18	2,488,276	2,100,021.20	Proyecto	1	59.32%	6778 ML de redes, 197 letrinas, capacitac. y conformac. JASS, 2220 beneficiarios fideicomiso. A.D
Ampliación, Mejoram, Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Yaurecan, Churcampa	Churcampa	18	2,204,655	2,080,249.42	Proyecto	1	78%	282 conexiones domicil.de agua y desague, 6970 ML de redes de agua y 7538 de desague, 1337 benefic. fideicomiso, contrata
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Anexo de Choclococha, Distrito de Santa Ana	Castrovirrey	00	32,847	32,845.39	Proyecto	50%	50%	Con pto 2009, 100 conexiones domiciliarias de agua y desague, concluido. A.D
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huayllay Grande	Angaraes	18	1,125,457	1,013,692.10	Proyecto	1	106%	470 conexiones domicil.agua, 2627 ML de redes de agua y 2170 ML de desague, 1493 beneficiarios. Fideicomiso. A.D
Atención Obras de Emergencia: Rehabilitación Sistema	Hvca	18	185,926	152,031.30	ML	790	62.68%	Instalac.tuberías para

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
de Evacuación de Agua salada en el distrito de Izcuchaca (desborde de laguna Allcca). 0472								evacuación,DRV. A.D
Atención Obras de Emergencia: Rehabilitación Sistema de Agua potable en el Distrito de Izcuchaca (desborde de laguna). 0473	Hvca	18	105,375	98,671.94	ML	1324	87.79%	1290 beneficiarios. A.D
Instalación Agua Potable y Construc.Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en la Localidad de Barrio Centro-Pampachacra, Hvca. 0475	Hvca	18	21,821	17,743.00	Exp Téc	1	100%	Expediente en evaluación, DRV
Rehabilitac. Y Mejoramiento del Sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias de Localidad de Puituco, Acobambilla. 0487	Hvca	18	308,357	9,000.00	Exp Téc	1	100%	Expediente en evaluación, DRV
Mejoramiento del sistema de agua potable y ampliación del sistema de alcantarillado en la Localidad de Lircay, 0503	Angaraes	13	1,000,000	74,862.40	Proyecto	1	5%	Mejoram.sistema agua potable, ampliacion sistema alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y Pg. Capacitac. Paralizado. Contrata.
Mejoramiento y construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ccochaccasa.	Angaraes	13	4,595.00	0.00				No programado
Construcción del Sistema de Desague en el centro Poblado de Pueblo Libre, 0573	Hvca	00	1,005,352	702,877.42	Proyecto	1	72.75%	6259 ML de redes, 350 conexiones domiciliarias.1782 benefic.A.D
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Desague de la Localidad de San Juan de Huirpachanca-San Isidro, Huaytará. 0605	Huaytará	00	888,945	0.00				No programado
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Huayanay, distrito de Anta. 0625	Acobamba	13	60,293	0.00				No programado
Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Santiago de Pichus del Distrito de Huaribamba. 0140	Tayacaja	00	568,516	351,098.47	Proyecto	30%	0%	60 M3 de reservorio, mejoram.de red distribuc.17.70 Km, 2268 benefic.Convenio.
Saneamiento Básico Agua y Desague del Centro Poblado Menor de Tucuma, Pampas. 0631	Tayacaja	13	111,409	20,769.43				Py concluido 2008
Construc. Sistema de Agua Potable 04 Barrios, Distrito de Nuevo Occoro. 0643	Hvca	00	3,666	3,665.25				Concluido con pto 2009
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del Alcantarillado en la localidad de Huaribamba. 0644	Tayacaja	00	1,404	1,403.89				A concluir con pto 2009
Construc.Sistema alcantarillado en el C.P. de Pumaranra, Distrito de Paucará	Acobamba	00	1,093,777	826,925.25	Proyecto	1	61.26%	Const.red colector,planta de Tratamiento y Conexiones domicil. 2010 benefic. A.D
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>			<b>154,220</b>	<b>93,360.00</b>				
Estudios de Pre Inversión: Deuda por Crédito interno, según RGR N° 282-2009; por la elaborac. Estudios de saneamiento básico (25 localidades de Hvca), 0532	Hvca	18	154,220	93,360.00				Pago de deudas pendientes
<b>20 SALUD</b>			<b>42,926,596</b>	<b>21,073,834.77</b>				
		00	<b>18,020,839</b>	<b>3,815,525.08</b>				
		13	<b>1,979,834</b>	<b>0.00</b>				
		18	<b>22,925,923</b>	<b>17,258,309.69</b>				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno infantiles del 1er Nivel de atención en los EE.SS Antaymisa, Ccarhuanra, Ccosnpuquiuo, Chupaca, Acoria (0237)	Hvca	18	144	144.00				Py concluido en el año 2009
Reconstrucción del Cerco Perimétrico y Const. Muro de Contención del Centro de Salud del distrito de Quercó (sismo) 0245	Huaytará	00	178,277	150,977.00	Proyecto	1	100%	Cerco de 60.50 ML de muro de contención de concreto armado. Contrata
		18	126,757	106,801.27				
Reconstrucción del P.S. de la Localidad de Ocoyo, Distrito Ocoyo (sismo). 0402	Huaytará	00	411,299	411,299.00	P.S	1	100%	Const.nueva infraest.capacit.personal , adquis.equipo. 1055 benefic. Contrata

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
		18	64,436	6,080.00				
Reconstrucción del Cerco Perimétrico del C.S. de la Localidad de Córdova, Distrito de Córdova (sismo) 0252	Huaytará	00	135,000	130,504.92	Proyecto	1	100%	Cerco de material noble con cemento corrido, sobrecimiento y columnas, tarrajeados con cemento.contrata
		18	28,462	11,635.80				
Reconstrucción Puesto de Salud de la Localidad de Huachojaico, Distrito de Córdova (sismo) 0253	Huaytará	00	260,799	53,832.26	P.S	1	29.03%	Const.02 ambientes, tanque séptico y equipamiento, 335 benefic.contrata
		18	383,516	332,203.63				
Reconst. del Puesto de Salud, de la Localidad de Ocobamba, Distrito de Córdova (sismo) 0257	Huaytará	00	296,074	181,073.52	P.S	1	40.00%	Const.02 ambientes, y equipamiento, contrata
		18	308,816	272,895.22				
Reconst.Puesto de Salud Localidad de San Juan de Ocoro, Distrito de S.Fco Sangayaico (sismo) 0256	Huaytará	00	320,000	263,113.89	P.S	1	100%	Const.de Infraestructura, 300 benefic. contrata
		18	291,325	6,346.35				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de Atención del C.S Ayaccocha, P.S.Huanaspampa, de la Microred Ayaccocha-DIRESA Hvca (0261)	Hvca	00	592,527	588,215.30	Proyecto	50.14%	51.00%	C.S.Ayaccocha y P.S.Huanaspampa-concluidos, 2305 benef.A.D
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. del establecimiento de Salud de Cosme del Nucleo de Anco Microred Churcampa (0319)	Churcampa	00	209,100.00	0.00				Adquis.ambulancia, por retomar ppto para el 2011
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. del Establecimiento de Salud de Locroja del Nucleo de Anco Microred Churcampa (0320)	Churcampa	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Chinchihuasi, Nucleo Paucarbamba, Microred Paucarbamba, Red Tayacaja	Churcampa	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud San pedro de Coris, Microred Paucarbamba, Red Tayacaja . 0322	Churcampa	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Pachamarca, Microred paucarbamba, Red Tayacaja . 0323	Churcampa	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del establecimiento de Salud de Cochabamba Grande, Núcleo San Isidro de Acobamba. 0324	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Puerto San Antonio del Núcleo Surcubamba, Microred San Isidro. 0325	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Santiago de Pichus, Núcleo Huaribamba, Microred Pazos. 0326	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Huaribamba, Microred Pazos, Red Tayacaja. 0327	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Cconocc, Núcleo Izcuchaca, Microred Izcuchaca. 0328	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Acostambo, Microred Pampas, Red Tayacaja.0329	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de S,Marcos de Rocchac, Núcleo San Isidro de Acobamba. 0330	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud Stgo de Tucuma, Núcleo Daniel hernández, Microred Pampas, Red Tayacaja. 0331	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de San Isidro de Acobamba, Microred San Isidro de Acobamba Red Tayacaja. 0332	Tayacaja	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Pampas, Microred Pampas, Red Tayacaja. 0333	Tayacaja	00	235,008.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Ccarhuacc, Núcleo	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Acobamba, Microred Acobamba 0334								
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Huayanay, Núcleo Anta, Microred Paucará 0335	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Marcas, Núcleo Caja Espiritu, Microred Acobamba. 0336	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Andabamba, Núcleo Paucará, Microred Paucará, Red Acobamba. 0337	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Chupacc, Núcleo Julcamarca, Microred Seclla . 0338	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Anta, Microred Paucará, Red Acobamba0339	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Huayllay Grande, Núcleo Lircay, Microred Lircay. 0340	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Callanmarca, Microred Lircay, Red Acobamba. 0341	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Huanca Huanca, Microred Lircay, Red Acobamba. 0342	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Buenos Aires de Parco Chacapunco del Núcleo Ccochaccasa. 0343	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Tuco, del Núcleo Ccochaccasa, Microred Lircay. 0344	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Santo Tomás de Pata, del Núcleo Julcamarca, Microred Seclla. 0345	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Buenavista, Núcleo Seclla, Microred Seclla. 0346	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Congalla, Núcleo Seclla, Microred Seclla. 0347	Angaraes	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Ayaví, Núcleo Santa Rosa de tambo, Microred Huaytará. 0348	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Ingahuasi, Microred Castrovirrey. 0349	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Carhuancho, Microred Castrovirrey. 0350	Castrovirrey	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud Santa Rosa de Tambo, Microred Huaytará. 0351	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud San Miguel de Curis, Núcleo Stgo de Chocorvos. 0352	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud San Isidro de Huirpachancha, Núcleo Córdova, Microred Stgo de Chocorvos. 0353	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Pallalla del Núcleo Paucará, Microred Paucará. 0354	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Chopcapampa, Núcleo Paucará, Microred Paucará. 0355	Acobamba	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Villa de Arma, Microred Tantará.	Castrovirrey	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Chupamarca, Microred Tantará.	Castrovirrey	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del	Huaytará	00	209,100.00	0.00				Idem

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Establecimiento de Salud de Lillinta, Microred Castrovirrey. 0358								
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Puesto de Salud de Pauranga, Microred Castrovirrey. 0358	Castrovirrey	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del establecimiento de Salud de Chaquicocha, Núcleo Moya, Microred Moya. 0360	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Centro de Salud de Huanaspampa, Núcleo Ayaccocha. 0361	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Huachocolpa. 0362	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Nuevo Occoro, Núcleo Conaica. 0363	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de San José de Acobambilla, Núcleo Viñas. 0364	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Uchus Incañan, Núcleo Yauli. 0365	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de San Juan de Ccarhuacc, Núcleo Ccasapata. 0366	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Vilca, Núcleo de Moya, Microred Moya. 0367	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento Sistema de Referencia y Contraref. Del Establecimiento de Salud de Manta, Núcleo de Viñas, Microred Moya. 0368	Hvca	00	209,100.00	0.00				Idem
Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva del C.S de Pampas en Hospital, Red de Salud Tayacaja, Hvca (0303)	Tayacaja	00	2,030,598	1,117,269.99	Proyecto	35.60%	35.60%	Mejoram.y const.8 bloques de ambientes, equipam. adquisic.ambulancia. 8066 benefic. Concluido.Contrata
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de San José de Miraflores, Chillhuapampa, Nueva Acobambilla, Tinyaclla y Vista Alegre Micro Red Huando. 0376	Hvca	18	3,102,624	2,180,925.53	Proyecto	1	58.69%	fideicomiso, 05 EE.SS, Chillhuapampa 55.85%, N.Acobam 60.07%, Vista Alegre 63%, S.J.Miraflores 56.18%, Tinyaclla 58.36%, A.D. 7899 benefic
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de EE.SS del Primer Nivel de Atención de los P.S de Villapampa, Atalla, Paltamachay, Pucaccasa, Chopcca, Ccollpaccasa y Condorhuachana, Microred de Yauli .	Hvca	18	3,476,072	2,446,079.21	Proyecto	1	59.33%	fideicomiso, Const.P.S.Villapampa, 51.2%,Atalla 70.35%, Paltamachay 63.63%, Pucaccasa 51.26%, Ccollpaccasa 71.88%, Condor H. 47.59%. 4,240 benefic. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud del Primer Nivel de Atención de los P.S de Lirio de la Microred Acoria. 0378	Hvca	18	525,361	393,625.05	Proyecto	1	74.47%	fideicomiso, Mejoramiento y const.10 ambientes, S.H.equipamiento y asistencia médica, 800 benefic. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S de Lecclespampa, Manyacc, Chanquil, Patacancho y Pampapuquio Microred Paucará (0286)	Acobamba	00	68,670	61,328.00	Proyecto	1	0.00%	Con expediente aprobado, 05 EE.SS a construir, por iniciar, 6282 beneficiarios. A.D
		00	559,364	0.00				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención del P.S de Los Angeles de Ccarahuasa, Hvca. 0377	Hvca	18	513,825	429,018.00	Proyecto	1	80.33%	fideicomiso, Const.11 ambientes,2 S.H. equipam.y capacitación.AD 1400 benefic
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención del P.S de Totora, Jatumpata, Izcuchaca. 0379	Hvca	18	561,457	372,137.32	Proyecto	1	52.20%	fideicomiso.Const.10 ambientes, S.H.equipamiento y

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								asistencia médica. 830 benefic. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención del P.S de Chacarilla, Microred Yauli. 0380	Hvca	18	536,067	440,771.44	Proyecto	1	91.00%	fideicomiso, Const.11 ambientes, S.H, cerco perim, equip.y capacit.844 benefic. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S de Nueva Esperanza, Violeta Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral, Microred Acostambo, Red Tayacaja.	Tayacaja	18	2,520,177	2,218,432.87	EE.SS	4	82.05%	Incluye equipamiento y capacitaciones, 3571 benefic. Fideicomiso. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Servicios de salud de los P.S.de San Antonio de Antaparco y Maicena de la Micro Red Seclla. 0413	Angaraes	00	11,643	3,142.50	Exp Tec	1	0.0%	Expediente en elaboración. SGE
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud de Nivel I-2 del P.S.de Tuco, Microred Ccochaccasa, Red Angaraes (0283)	Angaraes	18	743,687	623,395.64	Proyecto	1	88.78%	Const.ambientes, Capacitaciones y Equipamiento. 1171 benefic. FIDEICOMISO. A.D
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.Pilchaca y Santa Rosa de Manta, de la Microred Moya, Red Hvca . 0381	Hvca	18	1,075,657	917,773.52	EE.SS	2	98.50%	fideicomiso, P.S Pilchaca Y P.S.S.Rosa Manta (100%), 385 beneficiarios. Contrata
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Mullaca, San Lucas de Tongos y Santa Cruz de Ila de la Microred de Pazos, Red Tayacaja. 0427	Tayacaja	00	21,361	5,400.00	Proyecto	1	91.88%	Construcción de 03 EE.SS y equipamiento biomédico. Fideicomiso. A.D
		18	1,852,658	1,693,670.73				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel de Atención de los P.S.de Chachas y Quintao, Colcabamba	Tayacaja	18	1,413,678	1,260,710.37	EE.SS	2	60.03%	Construcción de EE.SS y equipamiento biomédico. 1426 benefic. Fideicomiso. A.D
Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los Servicios de salud del Primer Nivel Atención de los P.S: Santo Domingo de Capillas, Huañacancha y Vista Alegre, Microred Huaytará, Red Huaytará (0287)	Huaytará	00	40,158	40,157.05	Proyecto	16.66%	5.0%	Construcción de 3 EE.SS y equipamiento biomédico. 984 benefic. Fideicomiso.
		00	1,085,560	451,719.66				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención del P.S.de Santa María de la Microred Surcubamba, Red Tayacaja. 0122	Tayacaja	18	582,499	576,675.69	EE.SS	1	100%	Const.E.S, equipamiento biomédico y capacitac.784 benefic. Fideicomiso. A.D
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del P.S. de Tocas, Distrito de Colcabamba	Tayacaja	18	877,421	661,477.87	EE.SS	1	95.02%	Const.P.S, equipam.básico,Adquisición de Ambulancia,Capacitaciones, elabor.de plan de IEC. 2235 benefic. A.D. Fideicomiso
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del P.S. Puerto San Antonio-Microred San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja DIRESA (Tintay Punco) 0125	Tayacaja	00	10,502.00	10,502.00	Proyecto	30%	30.00%	9 amb, 2 SSHH, equipam.y capacitación, 494 benef. concluido. Convenio
Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los EE.SS, del 1er Nivel de Atención, C.S.Salcabamba, P.S de Ayaccocha, P.S. Patay, Micro Red Pampas, P.S.Salcahuasi, P.S.Cedropampa, Micro Red San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja. 0126	Tayacaja	00	51,628.00	51,627.95	Proyecto	1	100%	Const.02 P.S.Cerco Perimet.de 01 CS, 02 casetas de P.S. y equipamiento y capacit. 4305 benefic. Con ppto 2009. Contrato.
Mejoramiento Capacidad Resolutiva del C.S. Daniel Hernández Microred Pampas, Red III Tayacaja	Tayacaja	00	54,637	54,637.00				concluido 2009
		18	162	0.00				
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención del C.S.Huaytará, Micro Red Huaytará. 0097	Huaytará	00	12,473	12,473.00	Proyecto	5%	5%	Ampliac.C.S, adq.equipo radio-comunic y transporte,6643 benef. Culminado con Pto 2009.A.D,
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Huarirumi de Chontacancha, Distrito de Anchonga	Angaraes	18	636,550	375,275.62	Proyecto	1	100%	Const.P.S, cerco perimét, equipamiento y capacitac. 1183 benefic. Fideicomiso, contrata

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mejoramiento de las Capacidades Resolutivas del P.S. de Pircapahuana Microred de Lircay, Red Angaraes	Angaraes	00	14,077	7,560.00	Exp Tec	1	0.00%	Expediente en elaboración. P.S, cerco perimét, equipamiento y capacitac.
Mejoramiento de la calidad de Atención de los servicios del P.S. de Chahuarma, Microred Seclla, Red II Acobamba, Distrito Lircay	Angaraes	00	115,587	115,586.48	Proyecto	27.29%	27.29%	Puesto de salud y residencia médica, 1512 benefic.Concluido, A.D
Rehabilitación y reconstrucción de P.S. por Sismo(0505)	Hvca	13	1,979,834	0.00				No programado
Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia del centro de Salud Ccochaccasa, Microred Ccochaccasa, Red Angaraes. 0588	Angaraes	18	211,150	0.00				No programado
Fortalecimiento de la Red Obstétrica Neonatal e Infantil en los P.S. Pantachi Norte, Pantachi Sur, Chuccllaccasa, Sta.Rosa Chopcca, Castillapata, Ambato, S.Juan Ccarhuacc, Dist Yauli-DIRESA Hvca,	Hvca	00	176,867	98,519.56	EE.SS	7	92.41%	2 EE.SS concluidos, 03 paralizados y 02 en ejecución. Convenio
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel de atención en los P.S. de Pachamarca, Piopachamarca, San Cristóbal de Ccocha y Huaribambilla de la Microred Paucarbamba DIRESA Hvca. 0607	Churcampa	00	15,750.00	0.00				No programado
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Huachocolpa-Micro Red San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja-DIRESA Hvca. 0136	Tayacaja	18	242,572	242,572.00	Proyecto	0.3	100%	7 ambientes, equipamiento y capacitac. Conven.Muni. Huachocolpa, 1500 benefic. Concluido
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud del Primer Nivel de atención de los Puestos de Salud de Llamacancha, San Juan de Paltarumi, Dos de Mayo y Rundovilca de la Microred Pampas, Red Tayacaja. 0647	Tayacaja	00	5,736	5,736.00	Exp Tec	1	0.00%	Expediente en elaboración
Mejoramiento de la Capacidad de Resolución del Centro de Salud Seclla, Red Acobamba. 0649	Angaraes	00	4,500.00	0.00				Sin programación
Construc.y equipamiento de la infraestructura del P.S.de Pariacc, Distrito de Huaribamba. 0654		00	1,066,844	850.00				Sin información
Mejoramiento de los Servicios de Atención Materno Infantil de los Establecimientos de Salud del Nucleo Santiago de Chocorvos, Red Hvca DIRESA	Huaytará	18	2,850,850	1,689,662.56	Proyecto	76.60%	39.98%	FONIPREL, Construc.04 EE.SS, remodelación 3 P.S. adq. Equipos y capacitaciones. A.D
<b>21 CULTURA Y DEPORTE</b>			<b>202,371.00</b>	<b>57,758.00</b>				
		00	<b>103,500.00</b>	<b>41,400.00</b>				
		18	<b>98,871.00</b>	<b>16,358.00</b>				
Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura del Complejo Deportivo de Huancavelica (0266)	Hvca	00	103,500	41,400.00	Exp.Téc	1	100%	Expediente en verificac.viabilidad
Rehabilitación de La Iglesia en el Distrito de Ascensión.	Hvca	18	27,995	16,358.00	Obra	1	100%	10350 benefic, enlucido de muros interiores y exteriores, y pintado de fachada
Restauración, Equipamiento y Puesta en valor de la Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca.	Hvca	18	70,876	0				No programado
<b>22 EDUCACION</b>			<b>76,899,455.00</b>	<b>57,977,975.77</b>				
		00	<b>31,756,316.00</b>	<b>21,023,081.85</b>				
		13	<b>419,014.00</b>	<b>68,262.58</b>				
		18	<b>44,724,125.00</b>	<b>36,886,631.34</b>				
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingüe Isolina Clotet de Fernandini (0142)	Hvca	00	2,205,259	1,859,475.14	Proyecto	96.31%	79.50%	Const.y mejoram.36 aulas y ambientes, cerco perimét, losa deport, patio multiuso SS.HH y equipamiento. 596 alumnos benef.A.D
Implementación de Tecnologías Productivas en la Instituciones Educativas de Zonas Rurales de la Región Hvca.(0143)	Multiprov	00	2,292,744	1,772,026.64	Módulo	447	95.00%	Instal.módulos:1 galpón de cuyes, 1 galpón de pollos, 1 fitotoldo, instalac.abonos orgánicos y pastos cultivados, incluye distribuc.de comput.e

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	Rubro FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								impresoras, talleres, levantamiento de línea de base. 11,634 alumnos beneficiarios. A.D
Mejoramiento de Infraestructura de la Institución Educativa Ricardo Palma de Carhuapata	Angaraes	00	123,771	123,755.44	Proyecto	40%	40%	5 aulas, 04 ambientes, losa deport. cerco perimétrico, mobiliario, equipo PAD y otros, 263 beneficiarios. A.D.
		18	73,132	0.00				
Implementación de Areas Recreativas para la población Infantil en las C.C.del Departamento de HUCA	Dptal	00	4,915,976	4,862,389.33	Proyecto	1	100%	Módulos de juegos recreativos instalados, 159,375 beneficiarios. Contrata
Mejoramiento de Infraestructuras y equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Angaraes Sur	Angaraes	00	6,069,744	3,640,936.45	II.EE	17	54.69%	Nuevo. A.D
Sustitución de Aulas y Ambientes Educativos en la I.E. Nº 36150 de Acobamba, 0270	Acobamba	00	28,624	27,556.30	Proyecto	1	91.59%	Incluye 4 aulas, 3 ambientes, S.H. cerco perimétrico. A.D.
		00	787,059	781,625.67				
Equipamiento con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas en los Diferentes Niveles del Dpto. HUCA (0235)	Dptal	18	193,629	26,692.20	Proyecto	57.40%	0.00%	Continuid, Meta: 14,624 mód. 1147 Nivel inicial, 7993 nivel prim, 5483 nivel sec. 16,860 beneficiarios. Paralizado. A.D
Construcción de la UGEL Angaraes. 0415	Angaraes	00	9,376	9,373.11				concluido 2009
Construcción de Infraestructura en la I.E. Nº 262 Socos, Distrito de Surcubamba	Tayacaja	00	38,539	38,539.00	Proyecto	30%	30.00%	Const. 3 amb. cerco perimétrico y equipam. 55 benef. Concluido. A.D
Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 36321, Pucapampa, Yauli. (0384)	HUCA	18	1,103,224	941,847.30	Proyecto	1	91.04%	fideicomiso, Const. 06 aulas, 2 amb. patio, SS.HH. cerco perimétrico, equipam. Mobiliario y PAD, 180 beneficiarios. AD
Construcción y Rehabilitación de la I.E. José Olaya Balandra Nivel secundario de Menores del C.P. Condorhuachana, Distrito de Yauli. 0387	HUCA	18	735,970	654,494.19	Proyecto	1	86.98%	fideicomiso, Const. 05 aulas, rehabilit. 3 ambientes, S.H, patio, cerco perimétrico. equip. PAD, mobiliario escolar. A.D. 125 beneficiarios
Reconstrucción de Aulas en la I.E. Nº 22224 de Putacca, Stgo. Chocorvos (0246)	Huaytará	00	153,310	0.00				Sin programación
		18	4,500	0.00				
Reconstrucción de Aulas en el CETPRO Nº 34031 de Huirpachanca-Sismo. (0255)	Huaytará	00	192,520	192,420.05	Proyecto	1	100%	Construc. 2 aulas y 1 ambiente, cerco Perimétrico, losa Deport., Equipamiento. 180 beneficiarios. Contrato
		18	92,573	0.00				
Construcción de 02 Aulas en el C.E.I Nº 359 de Laramarca-Sismo. (0244)	Huaytará	00	130,100	45,664.66	Proyecto	1	50.00%	Const. 1 Pabellón de 2 aulas, 359 beneficiarios. Contrata
		18	29,114	21,673.40				
Construcción de 01 Aula en el PRONOIE de Poronccocho, Laramarca-Sismo (0243)	Huaytará	18	97,475	0.00				No programado
Mejoramiento Infraestructura educativa y Equipamiento de la I.E. Mixta Leoncio Prado Gutierrez del C.P. Huanaspampa. 0386	HUCA	18	1,356,212	1,107,912.71	Proyecto	1	85.00%	fideicomiso, Const. 6 aulas, S.H, 4 amb, losa deport. cerco perimétrico. Equipo PAD, mobiliario escolar. 180 beneficiarios. AD
Construc. Mejoramiento y Equipamiento de la I.E. Augusto Salazar Bondy del Distrito de Manta. 0385	HUCA	18	994,144	838,243.80	Proyecto	1	78.14%	fideicomiso, Const. 4 aulas, mejoram. 4 amb, S.H, cerco perim, patio, y otros. A.D. 87 beneficiarios
Construc. y Equipamiento de la I.E. San Juan Bautista de Vilca, Distrito de Vilca. 0388	HUCA	18	1,143,270	994,142.22	Proyecto	1	81%	fideicomiso, Const. cerco perimétrico, vivero, mob. escolar, equip.e

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								implement. 02 laborat.170 benefic.AD
Construc. y Equipamiento de la I.E. José Carlos Mariátegui Huancalpi, Distrito de Vilca. 0390	Hvca	18	1,447,567	805,316.27	Proyecto	1	20.30%	fideicomiso. Const.cerco perim, pabellón, tratam.áreas recreativas, SS.HH. Losa deport.vivero, equipam.y mob.escolar. 390 benefic. AD
Desarrollo del Turismo Cosmogónico Histórico, Artístico de Aventura y Eco.Agrario-Angaraes (Julcamarca, Lircay, S.T.Pata, S.A.Antaparco, Chinchó)	Angaraes	00	325,599	272,965.71	Proyecto	1	95.00%	Meta 2010, capacitaciones, promoción del circuito y otros,1415 beneficiarios. A.D
Ampliac.y Mejoramiento de la calidad Educativa de la I.E.Mx.Señor de Atoccosa, Churcampa (0291)	Churcampa	00	49,540	49,539.68	Exp Téc	1	100%	Expediente aprobado
Const.02 Aula C.Cómputo y Otros IEP N° 36131 de Zunipampa Laria (0382)	Hvca	18	958,950	809,000.36	Proyecto	1	62.72%	fideicomiso, 2 aulas, c.computo, direc.loza deport.SS.HH.cerco perimétrico, equip. y mobiliarios. AD
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMP. 0369	Churcampa	00	908,578	554,819.41	Proyecto	1	74.87%	6 aulas, 2 ambientes, losa deportiva,cerco perim. patio y otros. 860 benefic.A.D.
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA ISABEL DE ANTACCOCHA, PROVINCIA DE Hvca (0298)	Hvca	00	27,083	25,601.30	Exp Téc	1	100%	expediente concluido y aprobado
Construc.Infraestructura de la I.E. Ciro Alegría Bazán de Muquecc Bajo, Distrito de Acoria. 0383	Hvca	18	1,002,663	893,943.73	Proyecto	1	100%	fideicomiso, Const.5 aulas, 4 ambientes, S.H. cerco, Losa y Equipam, refacción auditorio, tópic, cafetín.Contrata
Construc.de la I.E. en la I.E.22120 Anexo de Totorá, Distrito de Arma	Castrovirrey	00	553,330	530,340.60	Proyecto	1	47.68%	Incluye 2 aulas, 2 ambientes, losa deportiva, cerco perimétrico y equip.A.D
		18	49,980	0.00				
Construc.de la I.E. San Ignacio de Loyola de Iaimina, Distrito de Acoria. 0389	Hvca	18	1,359,007	783,672.30	Proyecto	1	78.53%	fideicomiso, Const.8 Aulas, S.H, cerco perimétrico, Losa y Equipamiento. Contrata
Mejoramiento y Equipamiento de la infraestructura de la I.E.N° 36334 de Parco Alto-Anchonga (0276)	Angaraes	00	26,906	26,902.30	Exp Téc	1	0.00%	expediente concluido y aprobado
Ampliac.Sustituc.Infraestructura y Equipamiento I.E.30944 Colcabamba, Tayacaja (0294)	Tayacaja	00	28,760	28,753.75	Aula	6	11.52%	Incluye mobiliario escolar y material didáctico.
		18	1,065,085	288,349.62				
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.del Nivel Secundario Pedro Paulet del Anexo de Yanacollpa, Distrito de Huando (0277)	Hvca	00	34,664	34,656.80	Proyecto	0.52	100%	Const.6 aulas, 3 ambientes, S.H, cerco perimétrico, losa deport, mobiliario y equipo PAD.113 benefic.A.D
		18	1,010,583	501,600.03				
Construc.Infraestructura de la I.E.Pueblos Unidos de Huayllaccoto, Acoria. (0312)	Hvca	18	1,585,034	1,230,752.86	Proyecto	1	95.00%	fideicomiso, Const.6 Aulas, 6 amb, Cerco, Losa Mult.y Equip. Contrata, 106 benefic.
Mejoramiento y Servicios Educativos Nivel secundario en la I.E.José Gálvez Egúsqiza, Acoria. (0313)	Hvca	18	1,910,134	1,319,722.48	Proyecto	1	85.00%	fideicomiso, Const.6 Aulas, 7 ambientes, Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento. contrata
Intervención en la infraestructura del C.E.Mx.Francisco Bolognesi Tinyaclla-Huando 0317	Hvca	18	50,095	5,000.00				concluido 2009
Reconstrucción de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. San Juan Bautista de Huaytará. (0439)	Huaytará	00	1,755,740	0.00				No programado
Reconstrucción Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 22023 de Huaytará. 0440	Huaytará	00	2,008,047	0.00				No programado
Sustitución y Rehabilitación de Aulas y Equipamiento en	Hvca	00	994,619	666,936.80	Proyecto	1	53.84%	Const.3 aulas, 3

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Fisico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
la I.E. Nº 36117 de Tacsana, Distrito de Yauli. 0459								ambientes, S.H, patio, cerco perimét. mobiliarios y equip. PAD, A.D. 193 benefici
Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Huaribamba	Tayacaja	18	2,132,428	2,028,335.10	Proyecto	1	100%	Const 8 aulas, 6 amb, equipo PAD, mobiliario y capacit. 2130 benefici. Fidei. contrata
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.E. 30961 DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA -	Tayacaja	18	342,725	337,449.56	Proyecto	1	100%	Const. cerco perimét, rehabil. losa deport, implem. c. cómputo y biblioteca, 296 benefici. Fideicom
AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS	Tayacaja	18	662,462	653,791.05	Proyecto	1	100%	Const. cerco perimét, losa deport, sala multiuso y equipamiento, 177 benefici. Fideicomiso, A.D
Construc. Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Nº 31302 de la Localidad de Paltarumi, Distrito de Daniel Hernández.	Tayacaja	18	1,520,766	1,500,577.07	Proyecto	1	88.94%	Const 4 aulas, 8 amb, losa deport, cerco perimét, equipo PAD, mobiliario y capacit. 186 benefici. Fideicomiso. A.D
Sustitución de Infraestructura de la I.E. de San Pedro de Surcubamba	Tayacaja	18	1,893,870	1,842,965.24	Proyecto	1	65.88%	Const 10 aulas, 6 amb, 2SH, losa deport, cerco perimét, equipo PAD y mobiliario, 233 benefici. Fideicomiso. A.D
Mejoramiento e Implementación de la I.E. Nº 31023 en la localidad de Huallhua Ahuaycha, Tayacaja	Tayacaja	18	572,268	512,424.31	Proyecto	1	86.23%	Const. 6 ambient, SH, losa deportiva, mobiliario y equipo PAD, 220 benefici. Fideicomiso, A.D
Const. Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Básica Regular Nº 31044 Mariscal Cáceres, Daniel Hernández.	Tayacaja	18	2,414,620	2,351,141.43	Proyecto	1	89.73%	Const. 20 aulas, 7 amb, 8 SH, equipo PAD, 2 losas deport, cerco perimét, patio y capacitac. 467 benefici. Fideicomiso. A.D
AMPLIACION, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE PICHU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA	Tayacaja	18	501,584	486,612.41	Proyecto	1	70.24%	Const. 2 aulas, 4 amb, losa deport, SH, equipo PAD, y mobiliario. Fideicomiso. A.D
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA	Tayacaja	18	957,339	798,525.49	Proyecto	1	25.00%	Const. 6 aulas, 4 amb, losa deport, SH, equipo PAD, y mobiliario. Fideicomiso. A.D
Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. Inicial 304 del C.P. de Occoro, Distrito de Colcabamba	Tayacaja	00	4,506	4,484.07	Proyecto	55%	55%	Const. 1 aula, 2 ambientes, mobiliario, y equipo PAD, 42 benefici. Concluido. A.D
Construc. de Infraestructura Educativa en la I.E. Nº 30989 del Distrito de Locroja	Churcampa	00	772,237	762,679.47	Proyecto	1	98%	Const. 2 aulas, 5 amb, cerco perimét, mobiliario y equipo PAD, 51 benefici. A.D.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	Churcampa	18	1,100,932	995,012.16	Proyecto	1	95.00%	Const. 5 amb. losa deport, cerco perim. y auditorium, mobil. escolar y equipo PAD, Capacit. docentes. 398 benefici. Fideicomiso. A.D
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE CHURCAMPANA - HUANCAMELICA	Churcampa	18	1,863,209	1,657,581.98	Proyecto	1	95.00%	Const. 2 talleres, aula de arte, 2 amb, losa deport, cerco perimét, y rehabil. 12 aulas y equipam. 527 benefici. Fideicomiso. A.D
Construc. y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E. Cesar Vallejo de Locroja, Churcampa	Churcampa	18	1,057,281	1,045,218.63	Proyecto	1	98.00%	Const. pabellón de 2 plantas, losa dep. cerco

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
								perimét. Fideicom. A.D
Interven.en la Infraestructura de la I.E. Mx. Técnico Agropecuario Artesanal de Lillinta Pilpichaca	Huaytará	00	1,189,477	1,182,559.02	Obra	90%	86.98%	Construc.5 aulas, 4 ambientes, 2 S.H, losa deportiva y equipamiento, 200 alumnos benefic.A.D
Construc.Infraestructura de la I.E. Nº 36301 del Centro Poblado de Tinquerccasa, Distrito de Paucará	Acobamba	18	701,488	564,345.34	Proyecto	90%	88.60%	Incluye 06 aulas, mobiliario y cerco perimétrico. A.D.Fideicomiso
Sustitución de Aulas de la I.E.Nº 36201 - Paloma-Marcas	Acobamba	18	402,358	401,557.35	Aula	1	100%	Incluye 2 ambientes, S.H. cerco perimét, y equipam.A.D. Fideicomiso
Construcción de aulas de la I.E .Nº 36172 de Pomacocha	Acobamba	18	1,378,926	1,305,577.43	Aula	6	94.00%	Incluye 5 ambientes, S.H. cerco perimét, losa deport, y equipam, refacc.3 ambientes. A.D. Fideicomiso
Sustituc. e Implementación de Infraestructura en la I.E. Jorge Chávez Dartnell de Choclococha - Pomacocha	Acobamba	18	1,805,096	1,418,761.02	Aula	8	93.15%	Fideicomiso, incluye 3 ambientes y 2 S.H.A.D
Construcción e Implementación de Infraestructura en la I.E.José Carlos Mariátegui de Caja	Acobamba	18	1,912,052	1,178,966.81	Aula	5	37.00%	Incluye 4 ambientes,losa deport, y centro de produc.pecuaria. A.D. Fideicomiso
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Pública San Antonio de Padua, Huanca Huanca	Angaraes	18	598,658	552,840.82	Proyecto	1	62.13%	Const.3 amb, patio, cerco perimét, SH, equip.y mobil. 135 benef. A.D. Fideicomiso
Ampliación de Infraestructura de la I.E. de Mujeres Nuestra Señora del Carmen, Lircay	Angaraes	18	996,143	979,185.47	Proyecto	1	100%	Const.5 aulas, 5 ambientes, SH, equipamiento y mobil. 708 benef. A.D. Fideicomiso
Construcción de Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público, Virgen de Cocharcas, Julcamarca	Angaraes	18	742,252	729,304.13	Proyecto	1	100%	Const.3 aulas, 4 ambientes, losa deportiva, mobiliario y equipo PAD. Fideicomiso. 57 benefic. A.D
Construcción y equipamiento de la infraestructura de la I.E. Secundaria Juan Velasco Alvarado, Parco Alto, Distrito de Anchonga	Angaraes	18	1,222,053	1,218,871.37	Proyecto	1	100%	Const. 4 ambientes, SH,cerco perimét, y equipo PAD. Fideic. 117 benefic. A.D
Construc. Y Equipamiento de la Institución Educativa Nº 36287 de Cuticsa	Angaraes	18	807,133	786,580.11	Proyecto	1	100%	Const. 3 aulas, 4 amb, SH, cerco perimétrico, equipam.y capacitac. Fideicomiso. A.D
Sustituc.y Equipamiento de la I.E.Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Pata.	Angaraes	18	804,860	777,108.28	Proyecto	1	90.27%	Const.3 aulas, 5 amb, SH, cerco perimét. equipam.y mobiliario. Fideicomiso. A.D
Sustitución Aulas en la I.E. 1º de Mayo de Ccochaccasa	Angaraes	00	168,026	168,025.26	Proyecto	10%	10%	06 aulas, Direc, laborat, bibliot, C.Cómpu, SS.HH, salón usos múlt.patio y cerco perimétrico, 277 benef.AD
		18	33,459	29,200.00				
Mejoramiento Infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas de Angaraes Norte (Huayllay Gde, Lircay, H.Huanca, Callanmarca)	Angaraes	00	52,000	28,080.00	Exp Téc	1	0%	Expediente en elaboración
Construcción de Complejo Educativo y Equipamiento de la I.E. Manuel Scorza Torres Ccaccasiri, Distrito Acoria. 0471	Hvca	18	28,000	28,000.00	Exp Téc	1	100%	Expediente concluido
Intervención en la infraestructura del C.E. MX Manuel Gonzáles Prada, de Nuevo Occoro. 0569	Hvca	18	28,820	0.00	Obra	1	0%	Const.6 aulas, 4 amb, cerco perimét, SH, mobili.y equipo PAD, 230 benefic.Conv, por iniciar
		13	290,110	3,100.90				

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Intervención en la Infraestructura de la I.E. Nº 36099 - Buenos Aires-Nuevo Occoro. 0570	Hvca	18	12,263	0.00	Obra	1	0.00%	Const.3 aulas, 4 amb, cerco perimét, SH, mobiliario y equipo PAD, 220 benefic. Aporte Contravalor Perú-Japón.A.D
		13	119,904	65,161.68				
Construcción de Aulas en la I.E. Nº 608 de Tororumi, Rosario	Acobamba	00	301,000	300,988.33	Aula	2	96.69%	Incluye 2 ambientes, S.H cerco perimétrico y mobiliario escolar.AD
Sustitución de Aulas de la I.E. Nº 36169 San Isidro-Marcas	Acobamba	00	464,811	460,867.60	Aula	4	100%	Incluye 1 ambiente, S.H cerco perimétrico y mobiliario escolar.AD
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº 36207 de Chilcapite, Pomacocha	Acobamba	00	955,270	955,269.98	Aula	6	98.45%	Incluye 5 ambientes, S.H, losa deportiva y cerco perimétrico.AD
Mejoramiento e implementación de Servicios Educativos en la I.E. 177 de Nivel Inicial de la Localidad de Choclococha, Pomacocha (0275)	Acobamba	00	20,816	20,815.52	Exp Téc	1	100%	Expediente concluido
Atenc.obras Emergencia: Drenaje de aguas en un Aula de la I.E. Nº 113 del Barrio San Cristóbal (0465)	Hvca	18	9,883	9,882.10	Obra	1	100%	A cargo de la O.R.Def.Civ. en ejecución
Mejoramiento de los servicios Educativos de la I.E. Antonio Raymondi del C.P.Ambato. 0608	Hvca	00	31,822	31,580.30	Exp Téc	1	100%	Expediente concluido y aprobado
Construcción, Mejoramiento, Sustitución y Equipam. de la Infraestructura en la I.E. N 36303 de Ccaspata, Distrito de Yauli. 0609	Hvca	00	787,783	1,307.42	Proyecto	1	0.00%	Const.3 ambientes, cerco perimétrico y mobil. 480 benefic. Por iniciar. A.D
Construc. Y Equipamiento de la I.E. Agropecuaria José María Arguedas, Localidad de Putacca, Distrito de Palca.0610	Hvca	00	877,484	5,126.96	Proyecto	1	0.00%	Por iniciar
Mejoramiento de Infraestructura de la I.E. Primaria Nº 36313 La Victoria de Huayllayoc-Acoria. 0611	Hvca	00	39,635	30,645.10	Exp Téc	1	100%	Expediente concluido y aprobado
Sustituc.Aulas y Mejoramiento Infraestructura Complejo Educativo de Salcahuasi. 0612	Tayacaja	00	4,790	1,589.73				Concluido con pto 2009, Const.5 aulas, 5 amb, losa depor, mob. SH y equipo PAD, 157 benefic. Conv
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Esmeralda de Anco. 0639	Churcampa	00	707,000	850.00				Sin información
Sustitución Aulas de la I.E. Andres Bello Huancapite Andabamba. 0614	Acobamba	00	16,168	11,588.50				Concluido 2009
Construcción de Infraestructura en la E.I. Nº 656 de Bellavista, Distrito de Surcubamba	Tayacaja	18	50,424	46,441.47	Proyecto	25%	25%	03 aula, 1 amb, cerco perimét.S.H, patio, mob.y equipo PAD. 45 benefic. A.D. Concluido
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Instituto Superior Tecnológico Público de Ticrapo	Castrovirrey	18	632,934	520,413.79	Aula	61%	61%	Contin. 06 aulas, incluye 6 amb, 2 S.H, patio, cerco perimét.equipo PAD y mobiliario escolar. A.D
Construc.y Sustituc.de la infraestructura de la I.E Inca Garcilazo De La Vega-Puca Cruz, Distrito de Rosario	Acobamba	00	1,152,998	1,122,873.14	Proyecto	1	45.52%	Const.5 aulas, 3 amb, SH, losa deport, cerco perimétrico, mobiliario y equipo PAD, 215 benefic. Contrato
Construc. y Equipamiento de la Infraestructura Educativa Primaria Nº 36562 de Llancapuquio, Anchonga.	Angaraes	18	1,175,169	831,945.43	Proyecto	1	55.90%	Const.6 aulas, 4 amb, cerco perimétrico, equipo PAD, mobiliario. 155 benefic. A.D
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. Secundaria Los Angeles de Ccarahuasa -Acoria.	Hvca	18	28,255	28,241.60	Exp Téc	1		Expediente aprobado
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la I.E. Primaria Nº 36374 Checco Cruz-Paucará. 0629	Acobamba	18	25,242	25,158.80	Exp Téc	1		Expediente aprobado
Intervención en la Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytará	Huaytará	00	523,988	366,856.96	Proyecto	1	100%	Módulo de 2 pisos, construcción de 14 ambientes, 4 S.H, patio y Hall. A.D
Mejoramiento y Construc.de la I.E.36205 de Pampapuquio-Paucará. 0539	Acobamba	18	22,523	22,252.12				Concluido con Ppto 2009
Apoyo Social a Obras de Emergencia-Elaboración de	Hvca	13	9,000	0.00				No programado

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2010

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRTO	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	% Avanc Físico	DESCRIPCION DEL PROYECTO
Exp.Técnicos de Reconstrucción de IES de Huaytará		18	3,752	0.00				
Sustitución de Infraestructura de la I.E. N° 322 de Tambillo-Manta-Hvca 0641	Hvca	00	2,500	2,500.00				Const.1 aula, 3 ambientes, 2 SH, mobiliario y equipo PAD.93 benefic.FORSUR.Conv
Mantenimiento de Servicios Higiénicos en el Ambiente del ISPPEF-Hvca. 0648	Hvca	18	20,557	0.00				No programado
Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. La Victoria de Ayacucho, Ascensión Hvca. 0652	Hvca	00	20,117	20,116.35				Pago de devengados, concluido
Construc.Aulas de la I.E.N° 36166 Marcas, Distrito de Marcas. 0657	Acobamba	00	4,000.00	0.00				Pago de devengados, concluido
<b>23 PROTECCION SOCIAL</b>			<b>1,467,428.00</b>	<b>454,799.00</b>				
		<b>00</b>	<b>444,813.00</b>	<b>17,950.00</b>				
		<b>13</b>	<b>542,416.00</b>	<b>0.00</b>				
		<b>18</b>	<b>480,199.00</b>	<b>436,849.00</b>				
Mejoramiento de capacidades para la seguridad alimentaria de las Comunidades Rurales Alto Andinas en Extrema Pobreza del Distrito de Ascensión.(0215)	Hvca	00	432,813	5,950				S/I
Fortalecimiento de la participación de la Población rural en la gestión del Desarrollo Socio Económico de la región Hvca. (0441)	Multiprov	00	8,000.00	8,000.00				PIP en formulación
Atención Obras de emergencia por Fenómeno del Niño y bajas temperaturas 2010 en la Región Hvca. 0455	Multiprov	18	349,500	338,650	Proyecto	1	100%	697,742 cabezas de ganado afectado por las bajas temperaturas atendido, y 04 eventos de capacitación
Atención Obras de Emergencia Hvca (0507)	Hvca	13	525,020	0				No programado
Rehabilitac.Locales Comunes de la Prov.de Hvca- Construc.Local Comunal de la Comunidad de Ingahuasi del distrito de Pilpichaca (0508)	Huaytará	13	17,396	0				No programado
Mejoramiento de las Atenciones de Rehabilitac. Infraestructura Eco.Social y Productiva de la Región	Multiprov	18	32,500	0				No programado
Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Hvca. 0651	Multiprov	00	4,000.00	4,000.00				pago de pendientes
Canalización del Río Colcabamba, Manejo de Cárcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has, Colcabamba	Tayacaja	18	98,199	98,199				Concluido en 2009
		<b>00</b>	<b>95,827,610.00</b>	<b>49,429,488.46</b>				
		<b>13</b>	<b>14,731,647.00</b>	<b>1,871,481.06</b>				
		<b>18</b>	<b>155,814,652.00</b>	<b>102,542,690.39</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>266,373,909.00</b>	<b>153,843,659.91</b>				

## VI. BALANCE GENERAL

Dirección Nacional de Contabilidad Pública  
Versión 11.01.1

### BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 ( EN NUEVOS SOLES )

Hora : 14:41:32  
Pag. : 1 de 1  
F. Int. : 31/03/2011 02:11:37 PM

EF-1

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

ACTIVO		2010	2009
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	24,753,516.69	26,019,247.91
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,936,134.71	13,943,857.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	77,831.69	98,960.25
Existencias (Neto)	7	14,038,829.51	17,457,541.77
Gastos Pagados por Anticipado	8	91,157,765.96	94,138,112.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>143,964,078.56</b>	<b>151,657,720.37</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	30,454.56	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	736,806,002.04	589,917,118.18
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	71,083,556.62	65,777,971.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	47,625,562.77	25,559,173.58
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>855,545,575.99</b>	<b>681,254,263.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>999,509,654.55</b>	<b>832,911,983.78</b>
Cuentas de Orden	30	598,974,150.75	537,379,376.78

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

CONTADOR GENERAL  
MÁT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		2010	2009
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	15	34,910,236.00	13,794,154.76
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	39,494,404.63	72,499,560.05
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	7,911,308.72	8,600,628.52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>82,315,949.35</b>	<b>94,894,343.33</b>

PASIVO NO CORRIENTE		2010	2009
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	186,486,064.49	139,259,627.73
Ingresos Diferidos	23	3,608.32	3,608.32
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	1,299,361.05
Provisiones	25	5,827,681.02	5,827,681.02
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>192,317,353.83</b>	<b>146,390,278.12</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO		2010	2009
Hacienda Nacional	26	2,822,356,904.34	2,818,073,383.78
Hacienda Nacional Adicional	27	( 15,601,901.46)	9,602,558.27
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	( 2,081,878,651.51)	( 2,236,048,579.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>724,876,351.37</b>	<b>591,627,362.33</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden:

Nota	2010	2009
15	34,910,236.00	13,794,154.76
16	0.00	0.00
17	39,494,404.63	72,499,560.05
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	7,911,308.72	8,600,628.52
	<b>82,315,949.35</b>	<b>94,894,343.33</b>
21	0.00	0.00
22	186,486,064.49	139,259,627.73
23	3,608.32	3,608.32
24	0.00	1,299,361.05
25	5,827,681.02	5,827,681.02
	<b>192,317,353.83</b>	<b>146,390,278.12</b>
	<b>274,633,303.18</b>	<b>241,284,621.45</b>
26	2,822,356,904.34	2,818,073,383.78
27	( 15,601,901.46)	9,602,558.27
28	0.00	0.00
29	( 2,081,878,651.51)	( 2,236,048,579.72)
	<b>724,876,351.37</b>	<b>591,627,362.33</b>
	<b>999,509,654.55</b>	<b>832,911,983.78</b>
30	598,974,150.75	537,379,376.78

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
PRESIDENTE REGIONAL

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )


EF-2

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

		2010	2009
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,041,478.34	1,726,026.34
Trasposos y Remesas Recibidas	33	463,910,993.47	316,033,854.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	13,468,384.60	18,639,374.67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>479,420,856.41</b>	<b>336,399,255.02</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	( 477,085.68)	( 199,147.61)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 64,228,102.89)	( 41,089,115.01)
Gastos de Personal	37	( 200,307,751.65)	( 199,206,183.22)
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>	38	<b>( 1,815,257.44)</b>	<b>( 6,732,391.62)</b>
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 2,809,114.66)	( 8,694,031.09)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	( 4,798,028.94)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 47,089,018.35)	( 26,087,235.47)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 316,726,330.67)</b>	<b>( 286,806,132.96)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>162,694,525.74</b>	<b>49,593,122.06</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	1,029,121.36	150,566.73
Gastos Financieros	43	( 5,542.81)	0.00
Otros Ingresos	44	13,407,834.74	50,482,025.14
Otros Gastos	45	( 16,887,477.00)	( 10,729,945.58)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,456,063.71)</b>	<b>39,902,646.29</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>160,238,462.03</b>	<b>89,495,768.35</b>

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA  
  
 Director General de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA  
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION  
  
**CLAYD HUERTA GAMARRA**  
 Director Regional de Administracion  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA  
  
 PRESIDENCIA  
  
**Macisto A. Diaz Abad**  
 PRESIDENTE REGIONAL  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**



GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCAMELICA  
CONSEJO REGIONAL

## **ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 030-2011-GOB.REG.-HVCA/CR**

*Huancavelica, 13 de Abril de 2011.*

### VISTO:

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada el 13 de Abril del año 2011, con el voto unánime de sus integrantes y;

### CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al Artículo 191° de la Constitución Política modificada por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Que, los Artículos 188° y 192° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito regional;

Que, de conformidad con el Literal n) del Artículo 21°, de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es atribución del Presidente Regional, presentar la Memoria Anual y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional;

Que, el literal d), del artículo 15°, de la norma antes glosada, establece que son atribuciones del Consejo Regional, aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios;

Que, mediante Oficio N° 052-2011-GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 23 de Marzo del año 2010, el Gerente General Regional eleva al Consejo Regional la memoria Anual del Gobierno Regional 2010, de Huancavelica para su aprobación pertinente;

Que, el documento antes mencionado contiene información remitida por las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional y los órganos desconcentrados Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales, en dicho documento se visualiza los presupuestos, programas y proyectos ejecutados y los estados Financieros conciliados ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuesto Público 2009 y la Directiva de Ejecución, Control y Evaluación Presupuestal;

Que, conforme dispone el Artículo 39° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.





GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
CONSEJO REGIONAL

## **ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 030-2011-GOB.REG.-HVCA/CR**

*Huancavelica, 13 de Abril de 2011.*



En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno Regionales el Consejo Regional;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE** la Memoria Anual del Gobierno Regional de Huancavelica – 2010, como documento informativo, la misma que contiene Cien (100) folios, divididos en Seis (06) Capítulos, sin perjuicio de derivar a las áreas pertinentes para su verificación.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR** que la aprobación de la memoria Anual a que se refiere el artículo anterior, no convalida ni avala irregularidades de orden administrativo o responsabilidades que puedan derivarse de auditorías del Órgano de Control Institucional o de investigaciones realizadas por otras instancias.

**ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese** el presente Acuerdo de Consejo Regional al Ejecutivo Regional e instancias pertinentes para su conocimiento.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.



GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA

*Jorge Diógenes Chávez Bentes*  
JORGE DIOGENES CHÁVEZ BENTES  
CONSEJERO DELEGADO

FUENTES DE INFORMACION:

- Informe N° 055-2011-Gob.Reg-Hvca/GGR-DRA-OE
- Informe 060-2011-Gob.Reg-Hvca/GGR-OREPI
- Memo N° 133-2011/Gob.Reg-Hvca/GRNNyGMA
- Oficio N° 158-2011-Gob.Reg-Hvca/OCI
- Oficio N° 246-2011/Gob.Reg-Hvca/PPR (Procur)
- Informe N° 281-2011/Gob.Reg-Hvca/GRDS-DIRESA
- Informe N° 157-2011-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DRA-OPLA
- Oficio N° 137-2011/Gob.Reg-Hvca/CR
- Informe N° 025-2011-Gob.Reg-Hvca/GRPPyAT/SGDIeI
- Oficio N° 0424-2011-Gob.Reg-Hvca/GRDS/DREH/UGEL-Hvca
- Memo N° 165-2011-Gob.Reg-Hvca/GRI (Estudios)
- Memo N° 131-2011-Gob.Reg-Hvca/GRDS
- Informe N° 046-2011-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DIREPRO
- Informe N° 069-2011-Gob.Reg-Hvca/GRDE-DREM
- Informe N° 022-2011-Gob.Reg-Hvca/GRPPyAT-SGPeI
- Informe N° 116-2011/Gob.Reg-Hvca/GGR-ORSyL
- Presentaciones de la VIII Audiencia Pública Regional, 2010
- Informe N° 052-2011-Gob.Reg/GRPPyAT-SGGPyT
